

-

INFORME ANUAL DE GESTIÓN VIGENCIA 2023
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

A CARGO DE: Ing. FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE DE LA ENTIDAD

ENERO - 2024

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

LÍDERES DE GESTIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
Líder Gestión De Operaciones

LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
Líder Gestión Administrativa Y Financiera

CAMILO PAREDES CASTAÑEDA
Líder de Infraestructura

DANIELA RIVERA GARCIA
Líder Gestión Jurídica Y Contratación

ASTRID MAGALY PEÑA GRAFFE
Líder del área de Gestión Social y Predial

ALEXANDER HERRERA GRISALES
Líder Gestión Control Interno

AYDA NURY VILLAMIZAR VILLAREAL
Líder Gestión Planificación Estratégica

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO

2. QUIENES SOMOS 5

3. MISIÓN 5

4. VISIÓN 5

5. POLÍTICA DE OPERACIÓN 6

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6

7. PRESENTACIÓN 7

7.1 INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR 7
7.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
7.2.1 APORTES AL PROYECTO 12
7.2.2 PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO 22
7.2.3 INFORME DE PAGOS POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 22
7.2.4 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO. 24
7.3 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 24
7.3.1 IMPLEMENTACION DEL SOFWARE CONTABLE INSOFT 25
7.3.2 INFORMACIÓN NARRATIVA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 25

8. INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2023 27

8.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 27
8.1.1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 27
8.1.1.1 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 27
8.1.1.2 PAAC. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023. 27
8.1.1.3 PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 28
8.1.1.4 MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023. 28
8.1.1.5 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MIPG 29
8.1.1.6 REPORTE DE INFORMACIÓN A TRAVES DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN - FURAG VIGENCIA 2022 29

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8.1.1.7 ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2022 Y AUDITORIA ESPECIAL POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 30
8.1.1.8 PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2020-2023 30
8.2 PROCESOS MISIONALES 31
8.2.1 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 31
8.2.1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 34
8.2.2 GESTIÓN DE OPERACIONES 60
8.2.2.1 OPERACIÓN Y RECAUDO 60
7.2.2.2 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 72
8.2.3 GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL 78
8.2.3.1 PROCESO DE GESTIÓN DE COMPONENTE SOCIO PREDIAL CUARTO TRIMESTE 2023 78
8.2.3.2 PROYECTOS Y PROGRAMAS 79
8.2.3.3 COMUNIDADES 83
8.3 PROCESO DE APOYO 88
8.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 88
8.3.2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 121
8.3.2.1 GENERALIDADES 121
8.3.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 129
8.4 PROCESO DE EVALUACIÓN 131
8.4.1 GESTIÓN CONTROL INTERNO 131
8.4.1.1 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 131
8.4.1.2 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 134
8.4.1.3 CODIGO DE INTEGRALIDAD. 134
8.4.1.4 EVALUACIÓN FURAG DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 136

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 137

9.1 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 137
9.2 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES: 142
9.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 142

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2. QUIENES SOMOS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Huila, creada mediante Decreto No. 986 *" Por el cual se crea y se constituye una sociedad por acciones simplificadas S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Neiva"* del 02 de septiembre del 2013, expedido por el Alcalde Municipal; conformada por un equipo humano comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importantes para la ciudad de Neiva, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo *"Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020 – 2023".*

Estamos comprometidos con la comunidad y partes interesadas para que nuestra visión sea materializada y seamos ejemplo a seguir en el nivel Nacional en la implementación de este tipo de proyectos que requiere el trabajo articulado con diferentes entidades del orden Nacional, municipal, gremio de transportadores y la comunidad.

El Sistema Estratégico de Transporte Publico **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.,** le permitirá a la comunidad tener mejores condiciones de accesibilidad y movilidad, partiendo de la construcción de obras de infraestructura que le cambiaran la cara a la Ciudad, bajo los principios de eficiencia, inclusión, seguridad, equidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.

3. MISIÓN



SETP TRANSFEDERAL S.A.S es la entidad encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva para contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y amigable con el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte público, el cual será eficiente, sostenible en el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos.

4. VISIÓN

En el 2024 el SETP de Neiva será ejemplo a nivel Nacional en el desarrollo e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, teniendo como base los principios de eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los principios de Ciudades Amables.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

5. POLÍTICA DE OPERACIÓN

SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad comprometida en desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva mediante la ejecución de los componentes de operacionales, sociales, institucionales y de infraestructura, los cuales están articulados con el Plan de Desarrollo "Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020 - 2023" dentro de la dimensión "Ambiente Construido".

De igual forma estamos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su planeación, organización, socialización, evaluación y control constante de la ejecución del proyecto, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, responsabilidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el logro de los resultados que nos permitan cumplirles a los ciudadanos mejorando su movilidad y calidad de vida.

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.

2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.

3. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema.

4. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros.

5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva.

6. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7. PRESENTACIÓN

El presente informe da cuenta del cumplimiento a lo establecido por la ley 603 de 2000, ya que la Entidad hace uso del software financiero Insoft como plataforma administrativa y financiera, y a su vez todos los equipos de la Entidad incluyen las respectivas licencias de uso.

7.1 INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR

EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S., identificada con NIT 900.651.344 – 6, está conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), Reguladas por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital; de naturaleza comercial.

Se crea mediante documento privado de Asamblea Constitutiva de Neiva del 4 de diciembre de 2013, inscrita el 4 de diciembre del 2013 bajo el número 00036332 del libro IX de Cámara de Comercio. A la fecha se han realizado las siguientes reformas:

Documento	Fecha	Origen	Ciudad	Inscripción	Fecha
AC - 5	2014/04/25	Asamblea de accionistas	Neiva	00038357	2014/06/27
AC – 6	2015/02/24	Asamblea de accionistas	Neiva	00040666	2015/05/14
AC - 7	2015/01/04	Asamblea de accionistas	Neiva	00043333	2016/01/05
AC - 8	2016/01/14	Asamblea de accionistas	Neiva	00043392	2016/01/15
AC – 011	2018/03/20	Asamblea de accionistas	Neiva	00055569	2019/12/23
AC - 013	2018/10/26	Asamblea de accionistas	Neiva	00055570	2019/12/23

La sociedad TRANSFEDERAL S.A.S. está conformada por un accionista el MUNICIPIO DE NEIVA con un 100% participación. El capital autorizado es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).

La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP del municipio de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto Nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013, CONPES 3833 de 2015 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible en el municipio de Neiva y su área de influencia.

Al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. como Ente gestor, le corresponde la planeación, organización, gestión y control del desarrollo del proyecto, así como la adecuada administración que garantice el buen funcionamiento del sistema en la ciudad de Neiva y de los recursos que genere la operación del mismo.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

El Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014 (Ley 1450 de 2011) "Prosperidad para todos" estableció en el programa de viviendas y ciudades amables una estrategia para desarrollar diferentes acciones que permitan estructurar movilidades eficientes con el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 600.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP; posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 "Todos por un nuevo país" (PND) consigna dentro de la estrategia de movilidad urbana, estableció como meta principal la prestación de servicio público de pasajeros en condiciones de calidad y con estándares de servicios adecuados para los distintos territorios, buscando la integración con modos alternativos no motorizados y con otras modalidades de transporte.

El Gobierno Nacional, mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva y fijó el valor total del proyecto en $312.991.000.000 millones de pesos corrientes del año 2012.

En virtud de ello, el municipio de Neiva, mediante Decreto 948 del 26 de agosto de 2013 adoptó el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el decreto 3422 del 9 de diciembre de 2009, por medio del cual se reglamentan los sistemas estratégicos de transporte público –SETP-.

Mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituyó la sociedad por acciones simplificada, SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuyo objeto principal es la planeación, ejecución, construcción e implementación del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO de la ciudad de Neiva, así como la coordinación interinstitucional del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013.

El SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S.- SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, que cuenta con Autonomía Contractual, Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y las leyes.

El 7 de noviembre de 2013, el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribieron el "convenio de cofinanciación para el sistema estratégico de transporte público del municipio de Neiva", para que, a través del Ente Gestor, se administren los recursos comprometidos hasta el año 2020, para construir y poner en funcionamiento el Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad.

El ente gestor, SETP TRANSFEDERAL S.A.S. tiene compromisos ineludibles para asumir con responsabilidad y plenitud la implementación del sistema, el cual se orienta a la ejecución de tres acciones: operacional, institucional y de infraestructura, que reportan un beneficio social a la comunidad, constituyéndose en una obra de inversión social, en la medida que el mismo cuenta con la posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender a la población con menos recursos para su movilización.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

La **acción institucional** procura el desarrollo de un nuevo esquema institucional para armonizar y mejorar relaciones entre los sectores público y privado, para lo cual se incorporan 4 elementos: i) Sistema de recaudo centralizado, ii) Sistema de gestión y control de flota, iii) Administrador financiero y iv) Asistente tecnológico.

La **acción operacional** implica el reordenamiento total de las rutas del sistema de transporte público, donde el sector público realiza la inversión en infraestructura, planificación, regulación y control del sistema, mientras que el sector privado se encarga de la prestación del servicio (adquisición, mantenimiento y dotación de equipos).

Por su parte, la **acción de infraestructura** determina 7 ítems, así:

Por su parte, la **acción de infraestructura** determina 7 ítems, así:

Vías:

Construcción: 50,5 km.
Rehabilitación: 26,3 km.
9,3 km/carril prioritario simple.
1,7 km/carril prioritario con rehabilitación.
4,2 km/andén.
1,4 km de peatonalización.
Intercambiadores viales: 2 (USCO y La Toma)

Urbanismo: 58,6 km (Incluye paraderos, canecas y bancas)

Patios talleres: 5 (por definir)

Terminales de rutas: 5

Centros integrados de servicio al ciudadano: 4

Sistema centralizado de semaforización: 1

Obras de señalética: (horizontal, vertical e información al usuario).

Para la financiación del proyecto, se firmó el Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Neiva, definiéndose los aportes por vigencia para cada uno de ellos. La inversión pública destinada para cubrir los costos del proyecto es por valor de $252.991.000.000 pesos constantes del año 2012, que comprende la inversión establecida en el documento CONPES 3756, tal y como se detalla a continuación:

APORTES CONPES 3756 DE 2013

Año	MUNICIPIO - (2012)	NACIÓN	
		(2012)	(pesos corrientes)
2013	9.000.000.000	0	0
2014	15.500.000.000	2.121.000.000	2.250.000.000
2015	15.500.000.000	7.363.000.000	8.046.000.000
2016	9.000.000.000	30.001.000.000	33.767.000.000

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2017	9.000.000.000	45.547.000.000	52.802.000.000
2018	9.000.000.000	52.696.000.000	62.922.000.000
2019	9.000.000.000	30.263.000.000	37.218.000.000
2020	9.000.000.000	0	0
Total	**85.000.000.000**	**167.991.000.000**	

***Fuente**: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

Por otra parte, la inversión privada se estima en $60.000 millones de pesos colombianos de 2012 que se destinarán a la adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra y montaje de equipos y software de recaudo.

Buses y Sistema de Recaudo	$ 60.000

Posteriormente en el CONPES 3833 del 23 de septiembre del 2015 los aportes se establecen de la siguiente manera:

CONPES 3833 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Año	NACIÓN	
	INICIAL	AJUSTE
2015	8.046.000.000	8.046.000.000
2016	33.767.000.000	33.767.000.000
2017	52.802.000.000	52.802.000.000
2018	62.922.000.000	29.267.764.314
2019	37.218.000.000	20.350.743.020
2020	0	37.627.053.329
2021	0	15.913.500.000
Total	**194.755.000.000**	**197.774.060.663**

Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En la vigencia 2016 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

AÑO	NACIÓN	
	INICIAL	AJUSTE
2016	33.767.000.000	19.500.000.000
2017	52.802.000.000	21.902.000.000
2018	62.922.000.000	18.663.494.688
2019	37.218.000.000	14.350.743.020
2020		25.783.471.838
2021		26.346.966.669
2022		35.080.381.946
2023		39.768.430.281
Total	**186.709.000.000**	**201.395.488.442**

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Finalmente, en diciembre de la vigencia 2021 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, de acuerdo con lo establecido en el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación tal y como se reflejan a continuación.

MUNICIPIO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	TOTAL
Convenio de Cofinanciación	9.000.000	15.500.000	15.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	85.000.000

Cifras en miles de pesos

NACIÓN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000	-	-	-	-	-	-	167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500		-	-	-	200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	-	-	211.691.489
Otrosí N° 3 (dic. 2021)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	12.469.093	-	26.346.967	35.080.382	39.768.430	10.000.000	21.619.549	215.645.916

Cifras en miles de pesos.

- **DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

NACIÓN	MUNICIPIO DE NEIVA	TOTAL, APORTES
215.645.916	118.956.851	**334.602.767**
64%	**36%**	**100%**

Cifras en miles de pesos



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.1 APORTES AL PROYECTO

A diciembre 31 de 2023 se han recibido aportes del municipio de Neiva y la Nación, para el proyecto de la siguiente manera:

- ***INDEXACIÓN***

Con relación a la indexación es importante aclarar que el valor reflejado como proyección POAI, corresponde a la proyección de la liquidación del ajuste inflacionario de los aportes efectivamente realizados, según lo establecido en el otrosí No. 01 del Convenio de Cofinanciación a través de su cláusula tercera la cual estableció la fórmula matemática para el respectivo ejercicio financiero, por lo tanto, este valor puede sufrir modificaciones en el momento de realizar la revisión por parte de los involucrados en el proceso.

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio de Neiva tiene establecido en el convenio de cofinanciación los aportes hasta la vigencia 2020 tal y como se refleja en el numeral 2.3 Aportes del Municipio establecido en el convenio de cofinanciación, la Entidad procedió a reliquidar el ajuste inflacionario de los aportes efectivamente realizados, según lo establecido en el otrosí No. 01 del Convenio de Cofinanciación a través de su cláusula tercera estableció lo siguiente:

a. "*Al final de cada vigencia fiscal se realizará el efecto inflacionario en los aportes efectivamente realizados por el Municipio, para determinar si las condiciones establecidas en el numeral 2.3, y la programación de los aportes en pesos constantes de 2012 presentada, fueron cumplidos por el Municipio. La fórmula que se utilizará para establecer el cumplimiento de las obligaciones será la siguiente:*

$$Balance_{Vig(i)} = \left(Ap\ Corr_{Vig(i)} * \frac{IPC_0}{IPC_i} - Ap\ Const_{Vig(i)}\right)$$

b. *Si el balance del efecto inflacionario de los aportes del Municipio arroja un valor positivo, se entenderá que la entidad correspondiente habrá realizado un aporte mayor, en pesos constantes 2012 al establecido en el numeral 2.3. En esta medida el Municipio podrá ajustar el monto de sus obligaciones en vigencias futuras en pesos constantes de 2012, en la vigencia siguiente, con base en la siguiente fórmula:*

$$Dis\ Corr_{Vig(k)} = Balance_{Vig(i)} * \frac{IPC_k}{IPC_n}$$

c. *Si el balance del efecto inflacionario de los aportes del municipio arroja un valor negativo, se entenderá que la entidad correspondiente habrá realizado un aporte menor en pesos constante de 2012, al establecido para la respectiva vigencia. En esa medida el municipio ajustará su programa de aportes de la siguiente manera:*

i. El municipio deberá ajustar la programación de sus aportes, compensando los faltantes en la vigencia inmediatamente siguiente con base en la siguiente fórmula:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

$$Ad\ Corr_{\ Vig(k)} = Balance_{\ Vig(i)} * \frac{IPC_k}{IPC_n}$$ „

En concordancia con lo anteriormente expuesto, informamos que al Municipio de Neiva se remitió el ejercicio financiero con corte a 15 de julio del 2021, correspondiente al ajuste inflacionario en el monto de los aportes en pesos corrientes realizado por el Ente Gestor, con el fin de realizar las respectivas revisiones por las partes involucradas.

LIQUIDACIÓN DEL AJUSTE DEL COMPONENTE INFLACIONARIO RECURSOS MUNICIPIO – INDEXACIÓN		
No. OFICIO	**FECHA DE REMISIÓN**	**CANAL DE RECEPCIÓN Y/O OBSERVACIÓN**
202007021	15 de julio del 2020	Ventanilla única R-03006-202017546 Control ID: 429668
N/A	19 de agosto del 2020	Correo electrónico – Revisión y aprobación de la fórmula de indexación por parte de la UMUS
CD 478	15 de julio del 2021	Ventanilla única R-03001-202123567 Control ID: 483948
CD 1762	31 de mayo del 2023	Radicado Secretaría de Hacienda Municipal

De igual manera se han efectuado varias reuniones de socialización con la secretaria de Hacienda Municipal con el fin de revisar la información histórica del proyecto, por lo tanto, el resultado de la gestión se refleja a continuación:

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

APORTES ACUMULADOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO HASTA 2023

CIUDAD	ENTE GESTOR	FUENTE FINANCIACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	VIGENCIA A LA QUE APLICAN LOS RECURSOS	MONTO
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC20 – 2	27/10/2014	2013	9.174.403.143,17
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC20 – 2	27/10/2014	2014	3.825.596.856,83
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC20 – 3	13/11/2014	2014	1.095.385.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC20 – 3	13/11/2014	2014	43.898.824,00
					SUB-TOTAL 2014	**14.139.283.824,00**
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	NC23 – 7	8/04/2015	2014	2.250.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC23 – 10	4/06/2015	2014	2.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC23 – 12	5/06/2015	2014	5.099.824,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	NC23 – 12	5/06/2015	2014	38.799.000,00
					SUB-TOTAL 2015	**4.293.898.824,00**
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	NC01 – 2	17/06/2016	2015	8.046.000.000,00
					SUB-TOTAL 2016	**8.046.000.000,00**
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	NC02 – 1	19/02/2017	2016	19.500.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 2	16/05/2017	2017	788.817.644,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 3	17/05/2017	2017	2.531.082.161,00

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 4	25/05/2017	2017	1.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 5	9/06/2017	2017	461.421.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 6	17/07/2017	2017	461.421.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 7 Y 8	11/08/2017	2017	1.461.421.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 10	8/09/2017	2017	460.573.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 12	10/10/2017	2017	458.815.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 13	20/11/2017	2017	458.815.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 14	5/12/2017	2017	458.815.525,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 16	18/12/2017	2017	458.815.520,00
					SUB-TOTAL 2017	**28.500.000.000,00**
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN BIRF	NC02 – 18	10/05/2018	2017	21.902.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 19	6/06/2018	2018	1.309.345.809,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 20	7/06/2018	2018	2.500.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 21	4/07/2018	2014	3.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 22	6/07/2018	2018	654.672.904,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 23	6/07/2018	2018	800.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 24	8/08/2018	2018	654.672.904,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 25	8/08/2018	2018	1.260.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 27	30/08/2018	2018	97.380.189,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 29	3/12/2018	2018	881.308.383,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 30	13/12/2018	2014	1.323.063.931,83
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC02 – 30	13/12/2018	2017	2.177.515.988,17
					SUB-TOTAL 2018	**36.559.960.109,00**
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 1	31/01/2019	2014	4.261.188.989,56
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 1	31/01/2019	2014	238.811.010,44
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 2	25/02/2019	2014	546.444.650,82
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 2	25/02/2019	2015	675.607.649,18
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 3	28/02/2019	2018	842.619.811,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 6	23/04/2019	2019	2.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN BIRF	NC06 – 8	27/05/2019	2018	18.663.494.688,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 9	21/06/2019	2019	2.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 12	23/07/2019	2015	10.500.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 13	29/07/2019	2019	2.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 14 - 15	21/08/2019	2019	2.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 16	16/10/2019	2015	6.311.341.194,16
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC06 – 16	16/10/2019	2016	2.688.658.805,84
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN BIRF	NC06 – 17	25/10/2019	2019	5.995.302.428,62
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN BIRF	NC06 – 18	30/10/2019	2019	6.875.464.717,00
					SUB-TOTAL 2019	**65.598.933.944,62**
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC07 – 3	15/04/2020	2020	700.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC07 – 5	23/07/2020	2019	500.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC07 – 6	10/08/2020	2019	500.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC07 – 7	10/08/2020	2020	500.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN BIRF	GP19 – 32	27/11/2020	2020	-401.673.972,48

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC07 – 8	4/09/2020	2020	1.949.343.082,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC07 – 11	29/12/2020	2020	1.700.039.568,00
					SUB-TOTAL 2020	5.447.708.677,52
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC08 – 1	19/04/2021	2021	13.044.420.214,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC08 – 2	12/05/2021	2020	1.172.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC08 – 3	21/05/2021	2020	2.000.000.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC08 – 6	7/12/2021	2021	3.972.854.455,00
					SUB-TOTAL 2021	20.189.274.669,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC09 – 2	9/02/2022	2021	928.461.350,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC09 – 3	9/02/2022	2021	5.511.569.000,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC09 – 9	26/08/2022	2020	978.617.350,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC09 – 9	26/08/2022	2016	445.911.763,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC09 – 10	26/08/2022	2016	1.094.185.132,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	MUNICIPIO	RC09 – 10	26/08/2022	2016	481.285.755,00
					SUB-TOTAL 2022	9.440.030.350,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC10 – 1	12/02/2023	2022	2.198.955.467,00
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC10 – 3	10/05/2023	2016	273.540.935,96
NEIVA	SETP TRANSFEDERAL S.A.S	NACIÓN	RC10 – 3	10/05/2023	2018	2.526.459.064,04
					SUB-TOTAL 2023	4.998.955.467,00
					TOTAL APORTES	197.214.045.865,14

Análisis recursos Ente Territorial

Vigencia i	AP Cons i	AP Crr	IPC i	AP Crr * (IPC i/IPC 2012)	Balance i	Acumulado constantes 2012
2.013	9.000.000.000,00	9.174.403.143,17	79,56	9.000.278.598,85	278.598,85	278.598,85
2.014	15.500.000.000,00	4.964.880.680,83	82,47	4.698.786.675,62	- 10.801.213.324,38	- 10.800.934.725,53
2.015	15.500.000.000,00	2.043.898.824,00	88,05	1.811.769.485,67	- 13.688.230.514,33	- 24.489.165.239,86
2.016	9.000.000.000,00	-	93,11	-	- 9.000.000.000,00	- 33.489.165.239,86
2.017	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	96,92	7.247.730.086,67	- 1.752.269.913,33	- 35.241.435.153,19
2.018	9.000.000.000,00	14.657.960.109,00	100	11.440.537.865,07	2.440.537.865,07	- 32.800.897.288,11
2.019	9.000.000.000,00	34.064.672.111,00	103,8	25.614.139.289,63	16.614.139.289,63	- 16.186.757.998,48
2.020	9.000.000.000,00	5.849.382.650,00	105,48	4.328.254.795,53	- 4.671.745.204,47	- 20.858.503.202,95
2.021	-	3.172.000.000,00	111,41	2.222.193.698,95	2.222.193.698,95	- 18.636.309.504,00
2.022	-	3.000.000.000,00	126,03	1.857.890.978,34	1.857.890.978,34	- 16.778.418.525,66
2.023	-	2.800.000.000,00	137,62	1.587.995.930,82	1.587.995.930,82	- 15.190.422.594,84
2.024		6.000.000.000,00	146,43	3.198.115.140,34	3.198.115.140,34	- 11.992.307.454,50
2.025		5.885.219.658,00	150,82	3.045.626.536,98	3.045.626.536,98	- 8.946.680.917,52
2.026		6.000.000.000,00	155,33	3.014.871.563,77	3.014.871.563,77	- 5.931.809.353,76
2.027		6.000.000.000,00	159,99	2.927.057.941,12	2.927.057.941,12	- 3.004.751.412,63
2.028		6.344.433.476,01	164,8	3.004.751.412,63	3.004.751.412,63	-
TOTAL	85.000.000.000,00	118.956.850.652,01			2.023	- 26.784.189.077,54

Análisis recursos Nación:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Convenio de Cofinanciación	2.250.000.000,00	8.046.000.000,00	19.500.000.000,00	21.902.000.000,00	18.663.494.688,00	12.469.093.173,14
Desembolsos	2.250.000.000,00	8.046.000.000,00	19.500.000.000,00	21.902.000.000,00	18.663.494.688,00	12.870.767.145,62
Saldo	-	-	-	-	-	- 401.673.972,48

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
-	26.346.966.669,00	35.080.381.946,00	39.768.430.281,00	10.000.000.000,00	21.619.549.423,00	215.645.916.180,14
- 401.673.972,48	23.457.305.019,00	2.198.955.467,00				108.486.848.347,14
0,00	2.889.661.650,00	32.881.426.479,00	39.768.430.281,00	10.000.000.000,00	21.619.549.423,00	107.159.067.833,00

- ***DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA NACIÓN Y EL MUNICIPIO:***

A continuación, se presenta un cuadro detallado de los desembolsos realizados por el Gobierno Nacional y local así:

VIGENCIA	VALOR	APORTES NACIÓN		APORTES MUNICIPIO		OTROS APORTES ADICIONALES AL CONV. COFINANCIACIÓN	
		OTRAS FTES	BIRF	MUNICIPIO/SGP	USCO	REDES	MULTAS
2014	14.139.284	0	0	14.139.284	0	0	0
2015	4.293.899	2.250.000	0	2.043.899	0	0	0
2016	8.046.000	8.046.000	0	0	0	0	0
2017	28.500.000	19.500.000	0	9.000.000	0	0	0
2018	38.059.960	0	21.902.000	11.657.960	3.000.000	1.500.000	0
2019	67.525.202	0	31.534.262	10.064.672	24.000.000	1.810.910	115.357
2020	5.461.035	0	-401.674	5.849.383	0	12.977	349
2021	20.189.542	17.017.275	0	3.172.000	0	0	268
2022	9.638.845	6.440.030	0	3.000.000	0	-1.199	200.014
2023	5.198.963	2.198.955	0	2.800.000	0	200.000	7
TOTAL	**201.052.729**	**55.452.260**	**53.034.588**	**61.727.198**	**27.000.000**	**3.522.688**	**315.995**

Diciembre 2023 *Cifras en miles de pesos*

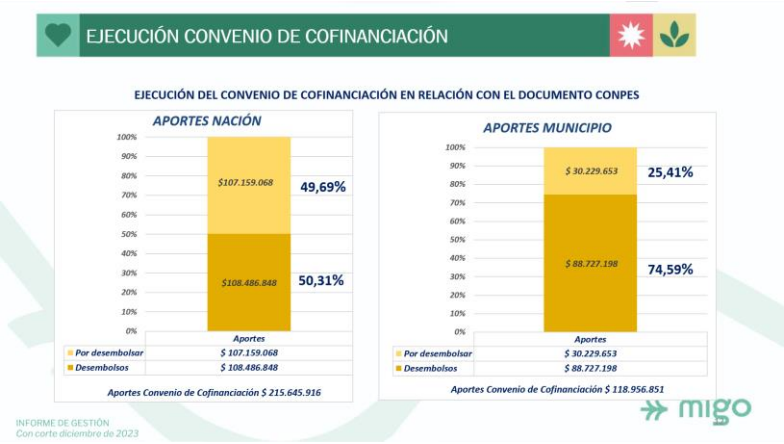

A continuación, se presenta el detallado de los desembolsos que han ingresado a las cuentas del encargo fiduciario por fuentes de financiación, adicionalmente se reflejan los aportes adicionales al convenio de cofinanciación por concepto de redes de servicio público y otros aportes (multas, rendimientos).

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Es importante resaltar que la información es conciliada de manera mensual con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	NACION		MUNICIPIO		OTROS APORTES ENTE GESTOR	
			OTRAS FUENTES	BIRF	MUNICIPIO	USCO	Redes de Servicio Público	Multas, rendimientos
27/10/2014	Aporte Municipio	13.000.000.000,00			13.000.000.000,00			
13/11/2014	Aporte Municipio	1.095.385.000,00			1.095.385.000,00			
13/11/2014	Aporte Municipio	43.898.824,00			43.898.824,00			
	APORTES 2014	**14.139.283.824,00**	**0,00**	**0,00**	**14.139.283.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08/04/2015	Aporte Nación	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00					
04/06/2015	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
05/06/2015	Aporte Municipio	5.099.824,00			5.099.824,00			
05/06/2015	Aporte Municipio	38.799.000,00			38.799.000,00			
	APORTES 2015	**4.293.898.824,00**	**2.250.000.000,00**	**0,00**	**2.043.898.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17/06/2016	Aporte Nación	8.046.000.000,00	8.046.000.000,00					
	APORTES - 2016	**8.046.000.000,00**	**8.046.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19/02/2017	Aporte Nación	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00					
16/05/2017	Aporte Municipio	788.817.644,00			788.817.644,00			
17/05/2017	Aporte Municipio	2.531.082.161,00			2.531.082.161,00			
25/05/2017	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
09/06/2017	Aporte Municipio	461.421.525,00			461.421.525,00			
17/07/2017	Aporte Municipio	461.421.525,00			461.421.525,00			
11/08/2017	Aporte Municipio	1.461.421.525,00			1.461.421.525,00			
08/09/2017	Aporte Municipio	460.573.525,00			460.573.525,00			
10/10/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
20/11/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
05/12/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
18/12/2017	Aporte Municipio	458.815.520,00			458.815.520,00			
	APORTES 2017	**28.500.000.000,00**	**19.500.000.000,00**		**9.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10/05/2018	Aporte Nación	21.902.000.000,00		21.902.000.000,00				
06/06/2018	Aporte Municipio	1.309.345.809,00			1.309.345.809,00			
07/06/2018	Aporte Municipio	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00			
04/07/2018	Aporte Municipio	3.000.000.000,00			0,00	3.000.000.000,00		
06/07/2018	Aporte Municipio	654.672.904,00			654.672.904,00			
06/07/2018	Aporte Municipio	800.000.000,00			800.000.000,00			
08/08/2018	Aporte Adicional	1.500.000.000,00					1.500.000.000,00	
08/08/2018	Aporte Municipio	654.672.904,00			654.672.904,00			
08/08/2018	Aporte Municipio	1.260.000.000,00			1.260.000.000,00			
30/08/2018	Aporte Municipio	97.380.189,00			97.380.189,00			
03/12/2018	Aporte Municipio	881.308.383,00			881.308.383,00			
13/12/2018	Aporte Municipio	3.500.579.920,00			3.500.579.920,00			

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	APORTES 2018	**38.059.960.109,00**	**0,00**	**21.902.000.000,00**	**11.657.960.109,00**	**3.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
31/01/2019	Aporte Municipio	4.500.000.000,00				4.500.000.000,00		
25/02/2019	Aporte Municipio	1.222.052.300,00			1.222.052.300,00			
28/02/2019	Aporte Municipio	842.619.811,00			842.619.811,00			
27/03/2019	Aporte Adicional	1.057.357.870,00					1.057.357.870,00	
23/04/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
10/05/2019	Otros Aportes	115.277.484,00						115.277.484,00
27/05/2019	Aporte Nación	18.663.494.688,00		18.663.494.688,00				
31/05/2019	Rendimientos Otros Aportes	5.689,50						5.689,50
21/06/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
30/06/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.453,22						9.453,22
23/07/2019	Aporte Usco	10.500.000.000,00				10.500.000.000,00		
29/07/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
08/07/2019	Aporte empresas públicas convenio N° 001	410.809.349,00					410.809.349,00	
08/07/2019	Aporte empresas públicas convenio N° 002	342.742.889,00					342.742.889,00	
31/07/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.799,87						9.799,87
21/08/2019	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
21/08/2019	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
30/08/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.800,70						9.800,70
30/09/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.455,60						9.455,60
16/10/2019	Aporte Usco	9.000.000.000,00				9.000.000.000,00		
25/10/2019	Aporte Nación	5.995.302.428,62		5.995.302.428,62				
30/10/2019	Aporte Nación	6.875.464.717,00		6.875.464.717,00				
31/10/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.802,34						9.802,34
30/11/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.457,18						9.457,18
30/12/2019	Rendimientos Otros Aportes	16.541,59						16.541,59
	APORTES 2019	**67.525.201.536,62**	**0,00**	**31.534.261.833,62**	**10.064.672.111,00**	**24.000.000.000,00**	**1.810.910.108,00**	**115.357.484,00**
02/01/2020	Aporte empresas publicas convenio N° 001	12.976.782,00					12.976.782,00	
31/01/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.614,81						28.614,81
31/01/2020	Rendimientos Otros Aportes	11.143,29						11.143,29
29/02/2020	Rendimientos Otros Aportes	26.775,01						26.775,01
31/03/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.628,43						28.628,43
15/04/2020	Aporte Municipio	700.000.000,00			700.000.000,00			0,00
30/04/2020	Rendimientos Otros Aportes	27.711,70						27.711,70
31/05/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.642,41						28.642,41
30/06/2020	Rendimientos Otros Aportes	27.725,22						27.725,22
30/07/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.656,39						28.656,39

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

23/07/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
10/08/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
10/08/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
31/08/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.663,51						28.663,51
04/09/2020	Aporte Municipio de Neiva	1.949.343.082,00			1.949.343.082,00			
30/09/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.745,63						27.745,63
31/10/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.677,49						
27/11/2020	Devolución Recursos no utilizados Fuente BIRF	-401.673.972,48		-401.673.972,48				
30/11/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.759,18						
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	600.000.000,00			600.000.000,00			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	620.000.000,00			620.000.000,00			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	228.917.969,65			228.917.969,65			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	251.121.598,35			251.121.598,35			
31/12/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.691,49						28.691,49
	APORTES AÑO 2020	**5.461.034.894,08**	**0,00**	**-401.673.972,48**	**5.8449.382.650**	**0,00**	**12.976.782,00**	**349.434,56**
31/01/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.698,61						28.698,61
28/02/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	25.927,44						25.927,44
31/03/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.712,15						28.712,15
19/04/2021	Aporte de la Nación Vigencia 2021	13.044.420.214,00	13.044.420.214,00					
30/04/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.792,73						27.792,73
15/05/2021	Aporte Municipio de Neiva	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
21/05/2021	Aporte Municipio de Neiva	1.172.000.000,00			1.172.000.000,00			
31/05/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.726,17						28.726,17
2021-06-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.806,30						27.806,30
2021-07-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.740,19						28.740,19
2021-08-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.747,32						28.747,32
2021-09-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.826,78						27.826,78
2021-10-06	Aporte Municipio de Neiva Funcionamiento	200.000.000,00						
2021-10-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	12.609,33						12.609,33
2021-11-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	981,30						981,30
2021-12-07	Aporte de la Nación 2021	3.972.854.455,00	3.972.854.455,00					
2021-12-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.014,27						1.014,27
	APORTES AÑO 2021	**20.389.542.251,59**	**17.017.274.669,00**	**0,00**	**3.172.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**267.582,59**
2022-01-27	Aporte Municipio de Neiva Funcionamiento	0,00						
2022-01-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1,014,43						1,014.43

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2022-02-09	Aporte de la Nación vigencia 2021	5,511,569,000,00	5,511,569,000.00					
2022-02-09	Aporte de la Nación vigencia 2021	928,461,350,00	928,461,350.00					
2022-02-28	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	916,15						916.15
2022-03-08	Aporte Municipio de Neiva Funcionamiento	0,00						
2022-03-08	Aporte Municipio de Neiva Funcionamiento	0,00						
2022-03-24	Aporte Municipio de Neiva OAEG	200,000,000,00						200,000,000.00
2022-03-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1,014,96						1,014.96
2022-04-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	928,50						928,50
2022-05-04	Aporte Municipio Funcionamiento	300,000,000,00						
2022-05-11	Aporte Municipio Funcionamiento	190.000,000,00						
2022-05-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1,015,49						1,015,49
2022-06-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	982,96						982,96
2022-07-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.015,96						1.015,96
2022-08-26	Aporte Municipio de Neiva	1.424.529.113,00			1.424.529.113,00			
2022-08-26	Aporte Municipio de Neiva	1.575,470.887,00			1.575,470.887,00			
2022-08-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.016,20						1.016,20
2022-09-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	983,70						983,70
2022-10-26	Devolución Convenio 002 Ceibas	-1.199.158,00					-1.199.158,00	
2022-10-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.016,74						1.016,74
2022-11-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	904,01						904,01
2022-12-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	861,88						861,88
	APORTES AÑO 2022	**9.638.842.916,98**	**6.440.030.350,00**	**30,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	-1.199.158,00	**200,011.724,98**
2023-02-12	Aporte de la Nación vigencia 2022	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00					
2023-01-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	862,11						862,11
2023-02-28	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	778,90						778,90
2023-03-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	862,50						862,50
2023-04-35	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	834,90						834,90
2023-05-10	Aporte Municipio de Neiva	2.800.000.000,00			2.800.000.000,00			
2023-05-10	Aporte Municipio de Neiva	200.000.000,00					2000.000.000,00	
2023-05-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	862,97						862,97
2023-06-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	835,29						835,29
2023-07-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	863,35						863,35
2023-08-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	863,61						863,61
2023-09-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	700,07						700,07
2023-10-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	21,72						21,72
2023-11-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	21,60						21,60

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2023-12-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	22,32						22,32
	APORTES AÑO 2023	5.198.962.996,34	2.198.955.467,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00	200.000.000,00	7.529,34
	TOTAL, APORTES	206.192.727.353,61	55.452.260.486,00	53.034.587.861,14	61.727.197.518,00	27.000.000.000,00	3.522.687.732,00	315.993.755,47

- **% EJECUCION DE APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

FUENTES DE FINANCIACIÓN	Aportes proyectados al 2028	Ejecución diciembre 2023	% Ejecución
Municipio	118.956.851	88.727.198	**74,59%**
Nación	215.645.916	108.486.848	**50.31%**
TOTAL, INGRESOS	**316.258.333**	**197.214.046**	**58,94%**

Cifras en miles de pesos

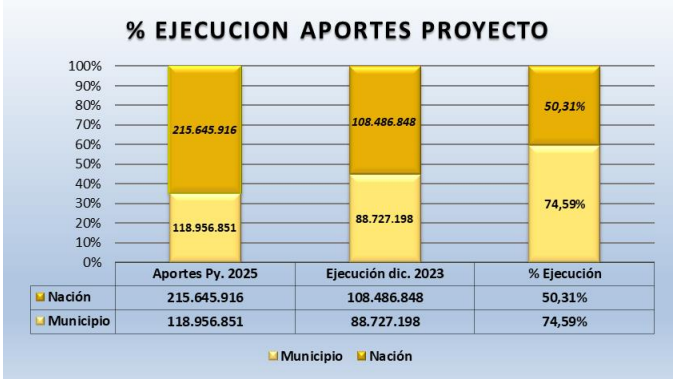

- ***APORTES PENDIENTES POR DESEMBOLSAR***

MUNICIPIO DE NEIVA:

Vigencia i	AP Cons i	AP Crr	IPC i	AP Crr * (IPC i/IPC 2012)	Balance i	Acumulado constantes 2012
2.013	9.000.000.000,00	9.174.403.143,17	79,56	9.000.278.598,85	278.598,85	278.598,85
2.014	15.500.000.000,00	4.964.880.680,83	82,47	4.698.786.675,62	- 10.801.213.324,38	- 10.800.934.725,53
2.015	15.500.000.000,00	2.043.898.824,00	88,05	1.811.769.485,67	- 13.688.230.514,33	- 24.489.165.239,86
2.016	9.000.000.000,00	-	93,11	-	- 9.000.000.000,00	- 33.489.165.239,86
2.017	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	96,92	7.247.730.086,67	- 1.752.269.913,33	- 35.241.435.153,19
2.018	9.000.000.000,00	14.657.960.109,00	100	11.440.537.865,07	2.440.537.865,07	- 32.800.897.288,11
2.019	9.000.000.000,00	34.064.672.111,00	103,8	25.614.139.289,63	16.614.139.289,63	- 16.186.757.998,48
2.020	9.000.000.000,00	5.849.382.650,00	105,48	4.328.254.795,53	- 4.671.745.204,47	- 20.858.503.202,95
2.021	-	3.172.000.000,00	111,41	2.222.193.698,95	2.222.193.698,95	- 18.636.309.504,00
2.022	-	3.000.000.000,00	126,03	1.857.890.978,34	1.857.890.978,34	- 16.778.418.525,66
2.023	-	2.800.000.000,00	137,62	1.587.995.930,82	1.587.995.930,82	- 15.190.422.594,84
2.024		6.000.000.000,00	146,43	3.198.115.140,34	3.198.115.140,34	- 11.992.307.454,50
2.025		5.885.219.658,00	150,82	3.045.626.536,98	3.045.626.536,98	- 8.946.680.917,52
2.026		6.000.000.000,00	155,33	3.014.871.563,77	3.014.871.563,77	- 5.931.809.353,76
2.027		6.000.000.000,00	159,99	2.927.057.941,12	2.927.057.941,12	- 3.004.751.412,63
2.028		6.344.433.476,01	164,8	3.004.751.412,63	3.004.751.412,63	-
TOTAL	**85.000.000.000,00**	**118.956.850.652,01**			**2.023**	**- 26.784.189.077,54**

NACIÓN

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Convenio Cof. (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000	-	-	-	-	-	-	167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500		-	-	-	200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	-	-	211.691.489
Otrosí N° 3 (dic. 2021)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	12.469.093	-	26.346.967	35.080.382	39.768.430	10.000.000	21.619.549	215.645.916
Desembolsos	-	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	31.534.262	-401.674	17.017.275	6.440.030	2.198.955	-	-	108.486.848
Por Desembolsar	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	-401.674	-	9.329.692	37.970.044	75.539.519	85.539.519	107.159.068	107.159.068

Cifras en miles de pesos

7.2.2 PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO

A continuación, se relacionan las erogaciones efectuadas durante la vigencia del proyecto por fuentes de financiación, los cuales se encuentran debidamente conciliados con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A, tal y como se reflejan a continuación:

VIGENCIA	PAGOS	VALOR	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS MUNICIPIO		OTROS APORTES ADICIONAL AL CONV. COF.
			OTRAS FTES	BIRF	MUNICIPIO/SGP	USCO	
2014	PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP	83.028	0	0	83.028	0	0
2015		5.852.290	2.249.979	0	3.602.311	0	0
2016		8.315.526	4.634.562	0	3.680.964	0	0
2017		26.408.810	16.755.319	0	9.653.491	0	0
2018		45.457.469	6.100.334	16.728.693	18.129.481	2.998.972	1.499.989
2019		67.138.943	39.999	32.196.674	12.667.503	20.633.793	1.600.974
2020		10.031.645	0	4.109.220	3.411.431	2.353.609	157.385
2021		5.587.264	2.644.352	0	2.831.028	0	111.884
2022		11.584.067	8.857.240	0	2.526.307	0	200.520
2023		7.973.837	5.413.993	0	2.359.844	0	200.000
TOTAL, PAGOS		188.432.880	46.695.778	53.034.588	58.945.388	25.986.373	3.770.752

Diciembre 2023 *Cifras en miles de pesos*

7.2.3 INFORME DE PAGOS POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Adicionalmente la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte diciembre 2023 y proyectado al cierre del proyecto adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Ministerio de Transporte a través de la UMUS, por tanto se presentó el siguiente informe financiero correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reflejan los costos financieros que debe asumir el proyecto con el fin de cumplir con la adecuada ejecución de los

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

A continuación, se presenta el informe de ejecución de cada componente por fuentes de financiación de acuerdo con las erogaciones realizadas desde el inicio del proyecto hasta la vigencia 2023, así como también el porcentaje de ejecución con relación a las inversiones proyectadas hasta el cierre del proyecto de acuerdo con lo establecido en el otrosí N° 3 al Convenio de Cofinanciación suscrito en el mes de diciembre de 2021 por parte del Gobierno Nacional, Territorial y el Ente Gestor.

COMPONENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos Ctes)			POAI Py.	% DE EJECUCIÓN
Construcción Total	Nación	8.048	26.415	27.820	**94.95%**
	Municipio	9.380			
	Otros Aportes	324			
	Nación Birf	8.663			
Intercambiador vial USCO	Municipio	28.109	29.236	32.229	**90.71%**
	Otros Aportes	1.127			
Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8	Nación	14.366	38.411	38.411	**100%**
	Municipio	22.545			
	Otros Aportes	1.500			
Patios y Talleres	Nación	7.480	7.480	48.174	**15.53%**
	Municipio				
Semaforización	Nación	2.799	2.799	23.711	**11.80%**
	Municipio				
Rehabilitación incluyendo andenes	Nación	4.445	53.582	53.582	**100.00%**
	Municipio	4.343			
	Otros Aportes	423			
	Nación Birf	44.371			
Gestión de Flota	Nación	355	355	63.360	**0.56%**
	Municipio				
Urbanismo	Nación	3.137	3.137	3.724	**84,22%**
	Municipio				
Terminales	Nación	485	485	4.434	**10.93%**
	Municipio				
Carril Prioritario Simple	Nación	317	433	14.544	**2.98%**
	Otros Aportes	116			
CISC	Nación		0	0	**0.00%**
	Municipio				
Andenes	Nación	4.377	4.377	4.630	**94.53%**
	Municipio				
Peatonalización	Nación		632	632	**100.00%**
	Municipio	632			
Gerencia del Proyecto	Nación	1.243	21.092	31.485	**66.99%**
	Municipio	19.568			
	Otros Aportes	281			
Costos Financieros	Nación		0	5.321	**0.00%**
	Municipio				
TOTAL, INVERSIÓN	**Nación**	**46.696**	**188.433**	**352.057**	**53,52%**
	Municipio	**84.932**			
	Nación BIRF	**53.035**			
	Otros Aportes	**3.771**			

Diciembre 2023 ***Cifras en millones***

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.4 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO.



- Se estructuro el modelo financiero del POAI correspondiente a la vigencia 2023, en el cual se contemplan los aportes del proyecto histórico y proyectado, Informes de pagos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, con esta información base se proyecta el POAI, adicionalmente se plasmaron todas las fases de las obras del proyecto con sus respectivas interventorías hasta el año 2028.

- El informe del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, es una actividad permanente, toda vez que cada mes se debe realizar la actualización y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo con las ejecuciones reales.

- El POAI, se encuentra actualizado de acuerdo con la información suministrada por las diferentes áreas de la Entidad, por lo tanto, se refleja en el modelo financiero desde el 2014 a septiembre de 2023 (valores ejecutados y conciliados con Fiduciaria) y proyectado por los componentes y fuentes de financiación hasta el cierre del proyecto. Se anexa el Plan Operativo Anual de Inversiones del proyecto. **Ver Anexo N° 5. "Informe Ministerio de Transporte".**

- Es importante resaltar que durante lo corrido de la vigencia se han estructurado varios escenarios del modelo financiero con el fin de presentar al Ministerio de Transporte para su respectiva revisión y validación. Entre los escenarios propuestos se plantea la reprogramación de los aportes hasta la vigencia 2028.

7.3 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, El Sistema Estratégico de Transporte de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública, a nivel del documento fuente; en lo particular el Manual financiero para los SETP diseñado por la UMUS versión 2022. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la constitución de provisiones, así como las relacionadas

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como; las depreciaciones y amortizaciones de diferidos, utilizando el método de línea recta.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Tiene implementado del software contable y financiero para realizar las operaciones de Contabilidad, Presupuesto, aplicando las normas que rigen la materia.

La Entidad actualmente está aplicando los procedimientos establecidos en el Manual Financiero versión 2022, con el fin de presentar los informes a la UMUS, tal y como se relacionan a continuación:

- Archivo plano mensualizado.
- Balance de prueba del proyecto mensualizado
- Estado de inversión acumulada
- Informes de la Fiducia mensualizados
- Informes FS Fiduciaria de Davivienda S.A.
- Notas explicativas
- Conciliaciones de saldos bancarios
- Certificado de Gastos (SOE)
- Certificado de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto
- Amortización del crédito sindicado
- Información de pagos de los contratos C-1
- Resumen de los pagos de los contratos
- Ejecución de redes.

7.3.1 IMPLEMENTACION DEL SOFWARE CONTABLE INSOFT

El SEPT NEIVA tiene implementado el SOFTWARE INSOFT, el cual a diciembre 31 de 2023 se están generando los reportes como son: Balance del Proyecto, Estado de Inversión Acumulada, Archivos planos, SOE, Resumen de los informes de pagos C1, Informes C1, actualmente se tienen el acompañamiento del personal de la Empresa INSOFT con el fin dar solución a las inquietudes presentadas en el momento de generar los reportes y mejorar los procesos de la Entidad, de igual es importante resaltar que permanentemente se está haciendo la respectiva revisión de los informes financieros los cuales son conciliados con la información remitida por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

7.3.2 INFORMACIÓN NARRATIVA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Como parte de la implementación del sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Neiva, se han suscrito contratos de apoyo por el rubro de Gerencia del Proyecto con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la Entidad, los cuales hace parte de los componentes incorporados en el documento CONPES 3756 del 2013, información que se refleja en el Plan Operativo Anual de Inversión - POAI del SETP

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL S.A.S. el cual ha sido estructurado con un horizonte de tiempo de 14 años iniciando desde la vigencia 2014 hasta el 2025, en el cual se puede evidenciar el perfil de aportes de los cofinanciadores del proyecto por anualidad con su respectivas inversiones por fuentes de financiación acorde con los componentes establecidos en el documento CONPES 3756 del 2 de agosto de 2013 y el convenio de cofinanciación con sus otrosíes modificatorios. La información que se refleja en el modelo financiero se encuentra debidamente conciliada con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A con corte septiembre 30 de 2023, y la información que se refleja en el periodo 2022 – 2025, corresponde a proyecciones realizadas de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Ver anexo N° 5. “Plan Operativo Anual de Inversiones”. A continuación, se presenta el informe de avance del proyecto por cada una de las áreas de la Entidad.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8. INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2023

8.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

8.1.1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Desde el Proceso de Planeación Estratégica y durante la vigencia 2023, se socializó y aprobó los documentos mediante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional:

8.1.1.1 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Desde el Proceso de Planeación Estratégica y en coordinación con cada uno de los procesos de la Entidad, se lideró mesas de trabajo donde se formuló y consolidó el Plan de acción para la vigencia 2023, herramienta indispensable para la alta dirección en contar con información de primera mano sobre los avances en las actividades del plan y así tomar decisiones que conlleven a un satisfactorio cumplimiento de lo programado, cumpliendo con el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas de la vigencia 2023, se realizan mesas de trabajo con los líderes de cada proceso, con el fin de realizar el seguimiento al plan de acción del área y consolidar el Plan de acción institucional vigencia 2023 de la Entidad.

Los seguimientos realizados al Plan de acción vigencia 2023, son publicados en la página web de la entidad en el link de Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional



8.1.1.2 PAAC. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023.

Reconociendo la relevancia de desarrollar estrategias que promuevan una atención ciudadana mejorada y combatan la corrupción., la entidad Actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, “Versión 2” conformado por 5 componentes establecidos dentro de la Ley 1474 de 2011: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano y Transparencia

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

y Acceso a la Información, los cuales se encuentran integrados por las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).

Para la Actualización del PAAC se tomó como insumos el informe del seguimiento realizado al PAAC durante en el último cuatrimestre vigencia 2022, realizado por el área de Gestión de Control Interno, el informe de rendición de cuentas vigencia 2022, informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG vigencia 2021 y la elaboración de la matriz de riesgos 2022, con los cuales se diseñan estrategias para mejorar el acceso a la información, atención al ciudadano y fortalecer los canales de comunicación con los grupos de valor de nuestro Municipio.

La construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, parte con la vinculación de todos los contratistas (líderes de los procesos) y la socialización con la comunidad, los cuales participaron en la creación de las actividades buscando mitigar los posibles actos de corrupción que se presenten, fortaleciendo un ambiente de confianza entre el SETP y la ciudadanía, a través de la Página Web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/actualiza-con-nosotros-el-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-paac.html como resultado de este proceso, se contó con la participación de los ciudadanos que dejaron sus observaciones las cuales fueron tomadas en cuentas para la construcción del PAAC 2023. Igualmente, se realizó acompañamiento al proceso de control interno en el seguimiento del PAAC

8.1.1.3 PLAN ESTRATEGICO 2020-2023

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva “Mandato Ciudadano, Territorio de vida y Paz 2020-2023”, el SETP TRANSFEDERAL SAS, formuló, y aprobó su Plan Estratégico Institucional con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 4“Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos” definido en el PDM en mención.

Desde Planificación Estratégica se ha acompañado y apoyado en la tarea de cumplir con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, tarea en la cual la dirección de Transparencia de la Alcaldía Municipal ha venido haciendo un estricto seguimiento reconociendo en el SETP TRANSFEDERAL SAS, compromiso y cumplimiento con los deberes de la Entidad frente a esta normativa.

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas para la vigencia 2023, desde el proceso de Planeación Estratégica se solicitó información con el fin de realizar el segundo seguimiento semestral al Plan Estratégico 2023, con cada una de las áreas de la entidad donde se realizan mesas de trabajo con los líderes de cada proceso.

8.1.1.4 MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023.

Se actualizó el formato de la matriz de riesgos de Gestión y matriz de riesgos Corrupción 2023, de conformidad con la nueva "Guía de Administración del Riesgo" con el fin de mitigar todos los riesgos asociados a nuestro trabajo y mostrar, que en SETP TRANSFEDERAL SAS tenemos cero tolerancias a la corrupción.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Con este fin, La gestión de Planeación Estratégica, de la mano con el área de gestión de Control Interno, han venido liderando un trabajo con todos nuestros contratistas de manera directa, activa y participativa, donde cada uno de los líderes de los procesos de la entidad es el responsable de las acciones que son producto de su trabajo. Como resultado de esta labor se actualizó el Manual de riesgos de Gestión y Corrupción, igualmente; se consolidaron los mapas de riesgos de gestión por procesos y mapa de riesgos de corrupción, que permiten hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a todas nuestras actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

En articulación con el proceso de control interno se han realizado seguimientos a las acciones de los riesgos de Corrupción y de Gestión identificados en cada uno de los procesos de la Entidad de la vigencia 2023.

Los seguimientos realizados a la matriz de riesgos de gestión y corrupción vigencia 2023, son publicados en la página web de la entidad en el link de Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional.

8.1.1.5 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MIPG

Durante este período se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se avanza en la implementación de la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los documentos.

Dando Cumplimiento a la Resolución No. 077 del 29 de Julio de 2019, por el cual se crea el "*Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SETP TRANSFEDERAL S.A.S"*, el área de Planeación Estratégica, en la vigencia del año 2023, realizó el segundo (02) Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde se socializa y se aprueban los siguientes Documentos:

- Plan de Acción Institucional – 2023.
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.
- Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción 2023.

para el cierre de la vigencia 2023; se adelanta la actualización del Sistema Integral de Gestión de Calidad incorporando las últimas disposiciones legales, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es decir, se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se avanza en la implementación de la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los documentos del Sistema Integral de Gestión.

8.1.1.6 REPORTE DE INFORMACIÓN A TRAVES DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN - FURAG VIGENCIA 2022

El Departamento Administrativo de la Función Pública, evalúa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

(FURAG). Dicho formato, opera a través del aplicativo que habilitó, a partir del día 22 de junio de 2023, en línea; a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia 2022 del SETP TRANSFEDERAL SAS. Una vez entregado el usuario, se realizó la socialización con cada líder de los procesos e igualmente se articuló con la oficina de control Interno dando a conocer la implementación del Sistema en la entidad, la metodología y los términos establecidos para el cargue de la información por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, igualmente, se participó de las capacitaciones realizadas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de aclarar dudas e inquietudes en el diligenciamiento de la información que servirá de insumo para la Medición de Desempeño Institucional -MDI- de la entidad, vigencia 2022.

El 26 de Julio de la vigencia 2023, se finalizó el cargue de la información en la plataforma FURAG, por lo que se generó certificado

8.1.1.7 ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2022 Y AUDITORIA ESPECIAL POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Se apoya en el suministro de información requerida para el desarrollo de la auditoría financiera y de Gestión vigencia 2022 realizada por la Contraloría Municipal y la auditoría de actuación especial al Ministerio de Transporte por parte de la Contraloría General de la Nación, en la que se informan los detalles relevantes de las evidencias y seguimiento al cumplimiento del componente de Planeación Estratégica.

8.1.1.8 PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2020-2023

Se presentó el Informe de Gestión y Balance de resultados con los respectivos Documentos soportes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldía de Neiva en el Proceso de Transición de Gobierno, con un cumplimiento del 100%. Inicialmente se desarrolló la primera etapa con corte a 30 de septiembre de 2023, donde se participa de las mesas técnicas programadas mediante circular No. 0036 de noviembre de 2023, y se evidencia mediante actas de empalme el desarrollo de las sesiones programadas y las respuestas brindadas a las aclaraciones solicitadas por parte del equipo de empalme del gobierno entrante.

En la segunda etapa del proceso se realiza apoyo en la actualización de información con corte a 30 de diciembre de la vigencia 2023 del Informe de gestión y balance de resultados con sus respectivos soportes en el Proceso de Transición de Gobierno 2020-2023.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8.2 PROCESOS MISIONALES

8.2.1 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Mediante el departamento de Gestión de Infraestructura de SETP TRANSFEDERAL S.A.S., nos complace presentar el siguiente Informe de Gestión, que abarca el progreso alcanzado en este componente durante el año fiscal 2023.

En el ámbito de esta área, se llevaron a cabo los siguientes proyectos y procesos hasta finales del 2023, los cuales concluyeron esta etapa con el siguiente estado de avance:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR ($)	AVANCE		ESTADO / OBSERVACIONES
			FÍSICO	FINANCIERO (COBRADO)	
No. 033 de 2015	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA	$ 2.968.759.046,00	43 kilómetros Diseñados	$ 2.968.759.046,00	Liquidados y recibido los productos
No. 036 de 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA".	$ 237.499.500,00		$ 237.499.500,00	
No. 052 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 6.788.938.012,81	2,5 km	$ 6.783.539.659,95	Contrato de Obra Liquidado.
No. 059 de 2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 543.773.402,00		$ 543.338.383,00	Contrato de Interventoría Liquidado.
No. 061 de 2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.532.728.735,00	3,0 km	$ 5.514.972.777,85	Contrato de Obra Liquidado.
No. 063 de 2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 507.487.171,00		$ 505.851.797,00	Contrato de Interventoría Liquidado.
No.003 de 2016	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 29.991.185.092	100%	$ 26.998.178.703	Contrato de Obra Liquidado.
No. 001 de 2016	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¨CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA¨	$ 2.237.672.534		$ 2.237.672.534	Contrato de Interventoría Liquidado
No. 064 de 2015	DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN	$ 35.949.494.577,51	100%	$ 35.938.949.808	Contrato de Obra Liquidado.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO				
No. 002 de 2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO"	$ 2.481.637.126,00		$ 2.471.892.637,59	Contrato de Interventoría Liquidado.
No. 020 de 2016	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.020.789.037,98	2,8 km	$ 5.020.135.986,00	Contrato de Obra Liquidado.
No. 021 de 2016	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 471.893.224,00		$ 471.844.083,00	Contrato de Interventoría Liquidado.
No. 0120 de 2017	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 14.212.880.622,00	4,1 km	$ 14.202.742.467	Contrato de Obra Liquidado.
No. 0119 de 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.592.666.012,00		$ 1.592.666.012	Contrato de Interventoría Liquidado
No. 0122 de 2017	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 15.830.904.732,00	3,9 km	$ 15.545.881.699	Contrato de Obra Liquidado
No. 0121 de 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.399.667.053,00		$ 1.399.647.054	Contrato de Interventoría Liquidado.
No 083 de 2018	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 9.659.753.738,00	2,1 km	$ 9.236.272.970,36	Contrato de Obra Liquidado
No. 082 de 2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 996.164.470,00		$ 981.911.030,80	Contrato de Interventoría Liquidado.
No. 150 de 2018	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 13.805.244.497,00	2,5 km	$ 13.801.238.729,00	Contrato de Obra Liquidado
No. 149 de 2018	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA".	$ 1.190.644.980,00		$ 1 190.644.980,00	Contrato de Interventoría Liquidación.
No. 011 de 2021	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA	$ 12.076.737.394	0.50	$ 147.900.000,00	En ejecución

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA				
No. 150 de 2020	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 967.682.820		$ 132.123.844,00	
No. 186 de 2021	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 4.193.801.620	2,5 km	$ 3.984.111.539,00	Recibido y en proceso de liquidación
No. 161 de 2021	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 436.592.035		$ 392.932.831,50	Terminado, en proceso de recibo y liquidación.
No. 258 de 2021	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 384.965.000	0.31	$ 96.241.250,00	En elaboración de los estudios y diseños. Entregados 4 de los 13 Productos. Suspendido
No. 100 de 2022	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	$ 554.008.701	0.71	$ 349.704.785,00	En elaboración de los estudios y diseños. Entregados 10 de los 14 Productos. Suspendido
No. 103 de 2022	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	$ 138.269.040		$ 83.236.943,00	
No. 118 de 2022	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 404.213.250	0.62	$ 222.317.287,50	En elaboración de los estudios y diseños. Recibidos 8 de los 13 Productos.
No. 067 de 2023	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 4.020.961.463	250 Und	$ 3.424.512.709,00	Suspendido.
No. 068 de 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA."	$ 231.479.633		$ 95.842.747,00	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CONVENIOS

PROCESO	OBJETO	VALOR	ESTADO
092 de 2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLIO DE CIUDAD DE NEIVA	$ 32.400.000.000	En proceso de Liquidación.
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ´PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	$ 0	Liquidado.
001 de 2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE AVENIDA LA TOMA Y AVENIDA CIRCUNVALAR DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 426.593.301	Liquidado
002 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 21 Y AVENIDA LA TOMA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 355.911.219	En proceso de Liquidación.
001 de 2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 947,027,923.00	Liquidado

8.2.1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2023 corresponden a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistema, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

Proyecto FASE I

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
1	La Voragine-Calamari	Nueva	Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1	C	**122**
10	Palmas	Nueva	Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30	B	**264**
6	El Oasis	Nueva	Calle 24 Sur entre Carrera 40 y Carrera 32	B	**831**
6	Andalucía	Nueva	Carrera 10 Entre Calle 4 y Calle 19	C	**1260**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 (Sector: B/ La Amistad – San Bernardo)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)	
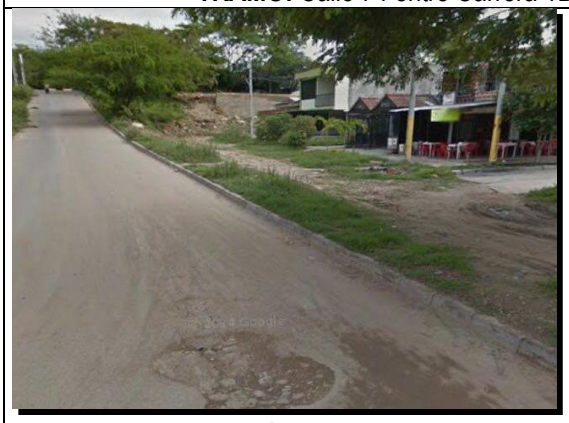 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)	
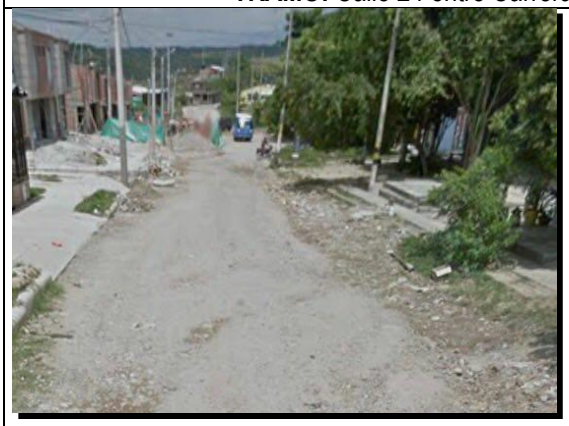 **Antes**	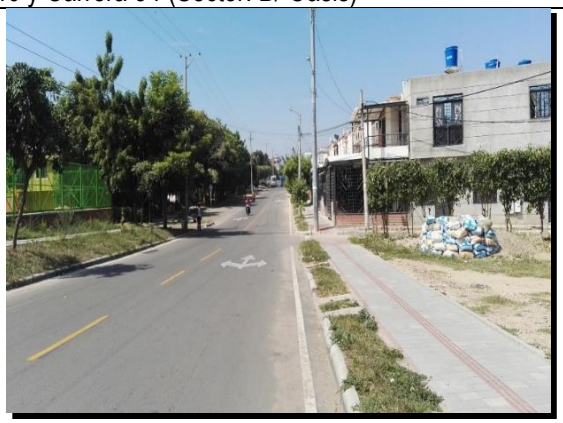 **Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)



Antes



Ahora

Proyecto FASE II

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
10	Víctor Feliz	Nueva	Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19	C	**856**
6	Santa Isabel	Rehab.	Calle 2 Sur entre Carrea 15 y Carrera21	B-C	**423**
4	Centro	Nueva	Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8	B	**109**
4	Centro	Nueva	Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3	B	**119**
6	Canaima	Nueva	Carrera 22 entre Av max D. y Calle 26 Sur	B	**505**
5	Primero de Mayo	Nueva	Carrera 18 entre Calle 12 y Calle 9	B	**210**
5	El Jardín	Nueva	Carrera 28 entre Calle 20 y Calle 18	B	**228**
7	San Martín.	Rehab	Cll 1D entre Cra 15B y Cra 16 - Cra 15B entre Cll 1D y Cll 1G - Cll 1G entre Cra 15 y Cra 15B	B	**548**

TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)



Antes



Ahora

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18 (Sector: B/ El Jardin)	
 **Antes**	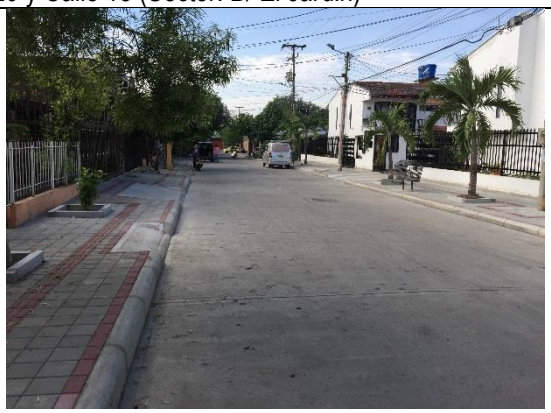 **Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)	
	
Antes	**Ahora**

Proyecto FASE III

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
8	Las Acacias	Rehab.	Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30	B	**410**
6	Canaima	Nueva	Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av Max Duque	B	**491**
10	La Rioja	Rehab.	Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 25B	B	**764**
3	José Eustacio	Rehab.	Carrera 7 Av. 26 y Calle 21	D	**1172**

TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)	
	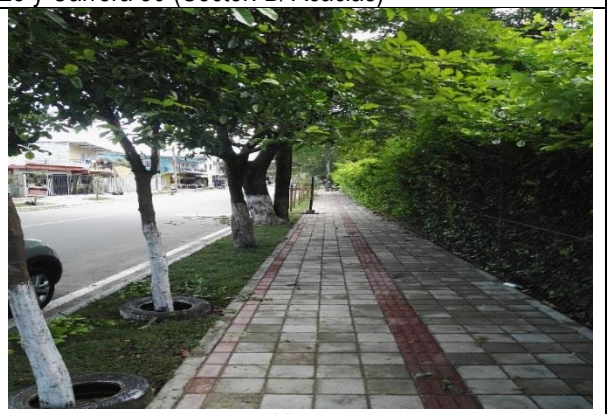
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av. Max Duque (Sector: B/ Canaima)	
	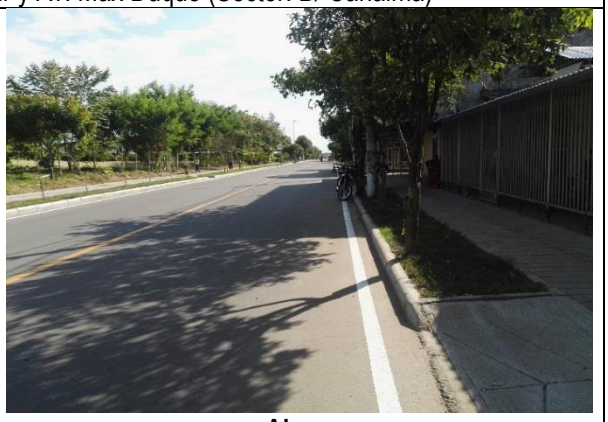
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 45 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)	
	
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Proyecto FASE IV

FASE IV	
TRAMO: Calle 70 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ La Fortaleza)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 45 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ Cándido)	
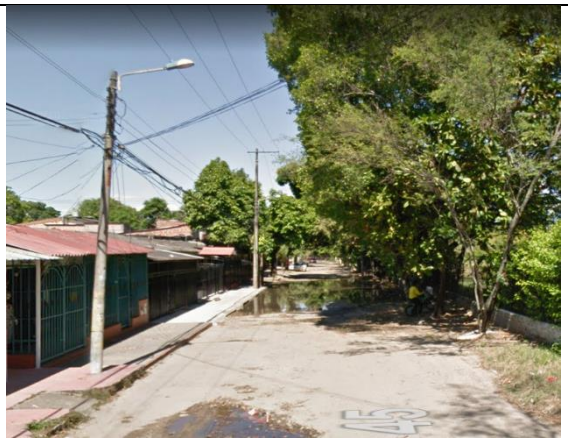	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 58 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ Las Mercedes)	
	
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Calle 79 entre Carrera 1E y Carrera 2 (Sector: B/ Minuto de Dios)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 18 entre Carrera 19 y Carrera 28 (Sector: B/ La Libertad)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 31 entre Calle 26 Sur y Calle 31 Sur (Sector: B/ Puertas del Sol)	
 **Antes**	 **Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Calle 46 entre Carrera 23 y Carrera 28 (Sector: Venecia – Villa Cecilia)	
	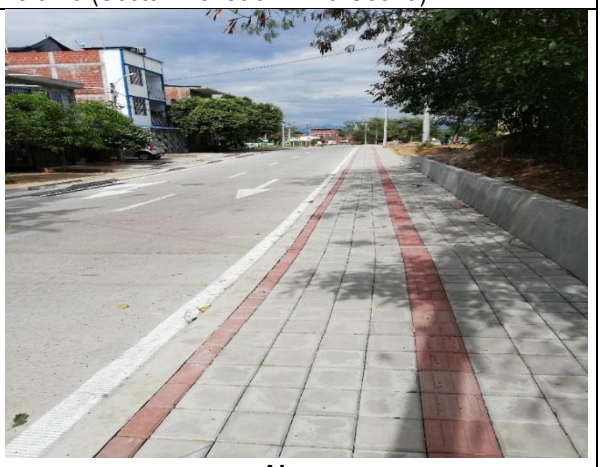
Antes	**Ahora**

Proyecto FASE V

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
6	Timanco - Loma Linda	Rehab.	Cll. 16 sur entre Cra. 29 y Cra. 12	B	**1170,64**
6	Timanco - Loma Linda	Rehab.	Cra. 25 entre Cll. 16 sur y Cll. 18E sur	B	**247,42**
8	Las Acacias	Rehab.	Cra. 28 entre Cll. 1A y Cll. 2	B	**388,75**
7	San Martin	Rehab.	Cll. 1C entre Cra. 15D y Cra. 21	B	**393,473**
4-7	Ventilador	Rehab.	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra. 21	B-C	**1650,27**

FASE V	
TRAMO: Carrera 25 entre Calle 16 sur y 18E sur (Sector: B/ Timanco)	
	
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Calle 1C entre Carrera 15D y Carrera 22 (Sector: B/ San Martin)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 28 entre Calle 1A y Calle 2 (Sector: B/ Las Acacias)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 16 sur entre Carrera 29 y Carrera 14 (Sector: B/ Timanco)	
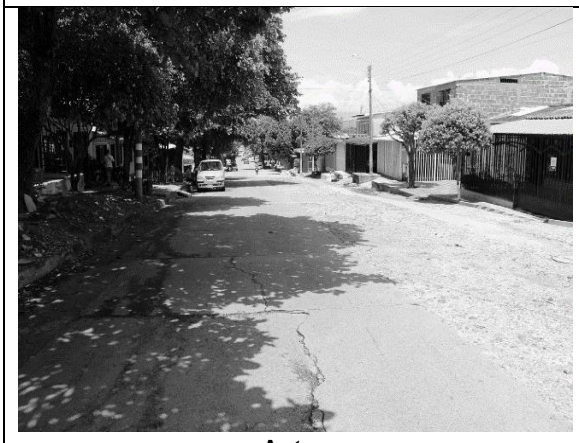	
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRAMO: Calle 2 entre Carrera 7 y Carrera 21 (Sector: B/ Quebraditas)	
	
Antes	**Ahora**

Proyecto FASE VI

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
2	La Trinidad	Nueva	Cra. 23 entre Cll. 51 y Cra. 73	B	**860**
3-4	Toma - Quirinal	Rehab.	Cra. 7 entre Cll. 21 y Av. La Toma	C	**1220**

FASE VI	
TRAMO: Carrera 7 entre Calle 21 y Avenida La Toma	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 23 entre Calle 51 y Calle 73	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	
Antes	**Ahora**

Proyecto FASE VII

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
4	La Toma - Centro - Estadio - Quirinal	Rehabilitación	Cra. 7 entre Av. La Toma y Av. Circunvalar	D	**2500**

FASE VII	
TRAMO: Carrera 7 entre Avenida La Toma y Avenida Circunvalar	
	
Antes	**Ahora**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

INTERCAMBIADORES VIALES

Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.

RETORNO ESTE
 

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co


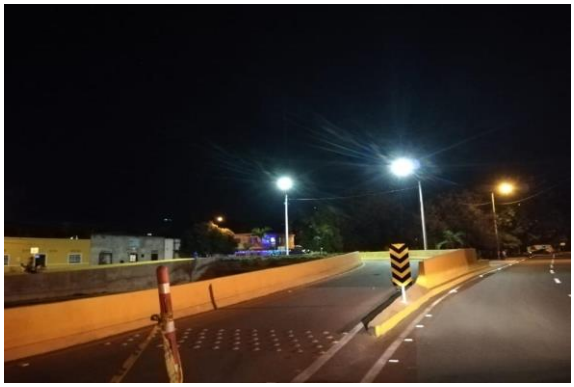



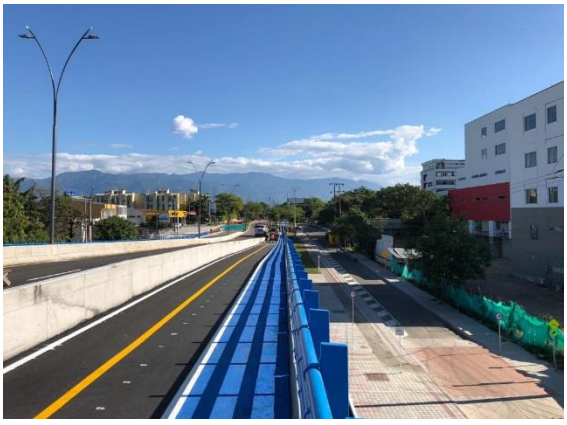

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Construcción Del Intercambiador Y Solución Peatonal Universidad Sur colombiana Del Municipio De Neiva, Departamento Del Huila.



RETORNO ESTE





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co






PROYECTO PATIO TALLER ESTE
ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION PATIO TALLER ESTE

Alcance Patio Taller Este

Etapa I: Etapa de Elaboración de Estudios Técnicos, Diseños y Aprobaciones

ÍTEM	PRODUCTO ENTREGABLE	% DE AVANCE
1,00	Informe inicial de análisis y recopilación de información	100%
2,00	Estudio De Suelos	100%
3,00	Alternativas de Diseño	100%
4,00	Diseño Arquitectónico y Urbanístico	100%
5,00	Diseño Estructural	100%
6,00	Diseño Eléctrico y Diseño de Redes de Vos y Datos	100%

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	7,00	Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario y Red Contra Incendios	100%
	8,00	Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías Internas y Vías de Acceso	100%
	9,00	Plan De Manejo Ambiental	100%
	10,00	Plan De Manejo Trafico	100%
	11,00	Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas	100%
	12,00	Render	100%
	13,00	Permisos, Licencias y Aprobaciones	100%





Etapa II: Etapa de Construcción





PROYECTO FASE VIII

Comuna	Barrios	Tipo de Intervención	Tramos o Vías Intervenidas	Long/Mts
4	Centro	Peatonalización	Calle 8 entre Cra. 7 y Cra. 6	136

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

INTERVENCIÓN TRAMO: Calle 8 entre Cra. 6 y Cra. 7	
	
Antes	**Ahora**

PROYECTO FASE IX

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
4	La Toma – los mártires- Centro	Andenes	Cra. 2 entre Av. La Toma y calle 5	D	**1250**

FASE IX	
SUBTRAMO 1: Carrera 2 entre Avenida La Toma y Calle 13r	
	
	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co




PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE

Información General Contractual del Proyecto de Adquisición Predial Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste

OBJETO:	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
VALOR:	$ 1.814.560.000
ESTADO:	Adquirido
OBSERVACIONES:	Se surtió el respectivo proceso de adquisición y ya se cuenta con el predio en propiedad del Ente Gestor.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Información General Contractual del Proyecto de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste:

OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
CONTRATISTA:	INGECAG S.A.S.
CONTRATO NO.:	258 de 2021
PLAZO:	5 meses.
FECHA DE INICIO:	10 / 2 / 2022
FECHA SUSPENSIÓN 01:	10 / 3 / 2022
FECHA REINICIO 01:	10 / 6 / 2022
FECHA SUSPENSIÓN 02:	07 / 10 / 2022
FECHA REINICIO 02:	Indefinido
FECHA FINALIZACIÓN:	Indefinido
VALOR:	$ 384.965.000
ESTADO:	Vigente, Suspendido.
OBSERVACIONES:	El alcance del proyecto contempla la elaboración de estudios y diseños para las dos edificaciones operacionales del sistema (Patio Taller y Estación Cabecera)

Alcance del Proceso de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste:

Entregables de Consultoría		
ÍTEM	**PRODUCTO ENTREGABLE**	**% DE AVANCE**
1,00	Informe inicial de análisis y recopilación de información	100%
2,00	Estudio De Suelos	100%
3,00	Alternativas de Diseño	100%
4,00	Diseño Arquitectónico y Urbanístico	100%
5,00	Diseño Estructural	90%
6,00	Diseño Eléctrico y Diseño de Redes de Vos y Datos	90%

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	7,00	Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario y Red Contra Incendios	90%	
	8,00	Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías Internas y Vías de Acceso	80%	
	9,00	Plan De Manejo Ambiental	80%	
	10,00	Plan De Manejo Trafico	80%	
	11,00	Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas	50%	
	12,00	Render	90%	
	13,00	Permisos, Licencias y Aprobaciones	40%	

En lo que, respecto al proceso de Construcción, solo hasta cuando se tengan los estudios técnicos y diseños definitivos, se estructurara el proyecto de obra.

PROYECTO CARRIL PRIORITARIO

Información General Contractual del Proyecto de Consultoría Carril Prioritario:

OBJETO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO EYD SETP
CONTRATO NO.:	100 de 2022
PLAZO INICIAL:	4 meses.
PLAZO ADICIONAL:	2 meses y 15 días
PLAZO FINAL:	6 meses y 15 días
FECHA DE INICIO:	2 / 8 / 2022
FECHA SUSPENSIÓN 01:	09 / 11 / 2022
FECHA REINICIO 01:	31 / 01 / 2023
FECHA SUSPENSIÓN 02:	05 / 05 / 2023
FECHA REINICIO 02:	Indefinido
FECHA FINALIZACIÓN:	Indefinido

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

VALOR INICIAL:	$ 454.008.701
VALOR ADICIONAL:	$ 100.000.000
VALOR TOTAL:	$ 554.008.701
ESTADO:	Vigente – Suspendido.
OBSERVACIONES:	El alcance del proyecto contempla la elaboración de estudios y diseños para la ampliación a 3 carriles de todo el corredor indicado en el objeto.

Alcance del Proceso de Consultoría Carril Prioritario:

Entregables de Consultoría		
ÍTEM	**PRODUCTO ENTREGABLE**	**% DE AVANCE**
1,00	*Recopilación de información base.*	100%
2,00	*Estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación.*	100%
3,00	*Estudios y diseño geométrico.*	100%
4,00	*Estudios y diseños de tránsito.*	100%
5,00	*Estudio de patología*	100%
6,00	*Estudios y diseños de urbanismo y espacio público.*	100%
7,00	*Estudios y diseños de redes.*	100%
8,00	*Plan de Manejo Ambiental.*	100%
9,00	*Plan de manejo de tráfico.*	100%
10,00	*Estudios socio prediales.*	100%
11,00	*Estudios y diseños de geotecnia y pavimentos.*	90%
12,00	*Diseño de fundaciones de puentes vehiculares, peatonales, obras de arte y otras estructuras de contención.*	90%
13,00	*Estudio de mercado, presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.*	75%
14,00	*Aprobaciones, permisos y viabilidades.*	75%

PROYECTO PATIO TALLER NORTE

Igual que el proyecto Patio Taller Sureste, este se divide en tres (3) procesos independientes: adquisición predial, consultoría para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones y un proceso relacionado con la construcción; Al respecto se presentó el siguiente avance:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Información General Contractual del Proyecto de Adquisición Predial Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte:

OBJETO:	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
VALOR:	$ 3.697.009.000
ESTADO:	Adquirido
OBSERVACIONES:	Se surtió el respectivo proceso de adquisición y ya se cuenta con el predio en propiedad del Ente Gestor.
	

Información General Contractual del Proyecto de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte:

OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
CONTRATISTA:	INGECAG S.A.S.
CONTRATO NO.:	118 de 2022
PLAZO:	4 meses.
FECHA DE INICIO:	1 / 9 / 2022
FECHA SUSPENSIÓN 01:	27 / 10 / 2022
FECHA REINICIO 01:	15 / 02 / 2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

FECHA SUSPENSIÓN 02:	17 / 04 / 2023
FECHA REINICIO 02:	Indefinido
FECHA FINALIZACIÓN:	Indefinido.
VALOR:	$ 404.213.250
ESTADO:	Vigente - Suspendido
OBSERVACIONES:	El alcance del proyecto contempla la elaboración de estudios y diseños para las dos edificaciones operacionales del sistema (Patio Taller y Estación Cabecera)

PROYECTO TERMINALES Y PARADEROS DE RUTA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPITA 2023
CONTRATO NO.:	067 de 2023
PLAZO:	6 meses.
FECHA DE INICIO:	07 / 06 / 2023
OTROSÍ 01:	04/05/2023 – Modificación forma de pago
PRORROGA 01:	24/11/2023 - 15 días
FECHA SUSPENSIÓN 01:	16/12/2023 – 45 días
FECHA FINALIZACIÓN:	04/02/2023
VALOR:	$ 4.020.961.463
ESTADO:	Vigente – Suspendido
OBSERVACIONES:	El alcance del proyecto contempla la construcción de 6 terminales de ruta e instalación de 573 paraderos para la implementación del sistema.

Mobiliario instalado en la Ciudad de Neiva al corte:

COMUNA	SENCILLO	TOTEM	M10-MUPPI	TOTAL
COMUNA 1	44			44
COMUNA 2	43			43

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMUNA 3	2			2
COMUNA 4	23			23
COMUNA 5	26			26
COMUNA 6	67			67
COMUNA 7	14			14
COMUNA 8	0			0
COMUNA 9	18			18
COMUNA 10	12			12
CAGUÁN				0
FORTALECILLAS	1			1
TOTAL	**250**	**0**	**0**	**250**









Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8.2.2 GESTIÓN DE OPERACIONES

8.2.2.1 OPERACIÓN Y RECAUDO

Situación Actual del Transporte Público Colectivo en la Ciudad de Neiva.

La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de Neiva, se ha desarrollado, un Plan de acción que permitirá abordar los temas técnicos, tecnológicos, legales y financieros, que se interrelacionan conjuntamente, con el propósito de lograr el objetivo misional y el cumplimiento de las metas definidas en el CONPES 3756 de 2013.

El siguiente informe corresponde a los avances desarrollados en el cuarto trimestre, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2023.

A. Aspectos Operacionales:

DEMANDA DE PASAJEROS

En el desarrollo de las reuniones con el gremio transportador, fue posible entregar por parte de estas, las estadísticas del número de pasajeros transportados con corte a diciembre de 2022.

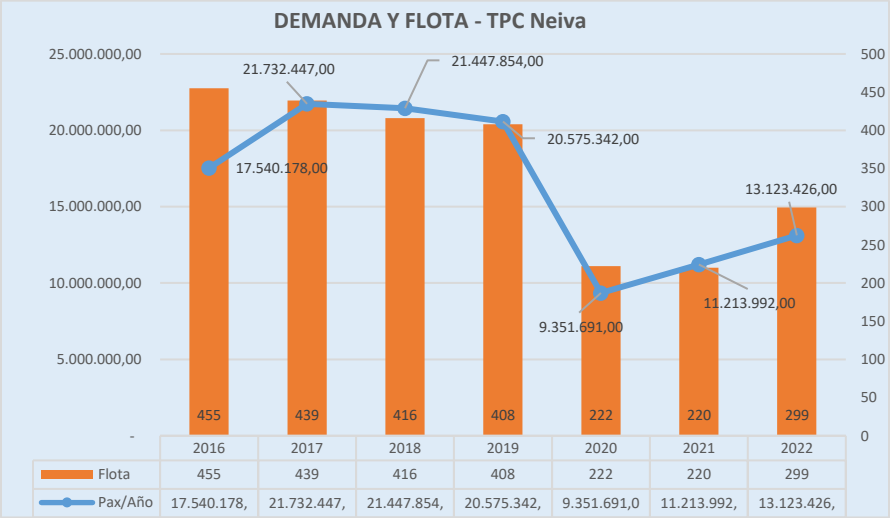

Como se puede observar en la gráfica, existe una recuperación del número de pasajeros transportados en el año 2022, con 13 millones de pasajeros transportados. Sin embargo y aunque existe una mejora en las condiciones de la demanda de los dos últimos años, no se ha llegado a transportar los pasajeros del año 2019. En su momento los pasajeros diarios se calculaban en 72.000 Pax/día frente a los casi 42.000 Pax/día que se transportan en el último semestre del año 2022.

En el desarrollo del proceso de seguimiento sobre las condiciones de demanda de pasajeros, estas se han mantenido invariables y en un rango entre los 38.000 y 40.000 Pax/día, lo cual supone una estabilización en el

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

número de pasajeros ascensos, el cual está sujeto a las condiciones de oferta que ofrece actualmente las empresas para el desarrollo operacional del sistema.

Cabe mencionar que la oferta global del TPC de la ciudad de Neiva se fija en 710 capacidades

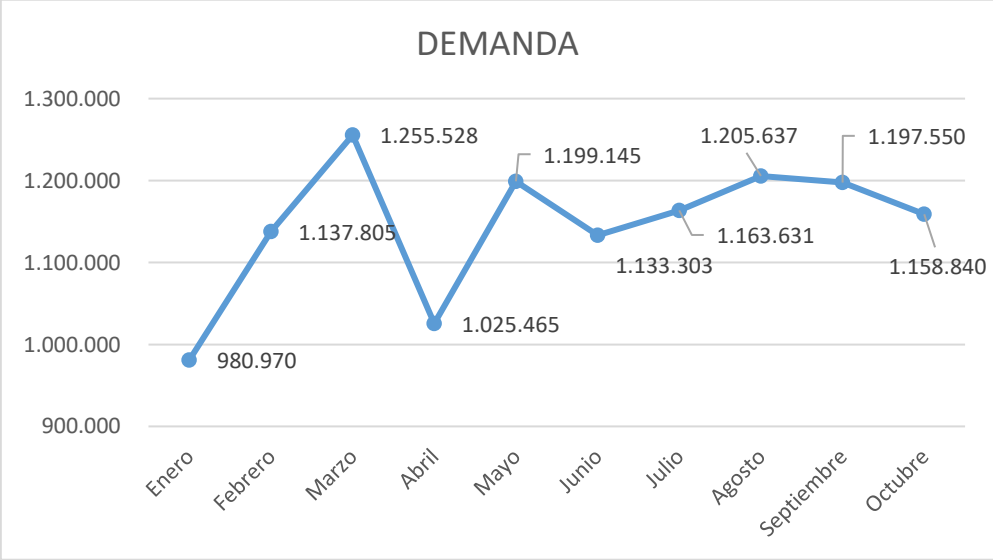

transportadoras, para el cierre del año 2022 según el reporte de SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA, el número de vehículos que circulan en la ciudad es de 304 vehículos y con vida útil remanente de 439 en total, como se menciona en el siguiente cuadro:

EMPRESA	TARJETA DE OPERACIÓN		TOTAL
	NO	SI	
AUTOBUSES	21	54	75
COOMOTOR	39	71	110
COOTRANSHUILA	10	69	79
COOTRANSNEIVA	18	24	42
FLOTA HUILA	47	73	120
TOTAL	135	304	439

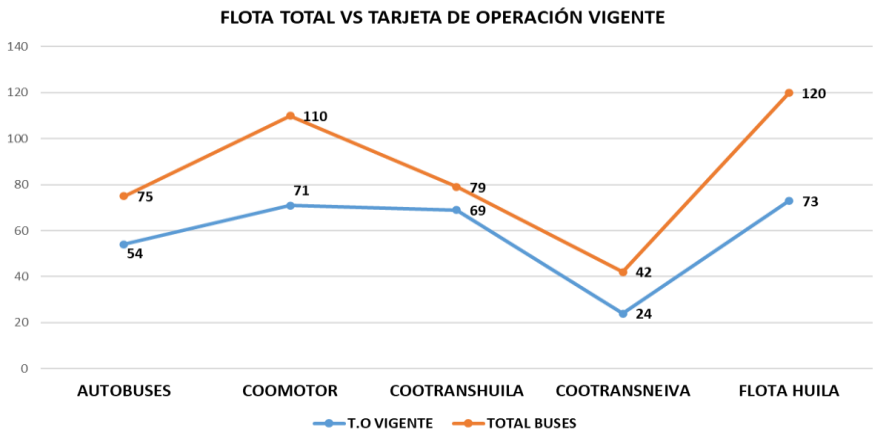

En este caso cuatro de las cinco empresas (a Excepción de FLOTA HUILA) están por debajo de la capacidad transportadora mínima. Con este dato en particular, no existen en este momento vehículos suficientes para cumplir el modelo operacional del sistema, el cual requiere de 320 vehículos para su operación.

De lo anterior y considerando el número de rutas atendidas en el municipio, existe vacancia de rutas del TPC, debido a la baja oferta que ofrecen las empresas para la prestación del servicio, lo cual repercute de manera negativa a los usuarios del transporte.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

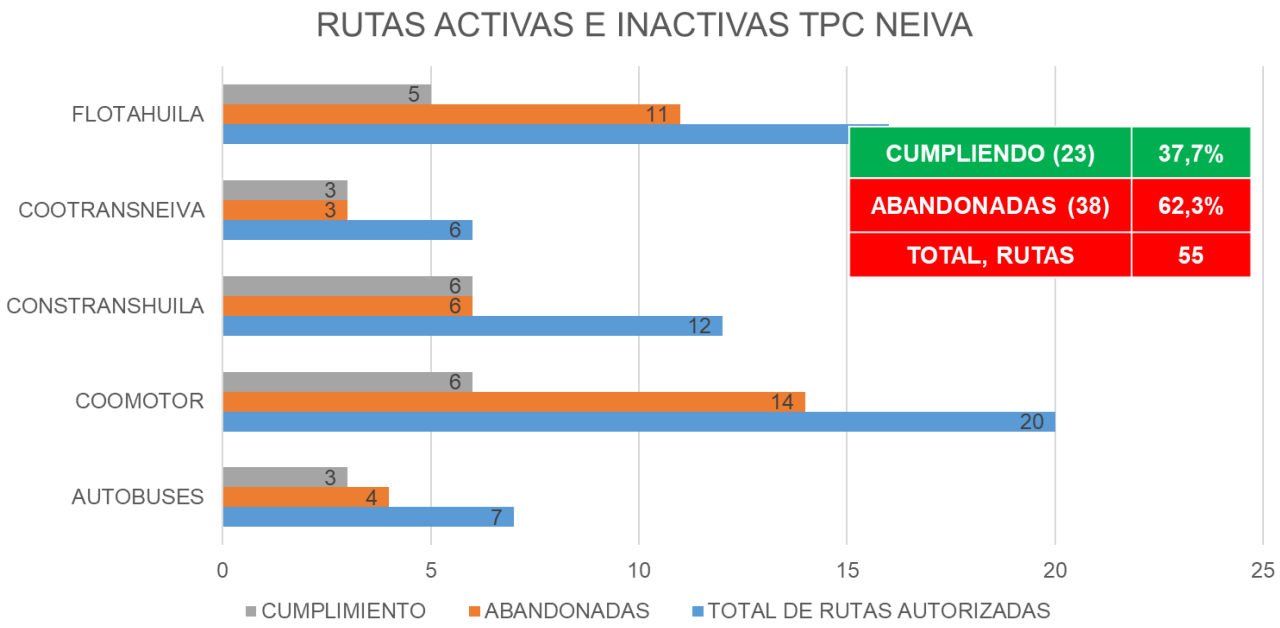

De la totalidad de rutas con permisos de operación vigentes solo el 37% de las rutas se cumplen y están en abandono el 62% de las mismas.

Transformación Empresarial y Operadores del Sistema.

En el desarrollo del proceso de transformación empresarial se han desarrollado 53 reuniones a lo largo del año 2022, en el cual se han abordado:

1. **Temas operaciones:** Relacionados a los ajustes de rutas, tiempos, frecuencias, y oferta requerida para la implementación de los servicios necesarios para dar inicio a los procesos de pre-operación del sistema.
2. **Temas Jurídicos:** Relacionados con la implementación y transición del TPC al SETP de la ciudad de Neiva en virtud del Decreto 1079 de 2015 y la normativa relacionada con la implementación del componente tecnológico del sistema.

OBJETO DE LA REUNION	OPERACIONAL	JURIDICA
SOCIALIZACION PERMISO DE OPERACIÓN COOMOTOR-SETP	X	
SOCIALIZACION PERMISO OPERACIÓN OPITA-SETP	X	
RETROALIMENTACION ERMISO DE OPERACIÓN OPITA-SETP	X	
RETOALIMENTACION PERMISO DE OPERACIÓN COOMOTOR-SETP	X	X
PRIMERA MESA TECNICA SETP- OPERADOR 1 ANALISIS RUTAS	X	
SEGUNDA MESA TECNICA SETP- OPERADOR 1 RUTAS AJUSTADAS	X	
PRIMERA MESA TECNICA SETP- OPERADOR 2 ANALISIS RUTAS	X	
CONSOLIDACION MODELO OPERACIONAL OPERADOR 2	X	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CONSOLIDACION MODELO OPERACIONAL OPERADOR 1	X	
SOCIALIZACION MODELO OPERACIONAL Y SU IMPLEMENTACION A TRAVES DEL PERMISO DE OPERACIÓN	X	X
CIERRE MODELO OPERACIONAL CRONOGRAMA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO PARA LAS HERRAMIENTAS LEGALES	X	X
SOCIALIZACION HERRAMIENTAS LEGALES PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SETP		X
FOCUS GROUP PROPIETARIOS TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO	X	X
AJUSTE Y SEGUIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PARADEROS Y RUTAS	X	
COMITÉ TECNICO OPERADOR 2 FLOTA HUILA, AUTOBUSES. SISTEMA DE RECAUDO CAPACIDAD TRANSPORTADORA	X	
COMITÉ TECNICO OPERADORES- INICIO PROCESO CONSULTORIA- ANEXO TECNOLOGICO.	X	
CRONOGRAMA DE IMPLEMEMTACION Y SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO.	X	X
SOCIALIZACION IMAGEN CORPORATIVA CON LOS OPERADORES DEL SISTEMA. MANUAL DEL USUARIO.	X	
DISEÑO OPERACIONAL: SISTEMA DE RECAUDO, SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA, PATIOS Y TALLERES.	X	
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO OPERADOR 2	X	
CONDICIONES DE PLANIFICACION DE LOS RUTEROS OPERADORES DEL SISTEMA	X	
LANZAMIENTO DE MARCA "MIGO" SOCIALIZACION EVENTO Y LOGISTICA.	X	

De las mesas de concertación desarrolladas fue posible decantar las condiciones de operación requeridas para el SETP, lo cual dio como resultado la conformación de dos (2) operadores para la implementación del sistema, Operador No 1 Conformado por las cooperativas COOMOTOR, COOTRANSHUILA, COOTRANSNEIVA, Operador No 2 - Conformados por las sociedades anónimas FLOTAHUILA – AUTOBUSES.

- **Consolidación y definición de Operadores del SETP de la ciudad de Neiva.**

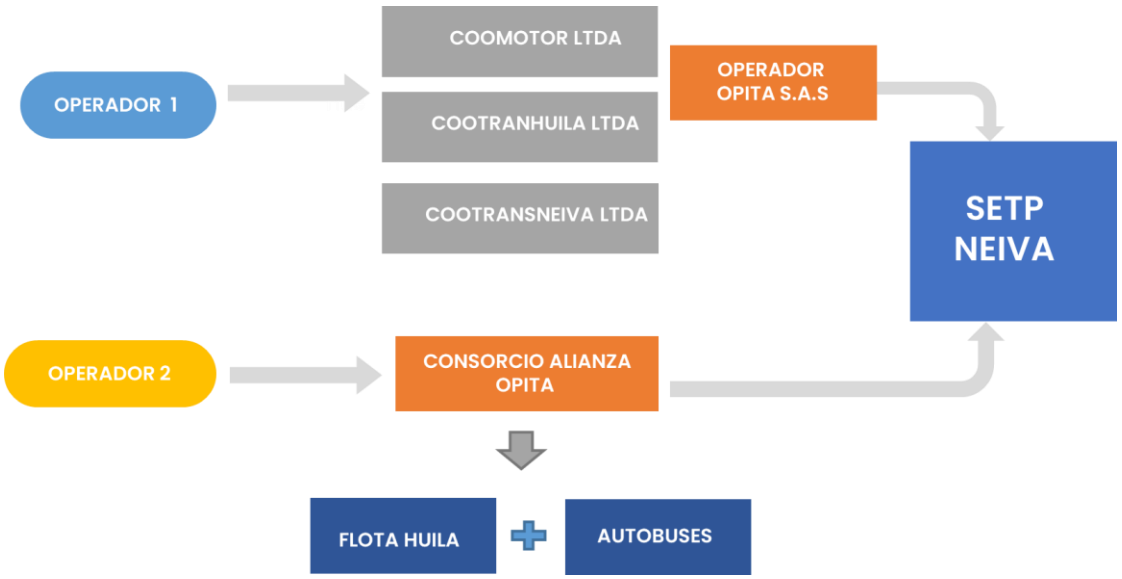

En el desarrollo y pasos requeridos para la implementación el día 31 de agosto de 2023, se expidió las resoluciones que otorgan los permisos de operación para dar inicio a los procesos de pre-operación y transición

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **OPERADOR No 1** – OPERADOR OPITA S.A.S, Reconocido a través de la resolución 050 de 2023.
- **OPERADOR N0 2** – CONSORCIO ALIZANZA OPITA, Reconocida a través de la resolución 051 de 2023

En las resoluciones se han definido:

a. Entrega de rutas a cada una de las empresas que componen los operadores
b. Definición de Horarios y frecuencias para la atención del servicio.
c. Inicio de la Pre-Operación del sistema entre el año 2023 – y 2024
d. Responsabilidades en la implementación y operación del SGCF y SRC
e. Responsabilidades del ente gestor y la secretaria de movilidad para la gestión de la Demanda de pasajeros.
f. Reasignación de nomenclatura para el nuevo esquema de rutas del sistema.

En el mismo sentido y considerando que las resoluciones pueden ser impugnadas vía RECUROS DE REPOSICION, el ente gestor ha efectuado el acompañamiento a la secretaria de movilidad de Neiva para dar respuesta a los mismos con el ánimo de efectuar aclaraciones y refutar o dar la razón a los requerimientos de las empresas y desarrollar las acciones que permitan efectuar los cambios en las resoluciones necesarias para llevar un proceso que responda a las condiciones de operación actual de los sistemas.

En este orden de ideas se expidió las resoluciones:

- **OPERADOR No 1** – OPERADOR OPITA S.A.S, a través de la resolución 071 del 17 de noviembre de 2023
- **OPERADOR N0 2** – CONSORCIO ALIZANZA OPITA, a través de la resolución 070 del 17 de noviembre de 2023

En las resoluciones se han definido:

a. Cambio en recorridos previa revisión del modelo operacional
b. Redefinición de las condiciones de horarios, frecuencias
c. Capacidad transportadora ajustada
d. Reformulación de fechas del cronograma para la entrada en operación.

De lo anterior y considerando que existe una expedición de permisos de operación y después de declarar en firme previa su notificación, se hace necesario consolidar temas que son muy importantes en el desarrollo del proceso a los cuales se requiere acciones relacionadas directamente con el seguimiento por parte del ente gestor, la participación del municipio de Neiva y los operadores del sistema, los cuales se relacionan en la siguiente gráfica:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

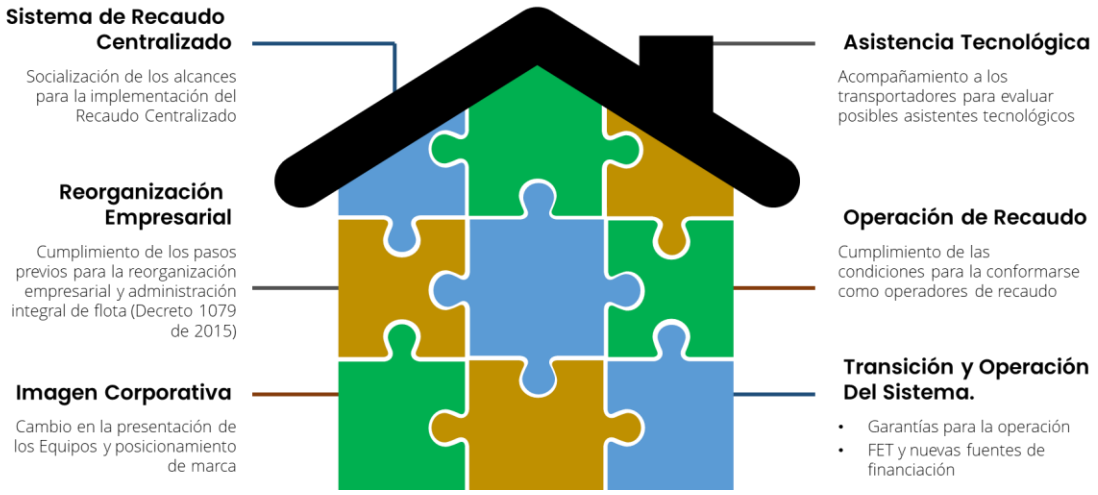

Su importancia radica de forma particular en el cumplimiento de los requerimientos para la operación formal del SETP previsto en el Decreto 1079 de 2015, para lo cual, y des el ente gestor, se han construido las herramientas legales, que, aunque son requerimientos que se hacen a los transportadores, se ha previsto su acompañamiento garantizando con ello el cumplimiento de los mismos facilitando el avance de los procesos de transformación empresarial.

- **Documento Consorcial:** Este documento y en mérito de lo expuesto por el Decreto 1079 de 2015, permite la operación conjunta de los servicios, la programación conjunta del esquema operacional y su cumplimiento frente a la implementación de los mantenimientos preventivos y correctivos y la administración de los patios y talleres,

- **Contratos de Admón. Integral de Flota:** Este contrato permite el negocio legal entre los propietarios de los vehículos y los operadores de los servicios de transporte, para la entrega del vehículo y un pacto que permita la remuneración de los mismos.

- **Conformación del ente recaudador:** Socialización d ellos requisitos necesarios para la implementación de un operador de recaudo que en este caso puede configurarse con los mismos operadores del sistema, buscando con ellos el control de los recursos generados por la venta de pasajes, considerando en ellos los requerimientos previstos en el Decreto 1564 de 2020 y la resolución del año 2020 que reglamenta el recaudo para los SETP

- **Asistente Tecnológico:** Considerado uno de los requisitos para la implementación del recaudo, se ha efectuado el acompañamiento a los operadores del sistema, en la búsqueda de un aliado tecnológico que permita el acompañamiento en el momento del suministro, instalación, puesta en marcha y su operación del SETP en la ciudad de Neiva previsto para el último trimestre de 2024.

En el desarrollo de estas mesas de trabajo se ha tocado otros temas como son:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Ente Recaudador

Como parte de las mesas de trabajo desarrolladas a lo largo del año 2023, y en especial para el último trimestre de 2023, se consolido las empresas de recaudo SOCIEDAD OPITA S.A. la cual está conformada por las cinco empresas que hace parte del esquema operacional del SETP. La empresa explora la mejor alternativa para seleccionar a su asistente tecnológico el cual está en preselección con las siguientes empresas: NEBULA, DASHFLEET, EKTEC



Imagen Corporativa

Se ha previsto un cambio en las condiciones de imagen corporativa e institucional para la implementación del SETP, el cual incluye la inclusión de la marca MIGO, la selección de colores y demás elementos del esquema corporativo para el cambio de imagen para el desarrollo de los procesos de implementación del sistema.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Imagen de rodantes y ruteros





Imagen Indumentaria



Conductor



Taquillera



Operador

Señalética Interna



Personas con discapacidad | Sillas preferenciales | Extintor | Quebrar en caso de emergencia | Pet Friendly



Prohibido fumar | Salida en caso de emergencia | Prohibido botar basura | Prohibido comer | Zona WIFI

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Imagen para la pre-operación del SETP





AJUSTE ANEXO TECNOLOGICO.
COMPONENTE DE TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Como parte del desarrollo del proceso de consultoría que tiene como objeto el ajuste del anexo tecnológico y sus especificaciones técnicas, se ha desarrollado un proceso de consultoría que permita su ajuste a las condiciones previstas por los decretos que regulan la materia entre ellos el Decreto 1064 de 2020 y la resolución 20203040034065 de 2020.
El proceso se adjudicó al proponente A4 ASOCIADOS S.A.S, con la siguiente información contractual

CLASE DE CONTRATO:	**CONSULTORÍA**
CONTRATO No.	**CPS – 080 . 2023**
CONTRATISTA:	**A4 ASOCIADOS SAS.**
OBJETO:	***REALIZAR EL AJUSTE DEL ANEXO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA NACIONAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBUCO DE NEIVA".***
VALOR:	**($ 355.412.417) M/CTE. INCLUIDO IVA**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres (3) Meses
FECHA CONTRATO:	03 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	16 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de noviembre de 2023
AVANCE FISICO (%)	100%

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

El alcance del proceso:



En el desarrollo seguimiento del proceso de consultoría y previa a la resolución de observaciones efectuadas por parte de los transportadores y en entes gestor presento el ajuste final del documento a la UMUS, el día 29 de noviembre de 2023, con lo cual da por terminado el proceso de consultoría con las siguientes conclusiones:

ITEM	DISEÑO FINAL
TIPO DE SISTEMA:	Sistema Abierto tipo ABT, Pagos abiertos
TRANFERENCIA Y DATOS:	Solución en NUBE, parámetros WBSERVICE – GPRS 4G
TIPO DE PAGOS ACEPTADOS	- NFC - QR - Tarjetas sin Contacto - Pagos EMV - Efectivo Validado Electrónicamente
PREPARACION VALIDADORES	Del Nivel 1 al 4 Certificados al Nivel 3, para pagos EMV con banco adquiriente
EQUIPOS EMBARCADOS	- Validadores de tarjetas y medio de pago - Cámaras de conteo de trafico - Consolas de validación y asignación de conductores SGCF - Cámaras de vigilancia - Botón de pánico - Paneles PIP – SIU

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	- WiFi Abordo - Censores de apertura de puesta
CENTRO DE CONTROL	Un (1) centro para el Ente gestor o Municipio Dos (2) centros de control uno por operador de servicios
OTROS ELEMENTOS	1. Diseño WEB para seguimiento 2. Diseño APP para usuario 3. Predictor de viajes 4. Módulos de recarga de tarjetas 5. Tarjetas Desfire EV2 – 50.000 en total 6. Software de Control de flota 7. Software de SRC
ESQUEMA RECAUDO	- Diseño mapping del sistema entregado a la ciudad - Diseño módulos SAM - Diseño y apertura de llaves granjas SAM
VALOR TOTAL DE LA SOLUCION	- **$ 15.703.071.951 incluye IVA**

AJUSTE A LA ESTRUCTURACION OPERACIONAL Y FINANCIERA PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA.

En el desarrollo del proceso de implementación del SETP, en el año 2018 se desarrolló la ESTRUCTURACION TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE, la cual definió las condiciones de implementación y operación de los componentes operacionales, de acuerdo con las condiciones de oferta de parque automotor y demanda de pasajeros para el técnico de los servicios de transporte público en la ciudad.

Considerando que los efectos de la pandemia, que tuvieron efectos sobre la operación, sostenibilidad y eficiencia en la prestación del servicio, es necesario evaluar las condiciones de operación de sistema en POST – Pandemia para lo cual es necesario efectuar el ajuste al componente operación y financiero, ya que ello permite cerrar el modelo financiero que evalúa las condiciones de la tarifa técnica de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4350 de 1998.

Algunas de las condiciones a actualizar frente a lo previsto en el ETLF, son las siguientes:

Diseño Operacional	Condiciones Actuales
• Rutas diseñadas: 19 (17 Rutas / 2 Alimentadoras)	• Replantear las condiciones del Modelo y el esquema de alimentación.
• Modelo con cierre de demanda 80.000 y 90.000 pax/dia (2018)	• Actualmente se transportan 40.000 pax/día
• Flota requerida: 320 Buses	• Hoy solo están en funcionamiento 304 (T.O:V)
• Cubrimiento estimado: 90 – 100%	• Cubrimiento Hoy: 75%
• 1 o 3 Operadores para la operación del Sistema	• Dos (2) Operadores para la operación del Sistema
• Dos tipologías Vehiculares adoptadas	• Dos tipologías Vehiculares adoptadas
• Se define estaciones cabecera para atender a rutas alimentadoras (Caguán – Fortalecillas)	• Reeplantear las condiciones de las estaciones cabecera para atender a rutas alimentadoras (Caguán – Fortalecillas)

Después de efectuar el proceso de concurso de méritos se ha efectuado la selección de dos firmas que cumplen con las condiciones contractuales y financieras del proceso de selección. Firmas de reconocida trayectoria que permiten darle fiabilidad a las condiciones de implementación de los estudios para su ajuste.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

De las consultorías se busca:

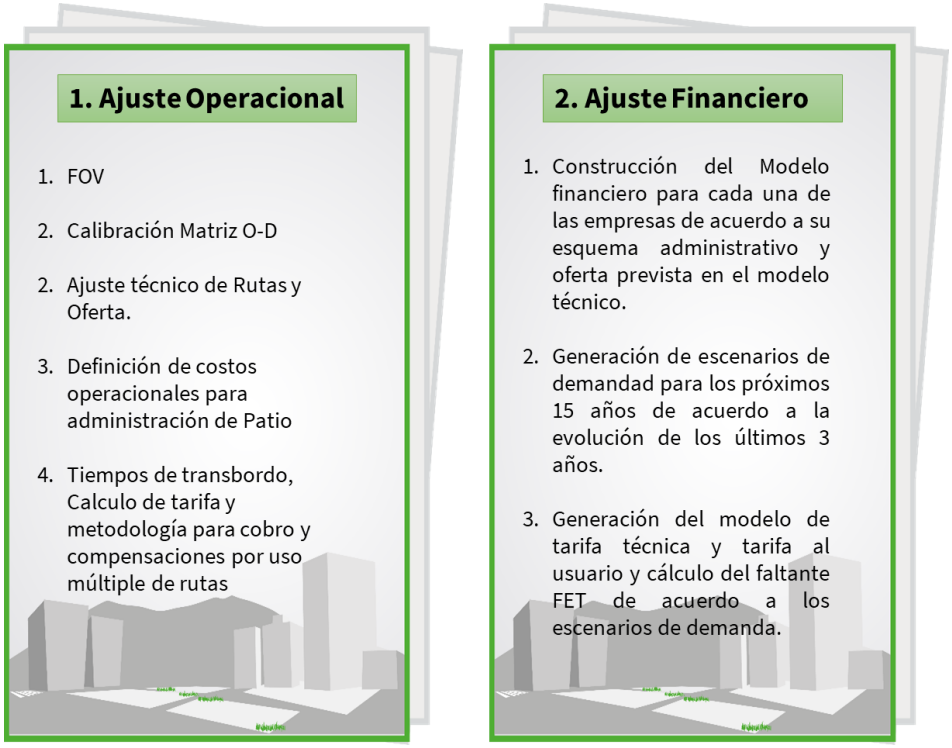

Información Contractual de los procesos de Consultoría

Ajuste Diseño Operacional - SETP Neiva

CLASE DE CONTRATO:	**CONSULTORÍA**
CONTRATO No.	**CPS – 132. 2023**
CONTRATISTA:	**SISTEMA ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFIACION – SAIP S.A.S**
OBJETO:	REALIZACION DEL AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL MODELO TECNICO OPERACIÓN DE DETALLE PARA LA IMEPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
VALOR:	**($ 179.263.000) M/CTE. INCLUIDO IVA**
LAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) Meses
FECHA CONTRATO:	16 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de octubre de 2023 de 2023
AVANCE FISICO (%)	Producto No 1 – Plan de Trabajo – 10%

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Ajuste Diseño Financiero - SETP Neiva

CLASE DE CONTRATO:	**CONSULTORÍA**
CONTRATO No.	**CPS – 128. 2023**
CONTRATISTA:	**IKOPN BANCA DE INVERSION S.A.S**
OBJETO:	***REALIZAR EL AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL MOELO FINANCIERO Y SUS ESCENARIOS PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA".***
VALOR:	**($ 179.144.000) M/CTE. INCLUIDO IVA**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) Meses
FECHA CONTRATO:	26 de octubre de 2023
FECHA DE INICIO:	16 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de octubre de 2023
AVANCE FISICO (%)	Producto No 1 – Plan de Trabajo – 10%

7.2.2.2 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL

PROCESO DE TERMINALES DE RUTAS Y PARADEROS

- **Información General del Proyecto**

El alcance del presente contrato es ejecutar dentro del proyecto de adecuación de la infraestructura del espacio público existente de la ciudad de Neiva con la fabricación de mobiliario de paraderos tipo M10, MUPI, Tótem y paraderos tipo bandera para la implementación del sistema estratégico de Transporte Publico de la ciudad.

- ✓ Fabricación de 500 paraderos tipo bandera
- ✓ El cual consiste en la fabricación de: 60 mobiliarios paradero Tipo M10 según especificación IDU con su respectivo MUPI y porta mapa.
- ✓ 19 paraderos tipo Tótem según especificación IDU

- **Descripción Paradero Tipo Bandera**

EL Paradero tipo Bandera según especificación Contractual incluye una base en lámina H.R DE 250 X 250 x 6 mm, estructura de soporte en tubo vertical Redondo estructural GR45 de 72mm, marcos en tubería estructural de 76x38x1.9 mm acabado en Galvanizado en caliente, bandejas de información de 1,275x0,5 m y 0.45 x 0.30 m en lámina galvanizada calibre 16 (1.45 mm) acabado en pintura electrostática RAL gris ceniza TXT poliéster, sujeción a estructura principal mediante tornillo de 50 mm en acero inox antivandálico, tornillo y tuerce tipo remache de 5 mm para soporte de señaléticas.

- **Descripción Paradero Tipo M10 y MUPPI**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

EL Paradero tipo M10, MUPPI Y PORTAMAPAS según especificación Contractual incluye Columna + soporte cubierta en lámina de acero Inoxidable SAE304 cal 16, Silla en acero inoxidable SAE304 soporte y espaldar en tubería en acero inoxidable la cubierta en 5 módulos de policarbonato, el MUPPI incluye una base en Acero inoxidable, estructura perimetral en acero inoxidable, puertas publicitarias en acero inoxidable con vidrio templado fijado con silicona , con 6 cm de borde serigrafiado de color negro e Instalación eléctrica, el PORTAMAPAS incluye una estructura perimetral en acero inoxidable omegas internas en acero inoxidable.

- **Proceso de Fabricación Tipo Bandera**
  El proceso de fabricación consiste en:

1. Obtención de los diferentes materiales de acuerdo a lo especificado y manteniendo los estándares de calidad con acero de acuerdo a normativa NTC4526 GR B.
2. Corte de material de acuerdo a los planos taller.
3. Armado de la estructura de soporte con la tubería AN de 76 mm y tubería estructural de 760x380x1.9mm con soldadura tipo MIG/MAG.
4. Cortes y dobleces de la lámina galvanizada para darle forma a las bandejas publicitarias, esas láminas están fabricadas con el sello de Corpacero garantizando su calidad.
5. Proceso de la estructura interior con galvanizado en caliente de acuerdo a las especificaciones contractuales. a su vez el proceso de pintura de las bandejas garantizando un grosor de 90 micras.
6. Sistema de fijación con remaches y tornillos, limpieza y protección de banderas para su posterior transporte a la ciudad de Neiva





- **Proceso de Fabricación Tipo M10 y MUPPI**
  El proceso de fabricación consiste en:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

a. Obtención de los diferentes materiales de acuerdo a lo especificado y manteniendo los estándares de calidad con acero de acuerdo a normativa vigente.
b. Corte de material de acuerdo a los planos taller se cortó en laser.
c. Dobleces de la lámina acero inoxidable para darle forma a las piezas que conforma el paradero, muppi y porta mapas.
d. Soldadura TIG de los elementos que conforma el paradero, muppi y porta-mapas de acuerdo a los planos taller.
e. Armado de las diferentes piezas que conforman el paradero M10 como silla, columna-viga, cubierta, porta mapas y canales.
f. Instalación eléctrica del muppi publicitario con bombillas led y sistema fotosensible.
g. Sistema de fijación tornillos tejas y chazos para bases limpieza y protección de las diferentes piezas para su posterior transporte a la ciudad de Neiva.

- **Avances de Fabricación:**
  1. **Tipo Bandera: 500 Fabricadas – 400 Instaladas = 100 Proceso de instalación**
  2. **Tipo M10 y Muppi: 60 Fabricada-32 Instaladas = 28 Proceso de Instalación**

En dicho proceso, se han efectuado comités técnicos con el fin de determinar realizar visitas a los diferentes terminales de rutas, analizar las características técnicas del sistema de Paraderos.

- **Terminales de Rutas**
  Está en proceso de construcción los terminales rutas: IV centenario y Tesoro: Fundición en concreto MR-41 para vía de acceso de buses donde descienden y hacienden los usuarios del transporte público

TR OASIS Cra 35ª y Cra 36 con Cll 24 Sur	**TR 4TO CENTENARIO** Cra 39 con Cll 31B Esquina
TR EL TESORO Cll 25ª con Cra 26	**TR RESERVA DE LA SIERRA** Cra 52 con Cll 11



Terminal El Tesoro



Terminal IV Centenario

- **Sistema de Paraderos**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Se realizó depuración al Sistema de Paraderos con el fin de determinar la ubicación exacta teniendo en cuenta la georreferenciación, tipo de paradero, nombre y comuna, para poder implementar los paraderos de la siguiente manera:

PARADEROS					
COMUNA	**SENCILLO**	**TOTEM**	**M10**	**MUPPI**	**TOTAL**
COMUNA 1	50	2	6	6	64
COMUNA 2	47	1	4	4	56
COMUNA 3	20	2	10	10	42
COMUNA 4	46	8	23	23	100
COMUNA 5	47	1	1	1	50
COMUNA 6	101	0	6	6	113
COMUNA 7	29	3	3	3	38
COMUNA 8	40	0	0	0	40
COMUNA 9	41	0	0	0	41
COMUNA 10	31	2	1	1	35
CAGUAN	23	0	0	0	23
FORTALECILLAS	25	0	0	0	25
TOTAL	**500**	**19**	**54**	**54**	**573**

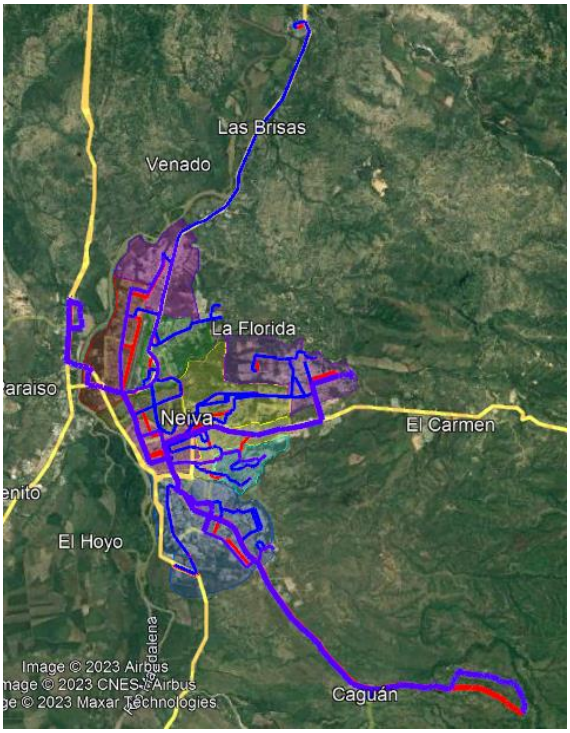

FASE I
194 PARADEROS
140 Sencillos
40 Sencillos – M10
14 Totem

FASE II
208 PARADEROS
196 Sencillos
9 Sencillos – M10
3 Totem

FASE III
117 PARADEROS
110 Sencillos
5 Sencillos – M10
2 Totem

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 067 DE 2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No.	**067 DE 2023**
ENTIDAD CONTRATANTE:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OPITA 2023** **NIT:** 901.706.012-8 **REPRESENTANTE LEGAL (S):** CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON **C.C.:** 7.160.783 de Tunja (Boyacá) **DIRECCIÓN:** Cr 27# 46-60 **TELÉFONO:** 6053117029 **CORREO:** consorcio.opita2023@gmail.com **CIUDAD:** Bogotá
OBJETO:	"***CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA."***
VALOR:	**CUATRO MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES UN PESOS ($ 4.020.961.463) M/CTE. INCLUIDO IVA**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**SEIS (6) MESES,** contados a partir del acta de inicio del contrato.
FECHA CONTRATO:	04 DE MAYO DE 2023.
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2023
OTROSI No 1	ACLARACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO RELATIVA EL VALOR Y FORMA DE PAGO.
OTROSI No 2	MODIFICATORIO CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO ADICIONAL AL PLAZO DE EJECUCION
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	**SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN:	**VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023**
AVANCE FISICO (%)	OCHENTA Y SEIS PORCIENTO (86%)
AVANCE FINANCIERO (%)	SETENTA Y UNO PORCIENTO (71%)
ACTA PARCIAL No.1	MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1.093.180.092) MCTE. INCLUIDO IVA, del 24-08-2023
ACTA PARCIAL No.2	MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.759.254.880) MCTE. INCLUIDO IVA, del 30-09-2023
No DE ACTAS POR RADICAR	DOS (2)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 068 DE 2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No.	**068 DE 2023**
ENTIDAD CONTRATANTE:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL VGM** **NIT.** 901.707.097-8 **REPRESENTANTE LEGAL:** VÍCTOR GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ **C.C.** 19.266.128 de Bogotá D.C. **DIRECCION:** CR 7 No. 16 A – 29 P 2 BRR QUIRINIAL **TELEFONO:** 8744488- 3208360025 **CORREO:** victorgrr1@gmail.com **CIUDAD:** Neiva-Huila
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "***CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA."***
VALOR:	**DOSCIENTOS TREINTA UN MILLONES CUTROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 231.479.633) M/CTE. INCLUIDO IVA**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**SEIS (6) MESES,** contados a partir del acta de inicio del contrato.
FECHA CONTRATO:	04 DE MAYO DE 2023.
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2023
OTROSI No 1	ACLARACION EN TORNO AL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL ENTE PLURAL.
OTROSI No 2	MODIFICATORIO CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO ADICIONAL AL PLAZO DE EJECUCION
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	**SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN:	**VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023**
AVANCE FISICO (%)	OCHENTA Y SEIS PORCIENTO (86%)
AVANCE FINANCIERO (%)	SETENTA Y UNO PORCIENTO (71%)
ACTA PARCIAL No.1	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 62.916.164) MCTE. INCLUIDO IVA, del 24-08-2023
ACTA PARCIAL No.2	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 101.277.188) MCTE. INCLUIDO IVA, del 30-09-2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No DE ACTAS POR RADICAR	DOS (2)

AVANCE FINANCIERO

ACTA DE ENTREGA	FECHA	TIPO BANDERA	M10	TOTEM	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE
1	24/08/2023	250		0	$ 1.093.180.092	$ 1.093.180.092	27%	27%	$ 1.093.180.092	27%	86%
2	30/09/2023	250	30	0	$ 1.759.254.880	$ 2.852.434.972	44%	71%	$ 2.852.434.972	71%	
	VALOR POR EJECUTAR							$ 1.168.526.491			

8.2.3 GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL

8.2.3.1 PROCESO DE GESTIÓN DE COMPONENTE SOCIO PREDIAL CUARTO TRIMESTE 2023

El siguiente informe corresponde a las actividades desarrolladas por el Área Social y Gestión Predial adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; relacionado con los avances del componente social y predial a corte 31 de diciembre de 2023 referenciando la articulación y avances con las diferentes áreas de la entidad.

Desde el componente predial podemos destacar los siguientes avances durante el tercer trimestre de 2023:

PATIO TALLER NORTE:
Se coordinó con la Dirección de Gestión Catastral la expedición de la Resolución No. 1432 de 2023. Por la cual se inscribe en el catastro del Municipio la Mutación de segunda clase (Desenglobe) del predio identificado con FMI 200-292790 con FMI 200-42761 y cédula catastral No. 010900000001000100000000, como requisito indispensable para el proceso de licenciamiento del patio taller norte.

Solicitud ante Dirección de Rentas del Municipio de Neiva para la exclusión del pago del impuesto de delineación urbana para el predio denominado “LT PATIO TALLER NORTE”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 200-292790, cédula catastral No. 00110010090001000020000000000-900028748 y Número predial Nacional 410010109000000010002000000000.

Se articuló con la Dirección de Ordenamiento Territorial el asesoramiento jurídico en la expedición del Decreto donde se incorpore el “Estudio de Amenaza por inundación del lote Pacolandia (Patio Taller SEPT) adyacente a la quebrada el venado en el Municipio de Neiva – Huila”.

PATIO TALLER ESTE

Se brindó acompañamiento jurídico en la prórroga del plazo de ejecución del contrato no. 1365 de 2020 – Comodato Patio taller este.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Obtención de las pólizas correspondientes según prórroga del plazo de ejecución del contrato no. 1365 de 2020 – Comodato Patio taller este.

Apoyo jurídico en la solicitud y expedición de la "licencia de intervención y ocupación de espacio público para la intervención del predio denominado lote zona comunal número uno etapa III ubicado en la carrera 36 a no. 28 – 131 del municipio de Neiva", necesaria para la ejecución del proyecto patio taller este.

PATIO TALLER SUR

Se adelantaron diversas reuniones dentro del proceso de las acciones tendientes a la obtención de licencias y permisos y la posterior construcción patio taller sur.

En ese sentido se han adelantado reuniones de trabajo con la Dirección de Ordenamiento Territorial y la curaduría urbana segunda del Municipio de Neiva. Así pues, se está definiendo técnica y jurídicamente la entrega de áreas de cesión derivadas del trámite de expedición de permisos y licencias del proyecto patio taller sur.

8.2.3.2 PROYECTOS Y PROGRAMAS

Patio Taller Este y Terminales de Ruta y Paraderos

Desde el componente social durante el 2023 se trabajó de forma conjunta con los equipos de contratistas e interventoría de los proyectos que se desarrollaron, como fueron los proyectos:

- **CONTRATO DE OBRA NO. 067 DE 2023** *"Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de terminales de ruta y paraderos en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva"* y el **CONTRATO DE OBRA No. 011 de 2021** *"Realizar estudios técnicos, diseño, construcción de patio taller este- sector tesoro en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva ".*

En cada uno de ellos, el ente gestor desde el área social se encargó de la elaboración de los Planes de gestión social inmersos en el Plan de manejo Ambiental de las obras, los cuales deben ser ejecutados por los contratistas de obra del área social e interventoría, durante el 2023 el área social del SETP apoyo el seguimiento de cada uno de los programas del PGS que se deben desarrollar en cada una de las obras; los componentes que se desarrollan en los planes de gestión social son:

B1	Divulgación e Información a la comunidad
B2	Restitución de bienes afectados
B3	Atención y participación ciudadana
B4	Pedagogía para la sostenibilidad del proyecto
B5	Vinculación de mano de obra local e influjo laboral
B6	Equidad para las mujeres y de género

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Cada uno de los programas tienen actividades específicas para desarrollar todas enfocadas a la atención, el manejo adecuado y la mitigación de los impactos socioeconómicos causados a las personas y comunidades con ocasión del desarrollo de las obras; el SETP desde el área social cumple la función de apoyar en las salvaguardas a la comunidad y ofrecer la información a la población residente y usuaria de la zona de influencia directa e indirecta de las obras.

- La conformación y reunión de las veedurías ciudadanas, los puntos de atención al ciudadano con su respectivo equipamiento, el levantamiento y cierre de actas de vecindad, la asistencia social y las capacitaciones a los trabajadores y la comunidad hace que el trabajo en obra sea armonico entre los contratistas, la interventoria, el ente gestor y la comunidad.





Conformación de Veedurias

La Confromacion y reunión con las veedurias son herramientas de comunicación directa con la comunidad. Se realiza la conformación de las veedurías con la comunidad y sociales del contratista e interventoría de cada uno de los proyectos, las actas de conformación realizadas se radican en la Personería Municipal de Neiva.


Reunión con Veeduría Terminal de Ruta IV Centenario.


Reunión con Veeduría paraderos

Las reuniones de inicio de obra en cada uno de los proyectos son de carácter obligatorio antes del inicio de cualquier obra que se desarrolle desde el ente gestor. Se realiza presentación de los funcionarios del SETP, la Interventoría y el Consorcio, se informa las generalidades del proyecto, especificaciones técnicas, etapas de la obra, beneficios e impactos para la población, se lleva a cabo explicación del Plan de manejo ambiental (Componente Ambiental, SST y Social) y recomendaciones a tener en cuenta en el inicio de la obra.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co





Reunión de Inicio de Obra Patio Taller Este.

LANZAMIENTO DE MARCA

El día 24 de octubre de 2023, se brindó apoyo en el evento denominado "Presentación de la marca de este gran proyecto para la capital del Huila y la presentación oficial de sus operadores", el cual se desarrolló en el salón principal del Centro Empresarial Huila E de la cámara de comercio de la ciudad de Neiva el cual contó con una capacidad para más de mínimo 500 personas incluido servicio gratuito de parqueadero con capacidad de 30 estacionamientos. Evento que se llevó a cabo durante las horas de la mañana con la participación de 500 personas e invitados especiales, entre los que estuvieron los presidentes de junta de acción comunal de las 10 comunas de la ciudad, Ediles, secretarios de despacho, operadores del sistema se transporte público colectivo de la ciudad que iniciaron la pre operación del sistema; importante destacar que previo al evento se llevaron a las instalaciones del centro empresarial los vinilos de la marca MIGO a los 320 buses.
A continuación, se presenta Registro fotográfico de las principales actividades Lanzamiento de marca, presentación de operadores, presentación del personaje de la marca MIGO y los modelos de ruteros entregados a los operadores.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Lanzamiento De Marca, Presentación De Operadores Y Posicionamiento De Marca.

STAND DE EXHIBICIÓN EN FERIA Y/O EXPOSICIÓN EXPO-HUILA 2023.

Durante los días del 2 al 5 de noviembre de 2023, se brindó apoyo en el evento denominado Expo Huila 2023, la gran Feria multisectorial, desarrollada en el Centro Empresarial Huila E de la Cámara de Comercio de la ciudad de Neiva, el cual contó con un STAND del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de continuar con el proceso de posicionamiento de la marca MIGO (Movilidad Inteligente de Gestión Opita), evento que permitió un alto flujo de asistentes y se dieron a conocer información sobre el proyecto y los avances en la implementación del sistema estratégico de transporte en la ciudad de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co







Evento ExpoHuila 2023 – Stand Tranfederal SAS MIGO

8.2.3.3 COMUNIDADES

Estrategia

Con la articulación y en equipo, se diseñó y ejecutó la estrategias y Concurso "***MUÉVETE CON MIGO"*** en conjunto con el área social de la Secretaria de Movilidad y el SETP cuyo objetivo general fue el siguiente:

Objetivo General: Incentivar una movilidad segura y sostenible en el municipio de Neiva, mediante la estrategia "Muévete Con Migo", dirigida al talento humano de las empresas de Neiva.

Objetivos específicos:

- Incrementar el número de viajes en transporte público colectivo en la ciudad de Neiva, durante los meses de noviembre y diciembre del 2023.
- Incentivar el uso de la bicicleta, mitigando el impacto que produce el tránsito automotor: "Ley 1811 del 2016".

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Motivar a las empresas para que adopten modos de transporte alternativos sostenibles que permitan contribuir a la salud de sus colaboradores y a la protección del medio ambiente.

Beneficios del transporte público:

- ✓ Tendrás un aire más puro.
- ✓ Ganarás más tiempo para ti.
- ✓ Existirá menor probabilidad de sufrir un siniestro vial.
- ✓ Contribuirás a la armonía y silencio de la ciudad.
- ✓ Apoyarás al transporte legal, que genera empleo formal en Neiva: en nuestro municipio solo el 34% de la población está siendo usuario del transporte público.
- ✓ Contribuirás a una movilidad sostenible.

Evidencias de participación: El líder o equipo encargado de la empresa a participar escogerá un día a la semana para desarrollar la actividad del concurso, les pedirá a los miembros de su empresa la publicación de una fotografía en la bicicleta, dentro del vehículo de transporte público en redes sociales con el hashtag #MuéveteConMigo y #MuéveteEnBici, la cual deberá enviar al líder del equipo, dependiendo del transporte de selección.

Resultados obtenidos en el concurso de MUEVETE CON MIGO.

De las 56 empresas participantes, 9 quedaron seleccionadas con la participacion del talento humano, finalmente las empresas ganadoras en las diferentes categorías de esta primera edición de "Muévete Con Migo" fueron:

Categoría 1: Ideas Publicidad





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Registro fotografico ganador categoria 1: Ideas publicidad

Categoría 2: Terminal de Transporte







Registro fotografico ganador categoria 2 Terminal de Transporte de Neiva

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Categoría 3: ESE Carmen Emilia Ospina







Registro fotografico ganador categoria 3 ESE Carmen Emilia Ospina

Estas empresas fueron premiadas con el kit **" Ruta movilidad segura".**

Es de resaltar que este espacio con las empresas participantes se aprovehcaron para brindar información sobre lo que es el proyecto SETP – MIGO, en la etapa en la que se encuetntra, su funcionalidad y porque es importante en la ciudad.

Es importante resaltar que durante el 2023 se trabajó de forma constante en la comunicación a la comunidad desde el area social y comunicaciones a través de diferentes medios de comunicación y desarrollando actividades de difusion sobre la forma de inicio de la transición, información sobre las empresas que operarán el sistema, pedagogia sobre el uso y funcionalidad de paraderos y terminales.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8.3 PROCESO DE APOYO

8.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, con corte a diciembre 31 del 2023, el cual fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión No. 046 del 26 de diciembre del 2022 y mediante Acta del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) No. 076 del 27 de diciembre del 2022.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	POR INGRESAR	% EJEC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	**64.444.317**	**200.001**	**1.774**	**64.642.543**	**21.673.821**	**42.768.723**	**33.5%**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**15.676.631**	**1**	**1.774**	**15.674.858**	**15.674.858**	**0**	**100.0%**
FUNCIONAMIENTO	**304.189**	**0**	**0**	**302.414**	**302.414**	**0**	**100.0%**
Funcionamiento	304.189	0	1.774	302.414	302.414	0	100.0%
INVERSIÓN	**15.372.442**	**1**	**0**	**15.372.443**	**15.372.443**	**0**	**100.0%**
Municipio	3.355.278	0	0	3.355.278	3.355.278	0	100.0%
Nación	11.971.519	0	0	11.971.519	11.971.519	0	100.0%
Otros Aportes Ente Gestor Redes	45.563	0	0	45.563	45.563	0	100.0%
Otros Aportes Ente Gestor Multas	82	1	0	83	83	0	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	**48.767.386**	**200.000**	**0**	**48.967.386**	**5.998.955**	**42.768.430**	**12.3%**
APORTE ENTE TERRITORIAL	**5.800.000**	**0**	**0**	**5.800.000**	**2.800.000**	**3.000.000**	**48.3%**
Municipio Vigencias Anteriores	5.800.000	0	0	5.800.000	2.800.000	3.000.000	48.3%
APORTES NACIÓN	**41.967.386**	**0**	**0**	**41.967.386**	**2.198.955**	**39.768.430**	**5.2%**
Aportes Nación vigencia actual	39.768.430	0	0	39.768.430	-	39.768.430	0.0%
Aportes Nación vigencia anterior	2.198.955	0	0	2.198.955	2.198.955	0	100.0%
OTROS APORTES	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.000.000**	**200.000**	**83.3%**
Recursos Funcionamiento	800.000	0	0	800.000	800.000	0	100.0%
Aportes Adicionales del Municipio	200.000	200.000	0	400.000	200.000	200.000	50.0%
RECURSOS DE CAPITAL	**300**	**0**	**0**	**300**	**8**	**292**	**2.5%**
Otros Recursos de Capital	300	0	0	300	8	292	2.5%

Diciembre 2023

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS		PRESUP FINAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJEC.
				Crédito	ConCréd				
PRESUPUESTO DE GASTOS	**64.444.317**	**200.001**	**1.774**	**2.193.006**	**2.193.006**	**64.642.543**	**25.401.818**	**39.240.726**	**39.3%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**982.444**	**0**	**1.774**	**76.043**	**76.043**	**980.670**	**911.999**	**68.671**	**93.0%**
GASTOS DE PERSONAL	**219.198**	**0**	**1.774**	**0**	**0**	**217.424**	**203.578**	**13.846**	**93.6%**
Factores constitutivos de salario	165.419	0	0	0	0	165.419	163.599	1.819	98.9%
Contribuciones inherentes a la nómina	34.755	0	0	0	0	34.755	33.382	1.372	96.1%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19.025	0	1.774	0	0	17.251	6.596	10.654	38.2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**731.246**	**0**	**0**	**76.043**	**76.043**	**731.246**	**708.421**	**22.825**	**96.9%**
Activos fijos	23.000	0	0	7.000	0	30.000	29.534	466	98.4%
Materiales y suministros	144.000	0	0	22.400	14.440	141.960	141.359	601	99.6%
Adquisición de servicios	564.246	0	0	56.643	61.603	559.286	537.527	21.759	96.1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.00**	**0.0%**
IMPUESTOS	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0.0%**
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**17.364.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.364.099**	**17.364.099**	**0**	**100.0%**
CUENTAS POR PAGAR	**17.364.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.364.099**	**17.364.099**	**0**	**100.0%**
Funcionamiento	121.745	0	0	0	0	121.745	121.745	0	100.0%
Inversión	17.242.354	0	0	0	0	17.242.354	17.242.354	0	100.0%
INVERSIÓN	**41.190.098**	**200.001**	**0**	**2.116.962**	**508.237**	**42.998.825**	**7.125.720**	**35.873.105**	**16.6%**
Construcción y Servicios de la Construcción	**39.968.442**	**200.000**	**0**	**425.412**	**84.025**	**40.509.830**	**4.753.579**	**35.756.251**	**11.7%**
Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	**904.456**	**1**	**0**	**1.304.109**	**58.730**	**2.149.836**	**1.754.600**	**39.824**	**97.8%**
Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	**317.200**	**0**	**0**	**387.441**	**10.070**	**694.571**	**617.541**	**77.030**	**88.9%**
DISPONIBILIDAD FINAL	**4.907.675**	**0**	**0**	**0**	**1.608.726**	**3.298.950**	**0**	**3,298,950**	**0.0%**

Diciembre 2023

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

A continuación, se discriminan los proyectos de inversión que se han comprometido con recursos vigencia 2023, información acorde con la ejecución presupuestal de la Entidad.

INVERSIONES	TOTAL	FUENTE FINANCIACIÓN		
		NACIÓN	MUNICIPIO	APORTES ADICIONALES
Suministro e instalación de paraderos	3.724.283	3.724.283		
Terminales de ruta y estación de cabecera	528.159	528.159		
Consultoria SGC	355.412	355.412		
Servicios financieros	29.750	29.750		
Diseño e Interventoría Carril Prioritario Simple	115.975			115.975
Gerencia del Proyecto	2.372.141		2.372.141	
TOTAL	**7.125.720**	**4.637.604**	**2.372.141**	**115.975**

Cifras en miles de pesos

Con relación a la ejecución presupuestal de la Entidad, es importante resaltar que a la fecha de análisis existe un porcentaje de ejecución en el presupuesto de ingresos del **33.5%** (disponibilidad inicial, aportes Municipio y Nación y otros aportes adicionales al convenio de cofinanciación) y en el presupuesto de gastos se refleja un porcentaje de ejecución del **39.3%**, tal y como se detalló anteriormente. Con relación a la ejecución presupuestal de ingresos correspondiente al funcionamiento e inversión del Ente Gestor y de acuerdo a los compromisos adquiridos con relación a los recursos para financiar los gastos que se generan en el giro normal de la Empresa y en virtud de dar claridad de la gestión por parte del Ente Gestor, me permito informar que se ha comunicado al municipio de Neiva los Estados de Cuenta a través de los cuales se ha indicado el valor adeudado y se han llegado los respectivos soportes, para mayor ilustración me permito relacionar los estados de cuenta remitidos a la Alcaldía de Neiva durante las vigencias fiscales 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS AL MUNICIPIO DE NEIVA

VIGENCIA	FECHA DE OFICIO	NO. DE RADICACIÓN INTERNA DEL SETP	NUMERO DE RECIBIDO - ALCALDÍA
2017	25 de enero del 2017	201701026	R – 00603 – 201702796 – Control ID – 146093
	08 de febrero de 2017	201702007	R – 00008 – 201703954 Control ID – 147370
	27 de febrero de 2017	201702034	R – 00008 – 201705279 – Control ID – 149996
	24 de julio de 2017	201707020	RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL DESPACHO DE SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO NEIVA
	14 de agosto de 2017	201708020	R – 00008 – 201732108 – Control ID – 178226
	27 de septiembre del 2017	201709025	R – 00008 – 201741583 – Control ID – 189029
	17 de noviembre del 2017	201711017	R – 00603 – 201753762 – Control ID – 203757
2018	15 de febrero del 2018	201802047	R – 00354 – 201808952 – Control ID – 224771
	13 de marzo de 2018	201803023	R – 00008 – 201814552 Control ID – 231883
	11 de abril de 2018	201804007	R – 03006 – 201820004 – Control ID – 239192
	16 de mayo de 2018	201805042	R – 03006 – 201828880 Control ID – 253541
2019	23 de enero del 2019	201901011	R – 03006 – 201902969 Control ID – 336767
	08 de febrero de 2019	201902015	R – 03006 – 201905109 Control ID – 341160
	15 de febrero del 2019	201902055	R - 03006 – 201907134 Control ID – 345034

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	01 de julio del 2019	201907065	R – 03006 – 201929594 Control ID – 380944
	02 de agosto del 2019	201908016	R – 03006 – 201932826 Control ID – 384964
	30 de octubre del 2019	201911002	R – 03006 – 201945067 Control ID – 399993
	07 de noviembre de 2019	201911042	R – 03006 – 201946376 Control ID – 401553
	03 de diciembre de 2019	201912014	R – 03006 – 201948856 Control ID – 404533
2020	15 de enero del 2020	ND	Ventanilla única R-03006-202000826 Control ID: 408794
	12 de febrero del 2020	ND	Ventanilla única R-03006-202005433 Control ID: 414518
	06 de marzo del 2020	ND	Ventanilla única R-03006-202008538 Control ID: 418407
	12 de mayo del 2020	ND	Ventanilla única R-03006-202011428 Control ID: 422372
	25 de junio del 2020	ND	Ventanilla única R-03006-202016559 Control ID: 428481
	15 de octubre del 2020	ND	Vía e-mail
2021	17 de febrero del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202105416 Control ID: 450823
	05 de abril del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202110850 Control ID: 466809
	01 de junio del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202118562 Control ID: 476996
	01 de julio del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202121980 Control ID: 481820
	16 de julio del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202122563 Control ID 483948
	27 de agosto del 2021	CD 555	Ventanilla única R-03001-202129719 Control ID: 491941
	20 de septiembre del 2021	CD 594	Ventanilla única R-03001-202132923 Control ID: 495917
	05 de octubre del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202134631 Control ID 498854
	03 de noviembre del 2021	ND	Ventanilla única R-03001-202137850 Control ID 502358
	14 de diciembre del 2021	ND	Vía e-mail
2022	08 de febrero del 2022	CD 780	Ventanilla única R-03001-202204728 Control ID: 516733
	17 de marzo del 2022	CD 879	Ventanilla única R-03001-202211170 Control ID: 524555
	23 de junio del 2022	CD 1041	Ventanilla única Control ID: 543744
	08 de agosto del 2022	CD 1117	Ventanilla única Control ID: 549937
	29 de septiembre del 2022	CD 1239	Ventanilla única Control ID: 557101
	13 de octubre del 2022	CD 1264	Ventanilla única Control ID: 559060
2023	21 de febrero del 2023	CD 1562	Ventanilla única Control ID: 577110-577116
	18 de abril del 2023	CD 1690	Recibido por Secretaría de Hacienda Municipal
	26 de mayo del 2023	CD 1756	Ventanilla única Control ID: 15166 Hacienda
	10 de julio del 2023	CD 1827	Ventanilla única Control ID: 22607 Hacienda
	8 de septiembre del 2023	CD 1933	Ventanilla única Control ID: 33268 Hacienda
	29 de septiembre del 2023	CD 1998	Ventanilla única Control ID: 35757 Hacienda
	27 de diciembre del 2023	CD 2213	Ventanilla única Control ID: 35757 Hacienda

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio de Neiva tiene establecido en el convenio de cofinanciación los aportes hasta la vigencia 2020 tal y como se refleja en el numeral 2.3 Aportes del Municipio establecido en el convenio de cofinanciación, la Entidad procedió a reliquidar el ajuste inflacionario de los aportes efectivamente realizados, según lo establecido en el otrosí No. 01 del Convenio de Cofinanciación a través de su cláusula tercera, por lo tanto se ha remitido la fórmula matemática para el respectivo ejercicio

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

financiero, por lo cual este valor puede sufrir modificaciones en el momento de realizar la revisión por parte de los involucrados en el proceso.

LIQUIDACIÓN DEL AJUSTE DEL COMPONENTE INFLACIONARIO RECURSOS MUNICIPIO – INDEXACIÓN		
No. OFICIO	**FECHA DE REMISIÓN**	**CANAL DE RECEPCIÓN Y/O OBSERVACIÓN**
202007021	15 de julio del 2020	Ventanilla única R-03006-202017546 Control ID: 429668
N/A	19 de agosto del 2020	Correo electrónico – Revisión y aprobación de la fórmula de indexación por parte de la UMUS
CD 478	15 de julio del 2021	Ventanilla única R-03001-202123567 Control ID: 483948
CD 1762	31 de mayo del 2023	Radicado Secretaría de Hacienda Municipal

Adicionalmente se han venido realizando varias mesas de trabajo con relación al cálculo matemático de la indexación de los aportes territoriales.

De igual manera se presentan las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional con relación al desembolso de los aportes.

ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS A LA NACIÓN

VIGENCIA	FECHA DE OFICIO	NO. DE RADICACIÓN INTERNA DEL SETP	NUMERO DE RECIBIDO – MINISTERIO DE TRANSPORTE
2016	09 de marzo de 2016	20160301600	F – 939615661 – SERVIENTREGA
	09 de noviembre de 2016	201612515	F – 951585771 – SERVIENTREGA
	21 de diciembre de 2016	201612038	F – 951586442 – SERVIENTREGA
2017	8 de noviembre del 2017	201711008	RN- 866711878 CO – SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A
	27 de noviembre de 2017	201711039	RN – 856406423 CO - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A
	27 de noviembre de 2017	201711040	RN – 866711881 CO - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A
	27 de noviembre de 2017	201712010	RN – 870655829 CO - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A
	05 de diciembre de 2017	201712011	F – 964819992 – SERVIENTREGA
2018	15 de febrero del 2018	201802048	F – 972595664 – SERVIENTREGA
	13 de marzo de 2018	201803015	F – 972596616 – SERVIENTREGA

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2019	22 de mayo de 2019	201906009	F – 996530862 – SERVIENTREGA
	24 de agosto de 2019	201908082	Soporte de envío por E- MAIL 24 de agosto 2019
	24 de agosto de 2019	201908083	Soporte de envío por E- MAIL 24 de agosto 2019
2021	01 de marzo de 2021	N/D	Soporte de envío por E- MAIL 01 de marzo 2021
	27 de agosto de 2021	CD 588	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
	22 de noviembre de 2021	CD 688	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
	15 de diciembre de 2021	CD 725	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
	15 de diciembre de 2021	CD 726	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
2022	11 de mayo de 2022	CD969	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
	14 de diciembre de 2022	CD1418	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
2023	31 de agosto de 2023	CD1925	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
	17 de octubre de 2023	CD2044	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
	17 de noviembre de 2023	CD2140	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.

Con relación a las gestiones administrativas adelantadas para mejorar los indicadores presupuestales se realizaron las siguientes actividades:

- Durante la vigencia fiscal 2023 se enviaron varios estados de cuenta al Municipio de Neiva, de igual forma se ha presentado la situación financiera de la Entidad a la Junta Directiva de la Entidad, Asamblea General de Accionistas, comité fiduciario y demás mesas de trabajo realizadas con el Ministerio de Transporte en el seguimiento trimestral al proyecto, así como también se ha informado de manera oportuna al Gobierno Nacional la situación actual de la Entidad.

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
Saldo Vigencias Anteriores	*29,584,189,078,00*
Aporte vigencia 2022 Funcionamiento	*800.000.000,00*
Aporte adicionales convenio de cofinanciación	*200.000.000,00*
SUB – TOTAL	**30.584.189.078,00**
(-) Pagos vigencia 2023	**3.800.000.000,00**
SALDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2023	**26.784.189.078,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Al finalizar el cierre financiero con corte diciembre 31 de 2023, se puede concluir que el Municipio de Neiva, adeuda por concepto de aportes del convenio de cofinanciación $ 26.784 millones de pesos tal y como se refleja a continuación:

FECHA COMPROMISO	CONCEPTO	VALOR	GIROS REALIZADOS VIG 2023		POR GIRAR	FUENTE FINANCIACIÓN	
			MUNICIPIO	USCO		MUNICIPIO	USCO
04/12/2017 12/09/2018 14/11/2019 10/03/1010 16/12/2020 28/04/2021 14/12/2022	Saldo vigencias anteriores	29.584.189	2.800.000	0	26.784.189	23.784.189	3.000.000
	Funcionamiento Ente Gestor	800.000	800.000	0	0	0	0
	Aportes adicionales	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	**30.584.189**	**3.800.000**	**0**	**26.784.189**	**23.784.189**	**3.000.000**

Fuente: Informe Ente Gestor. *Cifras en miles de pesos*

Nota: El Señor alcalde del Municipio de Neiva a través de la Resolución Interna N° 0048 del 10 de abril de 2023, ordenó la transferencia de recursos al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S, para el funcionamiento y operatividad de este, según conpes 3756 del 02 de agosto de 2013, por valor de $ 3.800 millones de pesos. Adicionalmente se ajustaron los aportes de acuerdo con la indexación proyectada remitida por la Administración Municipal según oficio 0261 del 15 de junio de 2023, estableciendo la forma de pago del valor pendiente así: vigencia 2024 $ 6.000 millones de pesos y en la vigencia 2025 $ 5.885 millones de pesos.

- Con relación a los recursos de la Nación es importante resaltar que durante el primer trimestre de la presente vigencia ingresaron los recursos adeudados por la Nación, tal y como se refleja a continuación:

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
Aporte vigencia 2022	*35.080.381.946,00*
SUB-TOTAL	**35.080.381.946,00**
(-) Pagos realizados en la vigencia 2023	***2.198.955.467,00***
VALOR REPROGRAMACIÓN	**32.881.426.479,00**

Actualmente el estado de cuenta de los recursos de la Nación se refleja de la siguiente manera:

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
Aporte vigencia 2023	*39.768.430.281,00*
SUB-TOTAL	**39.768.430.281,00**
(-) Compromisos realizados en la vigencia 2023	***4.252.441.096,00***
VALOR REPROGRAMACIÓN	**35.515.989.185,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Con relación a la fuente de financiación Nación, es importante resaltar que se encuentra pendiente de reprogramación de aportes por parte del Gobierno Nacional la suma de $32.881.426.479,00, correspondiente a la vigencia 2022 y de la vigencia 2023 $ 35.515.989.185,00.

Adicionalmente, es importante resaltar que el área administrativa y financiera de la Entidad durante la presente vigencia ha cumplido de manera oportuna con la rendición de todos los informes remitidos a los Entes de Control, Gobierno Nacional, Comité Fiduciario, Junta Directiva, Asamblea General de Accionistas entre otros. Adicionalmente se realizaron las gestiones para dar cumplimiento a la rendición de todos los informes correspondientes al cierre del cuarto trimestre del 2023. De igual manera se han presentado los informes correspondientes a los Entes de Control en lo corrido de la vigencia 2023, tal y como se detallan a continuación.

Contraloría Municipal de Neiva. Informe Anual.

Formato Nombre

- ✓ Catálogo de Cuentas Con sus respectivos anexos.
- ✓ Resumen de Caja Menor.
- ✓ Relación de Gastos de Caja Menor,
- ✓ Cuentas Bancarias
- ✓ Póliza de Aseguramiento
- ✓ Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas
- ✓ Propiedad, Planta y Equipo – Inventario
- ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos
- ✓ Ejecución Presupuestal de Gastos
- ✓ Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
- ✓ Modificaciones al Presupuesto de Egresos
- ✓ Ejecución PAC de la vigencia. Se anexa certificado.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
- ✓ Talento Humanos - funcionarios por Nivel
- ✓ Talento Humano – Nombramientos
- ✓ Talento Humano - Pagos por Nivel
- ✓ Talento Humano – Cesantías
- ✓ Talento Humano - Número de funcionarios
- ✓ Relación Peticiones, Quejas y Reclamos
- ✓ Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo
- ✓ Relación de Bienes Inmuebles
- ✓ Informe de Gestión Componente Financiero y Administrativo

Contraloría General de la República: Informe Trimestral.

- ➢ Se presento el Informe CGR Presupuestal del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte diciembre 31 de 2023.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Programación del Ingreso
- Ejecución del Ingreso
- Programación del Gasto
- Ejecución del Gasto con los siguientes anexos:

  - ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos
  - ✓ Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal
  - ✓ Relación de Registros Presupuestales
  - ✓ Relación de Obligaciones
  - ✓ Relación de Giros
  - ✓ Relación de modificaciones presupuestales de Ingresos y Gastos
  - ✓ Saldos de Registros Presupuestales
  - ✓ Saldos de CDP
  - ✓ Liberaciones de CDP
  - ✓ Liberaciones de Registros Presupuestales

Ministerio de Transporte: Informe Trimestral.

- Se realizaron los respectivos envíos al Ministerio de Transporte con corte diciembre de 2023, la siguiente información:

  - Balances de prueba del proyecto mensualizados.
  - Archivos planos mensualizados.
  - Estado de inversión acumulada
  - Informes de la Fiducia – mensuales
  - Informes de Fiducia. F1, F2, F4
  - Notas explicativas
  - Conciliaciones de saldos bancarios
  - Conciliación SOE VS E.I.A
  - Conciliación Informe de Pagos C1 VS E.I.A
  - Conciliación saldo RP VS cuenta 939011
  - Extractos Bancarios
  - Certificado de Gastos (SOE)
  - Certificado de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto
  - Amortización del crédito sindicado
  - Informes de pagos de los contratos C-1 vigencias anteriores
  - Informe de pagos C1 vigencia actual
  - Resumen de los pagos de los contratos
  - Ejecución Acumulada redes de servicio público
  - Plan Operativo Anual de Inversiones POAI:
    - ✓ Relación de pagos acumulados

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- ✓ Relación de aportes acumulados
- ✓ Reprogramación de aportes de acuerdo con el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación. (Proyección).
- ✓ Proyección de las inversiones por fuentes de financiación y componentes.

- Anexos:

  - ➢ Anexo No. 1 Lista de Chequeo
  - ➢ Anexo No. 2 Conciliación RP VS Cuenta 939011
  - ➢ Anexo No. 3 Certificado Revisoría Fiscal de la Fiduciaria
  - ➢ Anexo No. 4 Informe rendimientos generados y devueltos
  - ➢ Anexo No. 5 Resumen Plan Operativo Anual (POAI)
  - ➢ Anexo No. 6 Comparación E.I.A vs POAI

- *Nota: Se actualizo el modelo financiero del POAI histórico y proyectado hasta el año 2028 por fuentes de financiación y por componentes de acuerdo con la información suministrada por el área de Infraestructura y Operaciones de la Entidad, apoyándonos en lo establecido en los documentos CONPES N° 3756 y N° 3833, y el Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes modificatorios.*

Presentación Comité Fiduciario: Informe Trimestral.

- ➢ Se estructuró la presentación del comité Fiduciario con corte diciembre 31 de 2023, de la presente vigencia la cual cuenta con la siguiente información:

  - ✓ *Ejecución Convenio de Cofinanciación*
  - ✓ *Relación Detallada de los Aportes*
  - ✓ *Relación de los Giros a Terceros*
  - ✓ *Informe de Inversión Acumulada y Proyectada*
  - ✓ *Conciliación por Fuentes de Financiación*
  - ✓ *Seguimiento Compromisos*
  - ✓ *Cierre Financiero Fuente de Financiación BIRF*
  - ✓ *Presupuesto de Ingresos y Gastos*
  - ✓ *Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos*
  - ✓ *Avances en el componente administrativo*

Informe Contable Contaduría General de la Nación - CHIP: Informe Trimestral.

- ➢ Se elaboraron los informes trimestrales CGN los cuales corresponde a lo siguiente:
  - Saldos y Movimientos
  - Operaciones Recíprocas
  - Informe de Variaciones Trimestrales.

Informe SIGUEME del CHIP: Informe Trimestral.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Se elaboraron los informes SIGEME de la Dirección General de Participaciones Estatales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte diciembre 31 de 2023.

    - Indicadores de Información General (Indicadores 2 – Información Financiera 2).

    - Proyecciones de Indicadores e Información General - Indicadores e Información Financiera.

Informe de CGR Personal y Costos: Informe Anual.

- Se presentó el informe anual de personal y costos correspondiente a la vigencia 2022.

    - Relación contratos vigencia 2022 con sus respectivos pagos
    - Relación de los pagos realizados al Gerente de la Entidad por concepto de nómina y prestaciones sociales. De igual manera se está proyectando el informe correspondiente a la vigencia 2023.

Plataforma CHIP – Reporte CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario: Informe Trimestral.

- Se realizó el cargue en la plataforma CHIP de los formularios (Formulación de Ingresos, Ejecución de Ingresos, Formulación de Gastos, Ejecución de Gastos y Secciones Presupuestales Adicionales) correspondiente al cuarto trimestre del 2022, y primer, segundo y tercer trimestre 2023, el cual se reporta de manera trimestral y recopila el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, de acuerdo con las Resoluciones reglamentarias Nos. 035 de 2020 y 084 del 2021.

Actualización de página web con la siguiente información: Actualización permanente.

- La página web de la Entidad se actualiza de manera permanente con relación al componente financiero y administrativo de la Entidad.

    - Resolución N° 001 Liquidación y desagregación presupuesto
    - Resolución N° 002 Constitución de cuentas por pagar
    - Información Financiera y Contables mensual.
    - Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por recursos y gerencial de manera mensual.
    - Relación de Certificados de disponibilidad presupuestal
    - Relación de Registros Presupuestales.
    - Relación de Obligaciones.
    - Relación de giros
    - Relación Giro de Ingresos
    - Modificación Presupuestal de Ingresos (en elaboración)
    - Modificación Presupuestal de Gastos (en elaboración)

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Liberaciones de Certificados de disponibilidad presupuestal
- Liberaciones de Registros presupuestales
- Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones.
- Resoluciones Internas y circulares.

Informe SIREC Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Actualización permanente.

- Se elaboró y cargó la información en la plataforma SIREC de la Dirección General de Participaciones Estatales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

  - Estados Financieros
  - Actualización Estatutos SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - Certificado de Composición Accionaria.
  - Informe de Revisor Fiscal
  - Informe de Gestión 2021.
  - Código Integridad y Buen Gobierno.
  - Certificado Calificadora de Riesgos.
  - Reporte de Contingencia SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - Certificado Desagregación de las Reservas Patrimoniales.
  - Plan Operativo Anual de Inversiones
  - Acta Pre-asamblea.
  - Notas de Estados Financieros
  - Presupuesto aprobado Junta Directiva SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - Actualización de Miembros de Junta Directiva.
  - Actas de sesiones de Junta Directiva

Información reportada a la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas

Se consolidó la información y se elaboraron los documentos requeridos para las sesiones de Junta Directiva, Asamblea General de Accionistas tales como:

- Reporte de Direccionamiento Estratégico exigido por el Ministerio de Hacienda Y Crédito Público.
- Matriz de compromiso de Juntas Anteriores.
- Informes de gestión administrativa y financiera en formato PowerPoint.
- Presentación de Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal.

Actos Administrativos y demás acciones:

- Se estructuraron las resoluciones en materia administrativa y financiera, tal y como se detallan a continuación:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No. RESOLUCIÓN	CONCEPTO	FECHA EXPEDICIÓN
001	Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión del Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	3/01/2023
002	Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2022	3/01/2023
003	Por medio de la cual se declaran algunos días hábiles de los meses de enero a diciembre del año 2023 en el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4/01/2023
004	Por medio de la cual se suspende de forma temporal la exigencia y verificación de algunos documentos pre-contractuales para la celebración y legalización de los contratos celebrados durante la vigencia 2023 por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., y se dictan otras disposiciones.	23/01/2023
005	"Por medio de la cual se adopta el Procedimiento de baja de activos fijos en mal estado y/o en desuso, y el Formato de Acta baja de activos fijos en mal estado o desuso para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	27/01/2023
006	*"Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*	30/01/2023
007	Por medio de la cual se vincula un judicante Ad-Honorem	1/02/2023
008	"Por la cual se conforma el comité evaluador para la Invitación Pública No. 001 de 2023"	9/02/2023
009	"Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje"	14/02/2023
010	"Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje"	15/02/2024
011	"Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	15/02/2023
012	"Por la cual se conforma el comité evaluador para la Invitación Pública No. 002 de 2023"	16/02/2023
013	"Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje"	17/02/2023
014	Por el cual se ordena la apertura del proceso de Concurso de Méritos Abierto 001 de 2023	21/02/2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

015	Por medio de la cual se declara desierto un proceso de convocatoria pública en la modalidad de mínima cuantía No. CMC 002 de 2023	22/02/2023
016	"Por la cual se conforma el comité evaluador para la Invitación Pública No. 003 de 2023"	28/02/2023
017	"Por la cual se conforma el comité evaluador para la Invitación Pública No. 004 de 2023"	01/03/2023
018	Por medio de la cual se declara desierto un proceso de convocatoria pública en la modalidad de mínima cuantía No. CMC 003 de 2023	02/03/2023
019	"Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	02/03/2023
020	"Por la cual se conforma el comité evaluador para el proceso de selección Concurso de Méritos Abierto No. 001 de 2023"	03/03/2023
021	*"Por medio de la cual realiza un Traslado en el Presupuesto de Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 2023 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*	03/03/2023
022	Por el cual se ordena la apertura del proceso de selección de contratistas adelantado mediante Licitación Pública 001 de 2023	04/03/2023
023	*"Por medio de la cual se ordena un pago de derechos de inscripción en la Cámara de Comercio del Huila"*	07/03/2023
024	"Por la cual se conforma el comité evaluador para la invitación pública No. 005 de 2023"	07/03/2023
025	Por de la cual se aprueban las tablas de valoración documental - TVD del SETP TRANSFEDERAL SAS	09/03/2023
026	Por de la cual se modifica la Resolución nro. 005 del 27 de enero de 2023 y se dictan otras disposiciones	10/03/2023
027	Por medio de la cual se declara desierto un proceso de convocatoria pública en la modalidad de mínima cuantía No. CMC 006 de 2023	11/03/2023
028	Por medio de la cual se declara desierto un proceso de convocatoria pública en la modalidad de concurso de méritos abierto 001 de 2023	16/03/2023
029	Por la cual se conforma el comité evaluador para la invitación pública No. 007 de 2023	17/03/2023
030	Por la cual se conforma el comité evaluador para la invitación pública No. 008 de 2023	17/03/2023
031	"Por la cual se conforma el comité evaluador para el proceso de selección en la modalidad de licitación pública No. LP 001 de 2023	17/03/2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

032	Por el cual se ordena la apertura del proceso de selección de contratistas adelantado mediante Concurso de Méritos Abierto 002 de 2023	22/03/2023
033	Por la cual se conforma el comité evaluador para la invitación pública No. 009 de 2023	24/03/2023
034	*"Por medio de la cual se ordena un pago en la Cámara de Comercio del Huila para la renovación de la matrícula mercantil del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*	28/03/2023
035	"Por medio de la cual se declara desierto un proceso de convocatoria pública en la modalidad de mínima cuantía No. CMC 009 de 2023"	29/03/2023
036	"Por la cual se conforma el comité evaluador para el proceso de selección concurso de méritos abierto No. 002 de 2023"	29/03/2023
037	"Por la cual se conforma el comité evaluador para la invitación pública No. 010 de 2023"	31/03/2023
038	Reconstrucción de un expediente	13/04/2023
039	Por la cual se adjudica el proceso de selección de contratistas adelantado mediante licitación pública 001 de 2023	20/04/2023
040	"Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	20/04/2023
041	Por la cual se adjudica el proceso de selección de contratistas adelantado mediante CMA 002 de 2023	24/04/2023
042	Por el cual se ordena la apertura del proceso de CMA 003 de 2023	25/04/2023
043	Por la cual se conforma el comité evaluador para la Invitación Pública 011 de 2023	26/04/2023
044	Por medio de la cual se autoriza la cesión del CPSAG 049 del 20 de febrero del 2023 suscrito entre el SETP y Adriana Sánchez Garzón	26/04/2023
045	Por el cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía 001 de 2023	26/04/2023
046	Por medio de la cual se autoriza la cesión del CPSP 044 del 15 de febrero del 2023 suscrito entre el SETP y Jairo Andrade	28/04/2023
047	Por medio de la cual se realiza una adición y reducción al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2023	28/04/2023
048	Por medio de la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	28/04/2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

049	Por medio de la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	28/04/2023
050	Por medio de la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	2/05/2023
051	Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de activos fijos del inventario del SETP TRANSFEDERAL SAS y su destrucción, y se dictan otras disposiciones.	2/05/2023
052	Por medio de la cual se ordena un pago a favor de la empresa MUNDIAL DE SEGUROS SA para amparar la ampliación de la póliza Nro. NV-1000305823	2/05/2023
053	Por la cual se conforma el comité evaluador para el proceso de CMA 003 de 2023	5/05/2023
054	Por medio de la cual se ordena el pago a expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020	5/05/2023
055	Por la cual se conforma el comité evaluador para el proceso de selección abreviada de menor cuantía 001 de 2023	5/05/2023
056	Por medio de la cual se realiza un traslado en el presupuesto de gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2023	15/05/2023
057	Por de la cual se modifica la Resolución No. 026 del 10 de marzo de 2023 y la Resolución No. 051 del 02 de mayo de 2023, y se dictan otras disposiciones	16/05/2023
058	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de Invitación Publica 012 de 2023	17/05/2023
059	Por el cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía 001 de 2023	23/05/2023
060	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	26/05/2023
061	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	26/05/2023
062	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	26/05/2023
063	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de Invitación Publica 013 de 2023	2/06/2023
064	Por medio de la cual se declara desierto un proceso de convocatoria pública en la modalidad de CMA 003 de 2023	6/06/2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

065	Por medio de la cual se vincula un judicante Ad-Honorem	6/06/2023
066	Por medio de la cual se ordena el pago a expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020	14/06/2023
067	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	20/06/2023
068	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	20/06/2023
069	Por medio de la cual se adoptan las escalas de viáticos y gastos de viaje para los funcionarios y contratistas del SETP	26/06/2023
070	Por el cual se ordena la apertura del proceso de concurso de méritos abierto 004 de 2023	11/07/2023
071	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	17/07/2023
072	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de CMA 004 de 2023	18/07/2023
073	Por medio de la cual se ordena el pago a expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020	18/07/2023
074	Por medio de la cual se adoptan las escalas de viáticos y gastos de viaje para los funcionarios y contratistas del SETP	26/07/2023
075	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	28/07/2023
076	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	28/07/2023
077	Por la cual se adjudica el proceso de CMA 004 de 2023	31/07/2023
078	Por medio de la cual se ordena el pago a expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020	2/08/2023
079	Por la cual se modifica la Resolución Administrativa 006 del 20 de enero de 2021 por medio de la que se designó el Comité Evaluador al interior del proceso de selección de contratistas adelantado mediante SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 002 DEL 2020.	8/08/2023
080	Por la cual se autoriza una cesión del Contrato de Obra 011 de 2021	8/08/2023
081	Por el cual se efectúan unas delegaciones para la preparación, formulación, presentación, implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento vigencia fiscal 2023 y la efectividad de sus acciones en el SETP	10/08/2023
082	SALTO EN LA NUMERACIÓN	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

083	Por medio de la cual se realiza un traslado al presupuesto de gastos en los capítulos de inversión y funcionamiento para la vigencia fiscal 2023 del SETP	22/08/2023
084	Por medio de la cual se ajusta el salario de los empleados públicos del SETP para la vigencia fiscal 2023	24/08/2023
085	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	24/08/2023
086	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	4/09/2023
087	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	4/09/2023
088	Por la cual se conforma el Comité Interno de Empalme para el proceso de Transición de Gobierno 2020-2023	4/09/2023
089	Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato 947 del 2020 suscrito entre el municipio de Neiva y el SETP	6/09/2023
090	Por medio de la cual se ordena un pago de derechos de inscripción en la Cámara de Comercio del Huila	6/09/2023
091	Por medio de la cual se ordena un pago de derechos de inscripción en la Cámara de Comercio del Huila	6/09/2023
092	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	13/09/2023
093	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	13/09/2023
094	Por el cual se ordena la apertura del proceso del CMA 005 de 2023	25/09/2023
095	Por medio de la cual se autoriza la cesión del CPSP 119 del 19 de septiembre del 2023 suscrito entre el SETP y Edwin Amaya	29/09/2023
096	Por medio de la cual se realiza un traslado al presupuesto de gastos en los capítulos de inversión para la vigencia fiscal 2023 del SETP	4/10/2023
097	Por medio de la cual se ordena el pago a expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020	6/10/2023
098	Por el cual se ordena la apertura del proceso del CMA 006 de 2023	6/10/2023
099	Por medio de la cual se declaran algunos días hábiles de los meses de octubre a diciembre del año 2023 en el SETP	9/10/2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

100	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de CMA 005 de 2023	11/10/2023
101	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	11/10/2023
102	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	11/10/2023
103	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	12/10/2023
104	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	12/10/2023
105	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	12/10/2023
106	Por el cual se ordena la apertura del proceso de SASI 002 de 2023	16/10/2023
107	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	17/10/2023
108	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	17/10/2023
109	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de SASI 002 de 2023	18/10/2023
110	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de IP 014 de 2023	19/10/2023
111	Por el cual se adjudica el proceso de SASI 002 de 20203	19/10/2023
112	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de CMA 006 de 2023	20/10/2023
113	Por el cual se adjudica el proceso de CMA 005 de 20203	23/10/2023
114	Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato 947 del 2020 suscrito entre el municipio de Neiva y el SETP	3/11/2023
115	Por el cual se adjudica el proceso de CMA 006 del 2023	8/11/2023
116	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	24/11/2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

117	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	24/11/2023
118	Por la cual se modifica la Resolución No. 099	1/12/2023
119	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	4/12/2023
120	Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje.	4/12/2023
121	Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato 947 del 2020 suscrito entre el municipio de Neiva y el SETP	5/12/2023
122	Por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de CMC 014 del 2023	7/12/2023
123	Por medio del cual se adopta la actualización del Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría para el SETP	7/12/2023
124	Por la cual se concluye el procedimiento administrativo especial contractual para determinar la posible declaratoria de incumplimiento parcial, imposición de multa y cláusula penal dentro del Contrato de Obra 186 de 2021 entre el SETP y Consorcio Andenes y Obras C&V	26/12/2023
125	Por medio de la cual se realiza una adición al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2023 del SETP	22/12/2023
126	Por medio de la cual se suspenden términos en todas las actuaciones administrativas y procesales en el SETP	29/12/2023

- Se elaboró el Plan de Acción del Área Financiera y Administrativa correspondiente a la vigencia 2023.
- Se realizó el seguimiento al Plan de Acción del Área Financiera y Administrativa con corte diciembre del 2023.
- Se continúa cumpliendo con los informes trimestrales de manera oportuna al Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal, Contraloría General de la República, entre otros.
- Se realizó un seguimiento a la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de verificar el ***cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***
- Se realizaron las actualizaciones en lo que respecta a noticias de interés y la publicación del Link de Transparencia y Acceso a la información.
- Durante lo corrido de la vigencia 2023 con corte 31 de diciembre del 2023. la Entidad ha recibido **315 PQRSD.** las cuales se han tramitado de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Ley 1755 de 2015 y al Art. 5 del Decreto Legislativo No. 491 del 2020. las mismas fueron recibidas a través de los siguientes canales de comunicación:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

MES	RECIBIDO MEDIOS VIRTUALES	VENTANILLA ÚNICA
ENERO	20	2
FEBRERO	30	5
MARZO	27	4
ABRIL	18	4
MAYO	19	3
JUNIO	12	3
JULIO	26	5
AGOSTO	17	4
SEPTIEMBRE	25	7
OCTUBRE	29	2
NOVIEMBRE	23	6
DICIEMBRE	20	4
TOTAL	194	37

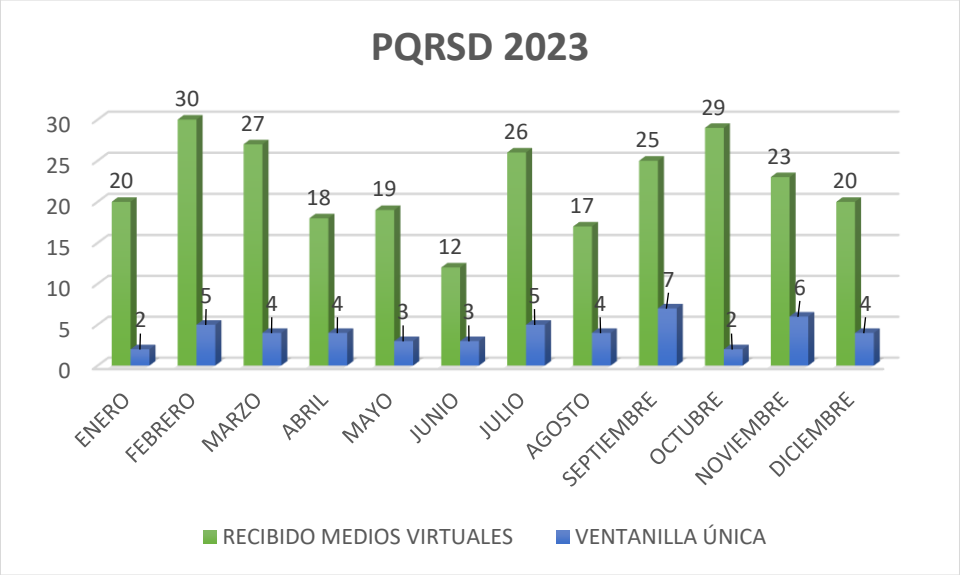

- Se elaboró la matriz de riesgos de gestión y corrupción del proceso Administrativo y Financiero de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se realizó el seguimiento a la matriz de riesgos de gestión y corrupción del proceso Administrativo y Financiero, con corte diciembre del 2023.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Se sistematiza la información del personal vinculado del SETP bajo las distintas modalidades de contratación, con el fin de rendir la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Archivo – Gestión Documental de la Entidad

El proceso de gestión documental es un proceso de apoyo de toda empresa según lo estipula que La ley 594 del 2000 "Ley general de archivo"; es por eso por lo que dando cumplimiento a esta ley el SETP TRANSFEDERAL implemento en la vigencia 2020 los instrumentos archivísticos como son PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD), PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR), Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) los cuales fueron aprobados el 14 – 09 – 2020 por el comité interno de archivo del SETP.

En agosto 2020 se puso en marcha el software de gestión documental BPM con el fin hacer seguimiento de todas las comunicaciones que ingresan al SETP TRANSFEDERAL a través de la ventanilla única, así mismo dar oportuna respuesta a las solicitudes.

Se creó usuario a contratistas y líderes para el manejo de documentos electrónicos a través del software de gestión documental BPM y se capacito a los contratistas en el manejo del mismo.

Se realizó la elaboración e implementación de procedimientos y los diferentes formatos documentales estandarizados en el SETP TRANSFEDERAL los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la entidad y el proceso de gestión documental.

Se dio trámite de las TRD aprobadas por el comité interno de archivo al Comité Departamental de Archivos del Huila con el fin se realice la valoración aprobación y convalidación de las mismas, logrando la convalidación mediante acta No 006 del 2021 de la secretaria general de fecha 16-12-2021.

Se realizó socialización de las TRD aprobadas al personal de contratistas por área con el fin de dar aplicabilidad a los archivos de gestión de cada área.

Se realizó la inscripción de las TRD Convalidadas en el registro único de series documentales del Archivo General de la Nación con el No TRD-482 de fecha 04-02-2022.

Se culminó el proceso de elaboración de los documentos precontractuales para posteriormente iniciar el proceso de contratación para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) del archivo de gestión del SETP TRANSFEDERAL.

Durante la vigencia 2020 hasta 2022 se viene liderando en el proceso de gestión documental la implementación de los instrumentos archivísticos en la entidad con el fin de dar cumplimiento a la ley general de archivo tanto en el archivo central como en los archivos de gestión de cada área.

Es de anotar que la Gestión Documental del SETP NEIVA TRANSFEDERAL es un proceso transversal en la entidad; va inmerso en cada una de las áreas, pues allí se llevan los Archivos de Gestión de los diferentes procesos que se lideran. Estos deben ser organizados como lo estipula la ley 594 del 2000 "ley general de archivos" y el procedimiento organización documental PT-GAF-05 creado y adoptado por la entidad con el fin

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

de dar trámite al archivo central de los documentos que ya cumplieron con el ciclo vital estipulado en las TRD de cada área.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2022. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registros oficiales de libros contables y preparación de los documentos soporte.

Aunado a lo anterior, para comprender los estados financieros de la entidad hay que tener en cuenta que esta tiene dos grandes centros de costos que se manejan independientemente pero que al final se integran en una sola contabilidad.

Un gran centro de costos corresponde al proyecto de infraestructura del Sistema denominado SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el cual se ejecuta de acuerdo con lo dispuesto en el convenio de cofinanciación suscrito entre el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S, mediante el cual se establece que los recursos comprometidos en el mencionado convenio sean administrados por el Ente Gestor hasta la vigencia 2025 a través de un encargo fiduciario, para lo cual se contrató a la Fiduciaria de Davivienda S.A., por lo tanto estos recursos se reflejan en el balance del proyecto en las cuentas de orden, de acuerdo con las directrices establecidas en el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2022.

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye las erogaciones correspondientes a gastos personales asociados a la nómina, servicios de personal indirecto, contribuciones inherentes a la nómina, gastos generales, sentencias y conciliaciones y demás gastos que no son elegibles y financiables con recursos del proyecto, estos gastos se apalancan con las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva.

A continuación, se presenta la estructura Financiera y Presupuestal de la Entidad:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

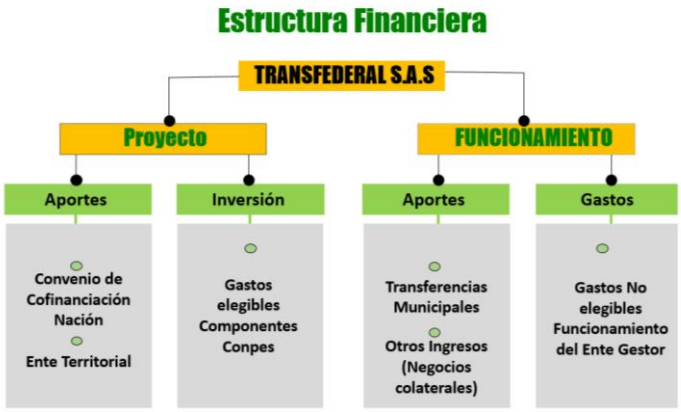

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

En esta denominación se incluyen los grupos que representan hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura financiera de la entidad, incluyen las cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

8355 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION

En este grupo tenemos la cuenta 835510 Ejecución proyectos de inversión, Activos, la cuenta 835511 Ejecución proyectos de inversión, Gastos y la cuenta 839090 Otras cuentas deudoras de control, Desarrollo Plan de Adquisiciones.

835510 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTIVOS

Corresponde a los avances y anticipos entregados por actas de obra, interventorías y demás pagos asociados al proyecto con un saldo a diciembre 31 de 2023 es **$ 1.183.023.741,40**

835511 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS

Corresponde a los gastos ejecución del proyecto, y se registra en el momento de causar las facturas presentadas por los contratistas por actas de obra, interventorías y demás pagos asociados al proyecto con un saldo a diciembre 31 de 2023 es **$ 187.249.857.981,96.**

839090 OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES:

Para la parte de “Inversión - Distribución del Presupuesto” Se registra en la subcuenta 839090-OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL- Desarrollo Plan de Adquisiciones. De acuerdo con el subcomponente indicado en la cartilla de cuentas, teniendo como contrapartida la subcuenta 891590- EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR- Desarrollo de los SETP. La dinámica de esta cuenta se realiza por fuentes de financiación y por componentes para un total de **$ 348.210.543.950,34** discriminados de la siguiente manera:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

En el presente trimestre se actualizaron los saldos de la cuenta 839090 por cada uno de los componentes de acuerdo con el POAI a diciembre 2023.

COMPONENTE SEGÚN CONPES 3756 DE 2013	E.I.A.	EJECUCION FINANCIERA ($ CORR.)	META CONPES ($ CORR.)
Construcción Total COD. 7041	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	9.453.258.940,08
		Municipio	9.379.977.118,55
		BIRF	8.663.119.671,67
		Otros Aportes-Redes	0,00
		Total	**27.496.355.730,30**
Intercambiador vial USCO e Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8 COD. 7008	**Construcción puentes peatonales COD.7008**	Nación	14.365.889.547,05
		Municipio	53.601.185.916,75
		BIRF	-
		Otros Aportes-Redes	0,00
		Otros Aportes-Multas	0
		Total	**67.967.075.463,80**
Patios y talleres COD. 7009	**Construcción de Talleres y Parqueaderos COD.7009**	Nación	48.173.947.501
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**48.173.947.501**
Semaforización COD.7043	**Centro de Control y Red Semafórica COD.7043**	Nación	23.710.686.236,51
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**23.710.686.236,51**
Rehabilitación incluyendo andenes COD. 7041	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	4.445.017.608
		Municipio	4.342.571.000
		BIRF	44.371.468.189,47
		Otros Aportes-Redes	0
		Total	**53.159.056.797,47**
Gestión de Flota COD. 7042	**Gestión de Flota COD.7042**	Nación	47.640.223.174,50
		Municipio	15.719.730.180,47
		BIRF	-
		Total	**63.359.953.354,97**
Urbanismo COD. 7048	**Paraderos COD.7048**	Nación	3.724.282.548
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**3.724.282.548**
Terminales - Estaciones COD.7046	**Terminales COD.7046**	Nación	4.434.258.548
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**4.434.258.548**
Carril prioritario simple COD. 7041	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	14.428.363.955
		Municipio	-
		BIRF	-
		Otros Aportes-Redes	0
		Total	**14.428.363.955**
CISC COD. 7045	**Centro de atención Municipal CAMIS COD.7045**	Nación	0
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**0**
Andenes COD. 7007	**Espacio Público y Vías Peatonales COD. 7007**	Nación	4.630.393.655
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**4.630.393.655**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Peatonalización COD. 7007	**Espacio Público y Vías Peatonales COD. 7007**	Nación	-
		Municipio	631.877.179
		BIRF	-
		Total	**631.877.179**
Gerencia del Proyecto COD. 7047	**Gerencia del Proyecto COD. 7047**	Nación	1.242.533.723,87
		Municipio	29.960.749.850,00
		BIRF	-
		Otros Aportes-Redes	0
		Otros Aportes-Multas	0,00
		Total	**31.203.283.574**
Costos Financieros	**Costo Financiero COD. 7051**	Nación	-
		Municipio	5.291.009.407,42
		BIRF	-
		Total	**5.291.009.407,42**
TOTAL, INVERSIÓN		Nación	176.248.855.437,01
		Municipio	118.927.100.652,19
		BIRF	53.034.587.861,14
		Otros Aportes-Redes	0,00
		Otros Aportes-Multas	0
		Total	**348.210.543.950,34**

GRUPO 8915: DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Crédito)

Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el grupo 83 Deudoras de Control. El saldo con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$536.643.425.673,70,** discriminada de la siguiente manera:

- Cuenta **891516** por valor de **$ 188.432.881.723,36**, corresponde a la contrapartida de la cuenta **8355** "Ejecución Proyectos de Inversión.

- Cuenta **891590** refleja los movimientos de la contrapartida de la cuenta **839090** "Otras cuentas deudoras de Control" correspondiente al registro de la parte de "Inversión - Distribución del Presupuesto" del Estado de inversión Acumulada. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$348.210.543.950,34.**

9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

En esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos, compromisos, circunstancias o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

93 ACREEDORAS DE CONTROL

9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS

930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

FIDUCIARIA DE DAVIVIENDA S.A.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

En esta cuenta se manejan los recursos del Proyecto SETP Transfederal S.A.S que la entidad maneja a través de un Encargo Fiduciario, según Contrato suscrito mediante el cual se consignan los dineros recibidos por la Nación, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor, para financiar las obras de infraestructura. La Fiduciaria se encarga de cancelar a los contratistas las actas de avance de obra, interventorías, anticipos y pagos por otros conceptos. En este periodo la responsabilidad de practicar y pagar las retenciones en la fuente es de la Fiduciaria Davivienda S.A, el saldo a diciembre 31 de 2023 es de **$ 12.631.075.236,39,** de los cuales **$ 8.766.666.224,15** corresponden a la Fuente de financiación Nación, **$3.799.908.426,04,** Fuente de Financiación Municipio, **$64.410.167,23** corresponden a otros aportes ente gestor 0670, y **$90.418,97** corresponden a multas en contratos a favor del SETP incluidos los rendimientos financieros generados el cual están en la fuente otros aportes ente gestor 0970.

9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan derechos para la empresa y que por la destinación de los recursos son del proyecto con corte a diciembre 31 de 2023 se refleja un saldo de **$ 201.063.956.960,05,** distribuido en las siguientes subcuentas:

935501 PASIVOS

935501047002 RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por la nación que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte diciembre 31 de 2023 es de **$10.184.448,79.**

935501107003 RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$4.473.837,91.**

935501107006 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva como recursos adicionales al convenio de cofinanciación que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$ 71.061,56.**

935501107009 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva como otros aportes, correspondiente a multas, venta de terrenos, derechos de entrada contratos de concesión y desarrollos que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$ 259,08.**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

935502 INGRESOS

La parte correspondiente a las Entradas de Efectivo en el informe Estado de Inversión Acumulada se registra cuando ciertamente ingresan los recursos económicos por fuente de financiación a las cuentas del encargo fiduciario o las cuentas autorizadas del proyecto.

Es importante resaltar que en esta cuenta se registran los rendimientos del crédito toda vez que son recursos para reinvertir en el proyecto por tal motivo se reflejan en el Estado de Inversión Acumulada en la parte de entradas. El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$ 201.049.227.352,61.**

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

939011 CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCION

En esta cuenta se registra el saldo de los contratos pendientes de ejecución. La dinámica de esta cuenta se encuentra establecida en el Manual financiero, debitando la cuenta 99159000 Desarrollo de los SETP acreditando la cuenta 93901100. El saldo de los contratos pendientes por ejecutar asciende a **$17.577.261.323,36. Ver anexo N° 2 Conciliación RP VS Cuenta 939011.**

NACION $ 14.191.946.610,36

MUNICIPIO $ 3.339.763.573

RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR - REDES $ 45.551.140,00

Centro de Costos	Saldo RP
Municipio - 0370	3.339.763.573,00
Nación Otras Fuentes - 0270	14.191.946.610,36
Otros Aportes del Ente Gestor - 0670	45.551.140,00
SUB-TOTAL	**17.577.261.323,36**
Viaticos - 0370	0,00
TOTAL	**17.577.261.323,36**

939013 CONVENIOS

Con el fin de dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en el Manual Financiero y con el fin de llevar el control de los saldos pendientes de recibir por concepto de los dineros recibidos por la Nación, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor suscritos, se maneja la cuenta 93901300. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2023 es de **$ 151.039.416.819,27**

En el presente trimestre se actualizaron los saldos de la cuenta 939013 de acuerdo con el POAI a diciembre 2023 y la proyección de los aportes de acuerdo con el otrosí N° 4 al convenio de cofinanciación.

SALDO POR DESEMBOLSAR HASTA LA VIGENCIA 2025	Otros aportes	13.168.734,00
	Municipio	30.229.653.134,18
	Nación	120.796.594.951,09

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	Nación BIRF	0,00
	Total	**151.039.416.819,27**

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

991510 EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2023 asciende a **$12.631.075.236,39**, correspondiente a la contrapartida de la cuenta **930803** Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios.

991522 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2023 asciende a **$ 201.063.956.960,05,** correspondiente a la contrapartida de la cuenta **935501** Pasivos y **935502** Ingresos del proyecto que se reciben por las diferentes fuentes de financiación.

991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2023 asciende a $**168.616.678.142,63,** correspondiente a la contrapartida de la cuenta **939011** Contratos pendientes de ejecución y **939013** Ejecución Convenios de Cofinanciación.

CONCILIACIONES BANCARIAS

De acuerdo con lo reflejado en el informe de Estado de Inversión Acumulada en la hoja N° 3 y 4 existe una diferencia la cual se relaciona así:

HOJA 3.

CONCILIACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

CONCILIACIÓN	PROYECTO					TOTAL
	NACIÓN		MUNICIPIO	OTROS APORTES		
	Otras Ftes	BIRF		Redes	Multas	
Saldo Ente Gestor	8.766.666	0	3.799.908	64.410	90	12.631.074
Saldo Fideicomiso	8.766.690	0	3.799.877	64.413	93	12.631.073
DIFERENCIA	**-24**	**0**	**31**	**-3**	**-3**	**1**

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

CONCILIACIÓN	PROYECTO					TOTAL
	NACIÓN		MUNICIPIO	OTROS APORTES		
	Otras Ftes	BIRF		Redes	Multas	
(+) Cheque Pendientes de Pago	0	0	0	0	0	0
(+) Nota Debito Ente Gestor – Gastos Bancarios	24	0	0	3	3	30
(-) Nota Debito – Gastos Bancarios	0	0	-31	0	0	-31
(-) Retención en la Fuente Terceros	0	0	0	0	0	0
DIFERENCIA	**24**	**0**	**-31**	**3**	**3**	**-1**

Diciembre 2023 *Cifras en miles de pesos*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

GASTOS FINANCIEROS NACION 0270 $24: Representan los Gastos financieros reintegrados por mayor valor por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2023.

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR MUNICIPIO 0370 - $31: Representan los Gastos financieros por pagar por valor de **$31.831,49** por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2023, **$2,06** corresponden a valores pagados de más a contratistas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y **$3,48** Representan los valores pagados de menos por parte de la fiduciaria Davivienda S.A a contratistas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR OTROS APORTES REDES 0670 $3: Representan los Gastos financieros reintegrados por mayor valor por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2023.

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR OTROS APORTES MULTAS 0970 $3: Representan los Gastos financieros reintegrados por mayor valor por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2023.

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA HOJA 4 DEL E.I.A

De acuerdo a la hoja 4 del Estado de Inversión acumulado las diferencias a 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 3

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PROYECTOS: SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO
EMPRESTITOS BIRF – CAF – BID
ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

NOMBRE ENTE EJECUTOR: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP TRANSFEDERAL S.A.S
CIUDAD: NEIVA
PERIODO INFORMADO: DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

Página 4
Expresado en miles $ Col

CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (F)

CONCEPTOS	RECURSOS NACION FRENTE BIRF 8085-CO	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITOS	RECURSOS NACION FRENTE 910	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Comercial	Otros Recursos Ent. Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.	RECURSOS NACION FRENTE CAF	RECURSOS NACION FRENTE 910 AMBIENTAL	TITULARIDAD DE Y OTROS RECAUDOS FIDUCIARIOS	TOTAL
Centro de Costos	1170	0270	0370	0470	0570	0670	0970	0870	1370	1470	
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I.A (= Fila G)	0	8.756.482	3.795.432	0	0	64.340	90	0	0	0	12.616.344
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES ENTE EJECUTOR (= Fila L)	0	8.766.666	3.799.908	0	0	64.410	90	0	0	0	12.631.074
DIFERENCIA	0	-10.184	-4.476	0	0	-70	0	0	0	0	-14.730

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

1. Cuentas por Pagar:

CONCEPTO	Ctas. Contable											
Préstamos Banca Comercial	23140100											0
Cuentas por Pagar	93550102											0
Intereses por pagar - Préstamos Banca Comercial	93550103											0
Rendimientos por Pagar - Nación	93550104		10.184									10.184
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	93550106											0
Títulos Judiciales por Expropiación de Predios	93550107											0
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	93550108											0
Rendimientos por Pagar - Otros Aportes	93550110			4.476			70					4.546
Otros Recaudos por Multas	93550111											0
IVA Retenido por Consignar	24362500											0
Retención Fuente Contratos de Obra	24362600											0
Retención ICA	24362700											0
Otras Retenciones	24369000											0
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	24550700											0
Recaudo a Favor de Terceros	24079000											0
Diferencia Explicada Cuentas por Pagar		0	10.184	4.476	0	0	70	0	0	0	0	14.730

2. Cuentas por

concepto	Ctas. Contable											
Ingresos No Tributarios Multas	8,4E+07											0
Cuenta por cobrar por desvalorizaciones	8,4E+07											0
Cuentas por Cobrar por Convenios Adicionales	8,4E+07											0
Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA	0	10.184	4.476	0	0	70	0	0	0	0	14.730

Nota: No se puede agregar ninguna subcuenta o concepto en la explicación de la diferencia, sin autorización de la UMUS

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA HOJA 4 DEL E.I.A (valores expresados en miles de pesos)

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

NACIÓN (0270) $ 10.184.

$ 10.184 RENDIMIENTOS POR PAGAR Representan los rendimientos por pagar generados por las cuentas de la fiduciaria, los cuales son consignados al mes siguiente.

MUNICIPIO (0370) $ 4.476

$ 4.476 RENDIMIENTOS POR PAGAR Representan los rendimientos por pagar generados por las cuentas de la fiduciaria, los cuales son consignadas al mes siguiente.

OTROS APORTES (0670) $ 70.

$ 70 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Representan los rendimientos financieros por pagar generados por las cuentas de la fiduciaria, los cuales son consignados al mes siguiente.

Por otro lado, una vez finalizado el cuarto trimestre del 2023, se continua realizando el proceso de liquidación de las fuentes de financiación establecidas en convenio de cofinanciación suscrito ente el Municipio de Neiva, la Nación y el Ente Gestor el 07 de noviembre del 2013, con el fin de verificar la información histórica de los aportes, así como también los pagos históricos y los rendimientos generados, los cuales fueron confrontados con los reportes de fiduciaria Davivienda S.A. entidad encargada de la administración de los recursos del Ente Gestor. En ese orden de ideas, se detalla a continuación la liquidación de las fuentes de financiación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Fuente financiación Recursos Nación BIRF

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2023 FUENTE DE FINANCIACIÓN BIRF		
APORTES BIRF		**53.436.262**
Aportes vigencia 2017	*21.902.000*	
Aportes vigencia 2018	*18.663.495*	
Aportes vigencia 2019	*12.870.767*	
PAGOS BIRF		**53.034.588**
Obra Fase IV	*14.202.742*	
Obra Fase V	*14.148.285*	
Obra Fase VI	*8.807.796*	
Obra Fase VII	*13.416.534*	
Interventoría Fase IV	*1.298.909*	
Interventoría Fase V	*1.160.321*	
SALDO NO EJECUTADO		**401.674**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*1.574*	
Gasto Bancario	*0*	
SALDO EXTRACTO		**403.248**
Cifras en miles de pesos		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Recursos Otros Aportes Ente Gestor – Redes

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2023 FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS APORTES ENTE GESTOR REDES DE SERVICIO PÚBLICO		
APORTES OAEG		**3.522.688**
Aportes vigencia 2017	*1.500.000*	
Aportes vigencia 2018	*1.810.910*	
Aportes vigencia 2019	*12.977*	
Aportes vigencia 2022	*- 1.199*	
Aportes vigencia 2023	*200.000*	
PAGOS OAEG		**3.458.349**
Pagos vigencia 2018	*1.499.989*	
Pagos vigencia 2019	*1.600.974*	
Pagos vigencia 2020	*157.385*	
Pagos vigencia 2023	*200.000*	
SALDO POR GIRAR		**64.339**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*71*	
Gasto Bancario	*-*	
SALDO EXTRACTO		**64.410**
SALDO ENTE GESTOR		**64.410**
DIFERENCIA		**-**
Cifras en miles de pesos		

Fuente de Financiación Recursos Otros Aportes Ente Gestor – Multas

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2023 FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS APORTES ENTE GESTOR MULTAS Y OTROS APORTE ADICIONALES		
APORTES OAEG		**311.777**
Aportes vigencia 2019	*115.277*	
Aportes vigencia 2022	*200.000*	
Aportes vigencia 2023	*- 3.500*	
PAGOS OAEG		**312.404**
Pagos vigencia 2021	*111.884*	
Pagos vigencia 2022	*200.520*	
SALDO POR GIRAR		**- 626**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver y/o reinvertir	*716*	
Gasto Bancario	*-*	
SALDO EXTRACTO		**90**
SALDO ENTE GESTOR		**90**
DIFERENCIA		**-**
Cifras en miles de pesos		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Recursos Nación Otras Fuentes

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2023 FUENTE DE FINANCIACIÓN NACIÓN OTRAS FUENTES		
APORTES NACIÓN OTRAS FUENTES		55.452.260
Aportes vigencia 2015	*2.250.000*	
Aportes vigencia 2016	*8.046.000*	
Aportes vigencia 2017	*19.500.000*	
Aportes vigencia 2021	*17.017.275*	
Aportes vigencia 2022	*6.440.030*	
Aportes vigencia 2023	*2.198.955*	
PAGOS NACIÓN OTRAS FUENTES		46.695.779
Pagos vigencia 2015	*2.249.979*	
Pagos vigencia 2016	*4.634.562*	
Pagos vigencia 2017	*16.755.319*	
Pagos vigencia 2018	*6.100.334*	
Pagos vigencia 2019	*39.999*	
Pagos vigencia 2021	*2.644.352*	
Pagos vigencia 2022	*8.857.240*	
Pagos vigencia 2023	*5.413.993*	
SALDO POR GIRAR		8.756.482
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*10.184*	
SALDO EXTRACTO		8.766.666
SALDO ENTE GESTOR		8.766.666
DIFERENCIA		-
Cifras en miles de pesos		

Fuente de Financiación Recursos Municipio – SGP

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2023 FUENTE DE FINANCIACIÓN MUNICIPIO RECURSOS PROIOS - SGP		
APORTES MUNICIPIO		61.727.198
Aportes vigencia 2014	*14.139.284*	
Aportes vigencia 2015	*2.043.899*	
Aportes vigencia 2017	*9.000.000*	
Aportes vigencia 2018	*11.657.960*	
Aportes vigencia 2019	*10.064.672*	
Aportes vigencia 2020	*5.849.383*	
Aportes vigencia 2021	*3.172.000*	
Aportes vigencia 2022	*3.000.000*	
Aportes vigencia 2023	*2.800.000*	
PAGOS MUNICIPIO		58.945.390
Pagos vigencia 2014	*83.028*	
Pagos vigencia 2015	*3.602.311*	
Pagos vigencia 2016	*3.680.964*	
Pagos vigencia 2017	*9.653.491*	
Pagos vigencia 2018	*18.129.481*	
Pagos vigencia 2019	*12.667.503*	
Pagos vigencia 2020	*3.411.431*	
Pagos vigencia 2021	*2.831.028*	
Pagos vigencia 2022	*2.526.307*	
Pagos vigencia 2023	*2.359.844*	
SALDO POR GIRAR Y/O COMPROMETER		2.781.808
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*4.473*	
Redes de Servicio Público	*1.011.806*	
SALDO EXTRACTO		3.798.087
SALDO ENTE GESTOR		3.798.087
DIFERENCIA		-
Cifras en miles de pesos		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Recursos Municipio – Usco

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2023 FUENTE DE FINANCIACIÓN MUNICIPIO RECURSOS USCO		
APORTES MUNICIPIO - USCO		**27.000.000**
Aportes vigencia 2018	*3.000.000*	
Aportes vigencia 2019	*24.000.000*	
PAGOS MUNICIPIO - USCO		**25.986.373**
Pagos vigencia 2018	*2.998.972*	
Pagos vigencia 2019	*20.633.793*	
Pagos vigencia 2020	*2.353.609*	
SALDO POR GIRAR		**1.013.627**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*0*	
Redes de Servicio Público	*1.011.806*	
SALDO EXTRACTO		**1.822**
SALDO ENTE GESTOR		**1.822**
DIFERENCIA		**-**
Cifras en miles de pesos		

Tecnologías de la información:

Con respecto a las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. dispuso para el cliente interno y externo de la entidad la información de manera digital a través de la Página Web. Por otro lado, brindó el respaldo tecnológico actualizando las licencias de Software y contratando el arrendamiento de los servidores en la nube para salvaguardar la información financiera de la entidad.

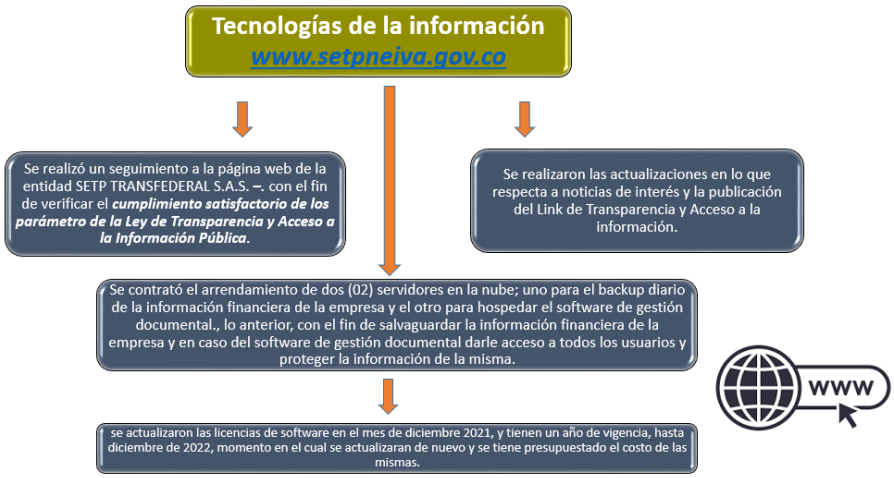



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8.3.2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

8.3.2.1 GENERALIDADES

Con corte a 31 de diciembre del 2023, se celebraron ciento treinta y tres (133) contratos dentro de los procesos de selección de contratistas en sus diferentes modalidades, así:

Modalidad de selección	No. Procesos Adjudicados	No. Procesos Terminados anormalmente	No. Procesos en curso	No. Total, de procesos
Directa	115	N.A.	0	115
Mínima cuantía	11	4	0	15
Subasta inversa	1	N.A.	0	1
Menor cuantía	1	N.A.	0	1
Concurso de méritos	4	2	0	6
Licitación pública	1	N.A.	0	1
TOTAL	**133**	**6**	**0**	**139**

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2023	
MODALIDAD	**DETALLE**
Mínima Cuantía: (11)	• Suministro de papelería y útiles de oficina. • Avaluó predio denominado lote patio taller norte. • Prestación de servicios de dos servidores en la nube. • Prestación del servicio de hosting. • Prestación del servicio integral de aseo y cafetería. • Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del SETP. • Servicio de internet (ISP). • Mantenimiento de equipos de cómputo. • Adquisición y mantenimiento de aires del SETP. • Servicios de alimentación actividades SETP. • Renovación y adquisición de licencias
Contratación Directa: (115)	• Ciento quince (115) contratos de prestaciones de Servicios de Apoyo A La Gestión y Prestación de Servicios Profesionales, dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y a las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Concurso de méritos: (4)	• Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de terminales de ruta y paraderos en el marco

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva. • Realizar el ajuste del anexo técnico para la implementación del componente tecnológico, de acuerdo con los requerimientos previstos por la normativa nacional para la operación del sistema estratégico de transporte público de Neiva. • Realización del ajuste y actualización del modelo financiero y sus escenarios para la para la implementación y operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva. • Realización del ajuste y actualización del modelo técnico operacional de detalle para la implementación y operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.
Licitación pública: (1)	• Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de terminales de ruta y paraderos en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva.
Selección Abreviada (2)	• Adquisición de pólizas de seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad o que estén bajo su responsabilidad y custodia; póliza de manejo para el gerente del sistema estratégico de transporte público de Neiva Setp Transfederal S.A.S. y adquisición de póliza de responsabilidad civil para servidores públicos (funcionarios y miembros de la junta directiva) del sistema estratégico de transporte público de Neiva S.A.S - Setp Transfederal S.A.S. • Prestación de servicios de operador y apoyo logístico a todo costo requeridos en la organización, realización, montaje, implementación y puesta en marcha de la pre-operación -transición- del sistema estratégico de transporte público de Neiva- Setp -Transfederal S.A.S. migo - movilidad inteligente de gestión opita.

➢ **Contratos y/o convenios de vigencias anteriores, actualmente vigentes:**

CONTRATOS DE OTRAS VIGENCIAS QUE CONTINUARON VIGENTES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023					
No. CONTRATO	**TIPO DE CONTRATO**	**OBJETO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA INICIO**	**ESTADO ACTUAL** **OBSERVACIONES**
150 de 2020	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE	23/12/2020	25/02/2021	EN EJECUCIÓN

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

		(SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.			
011 de 2021	OBRA	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	2021/01/28	2021/02/25	EN EJECUCIÓN
161 de 2021	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	2021/06/25	2021/06/28	TERMINADO
186 de 2021	OBRA	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	2021/07/15	2021/08/20	RECIBIDO
258 DE 2021	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	28/12/2021	10/02/2022	SUPENDIDO
100 DE 2022	CONSULTORÍA	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCION DE SENTIDO UNICO NORTESUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA	06/05/2022	02/08/2022	SUSPENDIDO

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

		ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.			
103 DE 2022	INTERVENTORÍA	NTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCION DE SENTIDO UNICO NORTESUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	21/06/2022	02/08/2022	SUSPENDIDO
118 DE 2022	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	29/08/2022	01/09/2022	SUSPENDIDO

- **Procesos Judiciales:**

Durante el cuarto trimestre del año 2023, y a través de la Asesoría Jurídica Externa, se está adelantando la representación judicial en los siguientes procesos:

No.	Radicación	Demandante	Objeto De La Demanda	Despacho Judicial	Clase Proceso	Estado De Proceso	Monto De La Pretensión Y Provisión Aproximada	Evaluación del Litigio
DEMANDAS EN CONTRA DEL SEPT TRANSFEDERAL S.A.S.								

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

1	41001233300020220017700.	UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA	SE DECLARE QUE EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP, ROMPIO EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 064 DEL 2015, CUYO OBJETIVO FUE "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOS VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO".	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	16-03-2023: AL DESPACHO PARA FIJAR FECHA DE AUDIENCIA INICIAL.	3.500.885.338,00	RIESGO MÍNIMO - 20%
2	41001333300820190022600.	CONSORCIO NEIVA 2015	QUE SE DECLARE A LA ENTIDAD DEMANDADA, ROMPIÓ EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 52 CUYO OBJETO ERA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FASE I AFECTANDO LOS INTERESES DEL CONTRATISTA Y CAUSÁNDOLE COMO CONSECUENCIA DETRIMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	30-08-2021: SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL JUEZ PENDIENTE DE PROFERIR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	1.729.972.097,00	RIESGO MÍNIMO - 20%
3	41001333300120220047200.	SOCIEDAD HOTELERA FALLA	QUE SE DECLARE PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE TODOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA SOCIEDAD HOTELERA FALLA VELÁSQUEZ S.A.S. COMO PERSONA JURÍDICA DIRECTAMENTE AFECTADA A LA COMUNIDAD DE BIENES CONFORMADA POR MARIETA FALLA VELÁSQUEZ ANDRÉS HERNANDO FALLA VELÁSQUEZ KATERINE FALLA VELÁSQUEZ SERGIO LUIS FALLA VELÁSQUEZ COMO PROPIETARIOS DEL LOTE UNO C 1C Y A MARIETA FALLA VELÁSQUEZ INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INTERCAMBIADOR VIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL	REPARACION DIRECTA	27-10-2023: AL DESPACHO PARA SENTENCIA ANTICIPADA	1.167.706.881,00	RIESGO MEDIO - 50% POR TRATARSE DE UNA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER OBJETIVO

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

4	41001333300420220008300.	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017 - FRESADO ASFALTO ACUMULADO	SE DECLARE LA CONFIGURACIÓN DE LA RUPTURA DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 122 DE 20 12 2017 POR EL INCUMPLIMIENTO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL COSTO DE LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 6.004 DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO DENOMINADO FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO FINAL DE DESECHOS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA EN LA CANTIDAD DE 8.364.97 M2 DE FRESADO Y RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA CUYO COSTO ASCENDIÓ A 94.565.986 COMO LA NULIDAD PARCIAL DE DICHO CONTRATO DEBIDO A LA NO LIQUIDACION DE LOS SOBRE COSTOS CAUSADOS AL CONSORCIO VIAS DE NEIVA FASE V 2017	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	22-11-2023: SE RESUELVAN LO DE NOTIFICACIÓN A LA OTRA ENTIDAD DEMANDADA.	423.440.986,00	RIESGO MÍNIMO - 20%
5	41001333300120190014300.	GENTIL PARRA PEÑA	QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS COLECTIVOS A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO CONTEMPLADOS EN LOS LITERALES B Y E DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 472 DE 1998	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL	ACCIÓN POPULAR	16-11-2023: TRASLADO DE EXCEPCIONES DE LOS DEMÁS SUJETOS PROCESALES.	0	RIESGO MÍNIMO - 20%
6	41001233300020220004600.	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO CONTRA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. POR UN VALOR TOTAL DE DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREITA Y OCHO PESOS 2.992.904.138 QUE CORRESPONDE AL MONTO POR EL CUAL FUERON EMITIDAS LAS FACTURAS 103 Y 104	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	ACCION DE CUMPLIMIENTO	24-11-2023: ENVIO AL CONSEJO DE ESTADO- REPARTO EN SECCIÓN TERCERA. 13/12/23: CORRE TRASLADO INCIDENTE DE DESEMBARGO SOBR PREDIO EMBARGADO	2.992.904.138,00	RIESGO MÍNIMO - 20%
7	41001333300920180040300.	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Y OTRO (CONSORCIO INTERFASE VI)	NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO. 077 DE 2018 DEL 13 DE JUNIO DE 2018 LA CUAL SE ADJUDICA EL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO. 001 DE 2018 Y RETROTRAERSE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN NO. 077 DEL 13 DE JUNIO DE 2018 Y EN CONSECUENCIA SE PAGUEN LOS TODOS LOS PERJUICIOS CAUSADOS	JUZGADO NOVENO ADMINITRATIVO ORAL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	06-02-2023:SE ENCUENTRA AL DESPACHO PENDIENTE DE PROFERIR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	211.597.236,00	RIESGO MÍNIMO - 20%

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8	41001333300420200023100-41001333300420200023101	RICARDO MEDINA MUÑOZ	SE DECLARE QUE LA ENTIDAD ACCIONADA ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS PRODUCTO DE UN ACCIDENTE.	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	31-11-2023: RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN DECRETO DE PRUEBAS-NIEGA INSPECCIÓN JUDICIAL	134.303.859,00	RIESGO MÍNIMO - 20%
9	41001333300820220029200.	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	SE DECLARE QUE SE CONFIGURÓ LA RUPTURA DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 120 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP-TRANSFEDERAL S.A.S. SETP-TRANSFEDERAL S.A.S. Y EL CONSORCIO VÍAS NEIVA 2017 CUYO OBJETO ERA LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE VÍAS RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA SIC POR CUENTA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATANTE EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO QUE OCASIONÓ POR UN LADO SOBRE COSTOS POR REPARACIÓN DE DAÑOS Y TRASLADO DE REDES HIDRÁULICAS Y DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL UBICADAS A PROFUNDIDAD MENOR A LA REGLAMENTARIA Y POR OTRO LADO INTERRUPCIONES A LA ACTIVIDAD DEL CONSORCIO POR OBRAS DESPLEGADAS EN LOS MISMOS FRENTES DE OBRA Y EN ÉPOCA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120 DE 2017 POR PARTE DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	03-10-2023: SE ALLEGA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA.	180.862.669,00	RIESGO MÍNIMO - 20%

DEMANDAS ADELANTADAS POR EL SEPT TRANSFEDERAL S.A.S.								
No	**Radicación**	**Demandante**	**Objeto De La Demanda**	**Despacho Judicial**	**Clase Proceso**	**Estado De Proceso**	**Monto De La Pretensión Y Provisión Aproximada**	**Evaluación del Litigio**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

1	41001233300020230029900.	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -- SETP	DECLARE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DENTRO DEL CONVENIO NO. 092 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA",CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2015, POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD PARTICIPANTE SEÑALADA Y COMO CONSECUENCIA LA NO LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DENTRO DEL TÉRMINO PACTADO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	27-11-2023: SE PRESENTA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA.	3.000.000.000,00	PROBABILIDAD ALTA - 80% (POR TRATARSE DE UNA OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE DERIVADA DE UN ACTO JURIDICO)

- **Auditorías:**

Al cuarto trimestre, se ha dado instalación y ejecución a las siguientes auditorias:

- Auditoría Financiera y de Gestión, correspondiente a la vigencia 2022 por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, la cual culmino con la aprobación del plan de mejoramiento del 15 de agosto de 2023.

- Actuación Especial de Fiscalización MinTransporte – SETP Neiva vigencias 2021, 2022 y 1er. Semestre de 2023 según Oficio 2023EE0156364 del 14 de septiembre del 2023 – por parte de la Contraloría General de la República, con informe final de auditoría del 18 de diciembre de 2023, la cual culminó con la presentación del respectivo Plan de Mejoramiento ante la plataforma Sireci de la Contraloría General de la República el 12 de enero de 2024.

- Actuación Especial de Fiscalización D024 DE 2023 por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, la cual culminó sin observaciones ni acciones de mejora para implementar.

- Actuación Especial de Fiscalización Controversias Judiciales vigencia 2022 por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, la cual culmino con el informe definitivo de fecha 22 de septiembre de 2023, sin acciones de mejora para implementar.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **Informes SIA:**

  - **SIA MISIONAL:**
    El día 20 de febrero de 2023 se brindó apoyo en la rendición del informe SIA CONTRALORÍAS correspondiente a los formatos del Área de Gestión jurídica y contratación: Contratación, evaluación controversias judiciales jurídica, acciones de repetición y convenios interadministrativos

  - **SIA OBSERVA:**
    Se realizó la rendición de los contratos suscritos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a la plataforma del SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Neiva de los contratos celebrados y con inicio de los meses de enero y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

- **Informes Junta Directiva:**
  Se elaboró el Informe Jurídico Contractual, presentado en la Junta Directiva Ordinaria N°048 del 27 de marzo del 2023 junto con sus notas explicativas sobre los avances de la gestión jurídica y contractual a cohorte 30 de marzo de 2023.

- **Plan de Acción:**
  Se presentó informe de avance de las acciones a cargo del área jurídica y de contratación, consignadas en el plan de acción de la vigencia 2023 durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, el cual fue remitido al Área de Planificación Estratégica en el mes de abril, julio, octubre y diciembre de 2023.

- **Informe anual de gestión**
  Se brindó apoyo en la proyección del informe anual de gestión, correspondiente al área de Gestión Jurídica y de Contratación, para ser presentado en Junta Directiva Ordinaria desarrollada el 27 de marzo del 2023.

8.3.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Se ha venido desarrollando actividades de gran importancia con el objetivo de promover la difusión de los logros y avances alcanzados por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva durante su proceso de implementación, con el propósito de destacarlo como un proyecto innovador que proporcionará soluciones efectivas a los desafíos de movilidad que enfrentan los residentes. Además, se iniciará la transición hacia la marca que representará a este sistema. De acuerdo con lo anterior el área de comunicaciones presenta las siguientes actividades relevantes:

Actividades en Comunicación Externa

- **Estrategias ejecutadas**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Desde el área de Comunicaciones, se generaron boletines de prensa, videos e infografías destinados a su difusión a través de medios de comunicación y plataformas de redes sociales. El objetivo principal es mantener informada a la ciudadanía sobre los progresos de la entidad.

Para lograrlo, se llevó a cabo la recopilación de información necesaria para la creación de estos materiales de comunicación, además de cubrir ampliamente las diversas actividades realizadas, enfocándonos especialmente en aquellas relacionadas con el inicio de operaciones del sistema.

- **Comunicados de prensa**
  Durante los dos meses que van del trimestre se han realizado y publicado seis boletines de prensa, centrados en los siguientes temas: avance instalación de paraderos, nombre del SETP para Neiva: Migo, inicio de la transición hacia el SETP, concurso de movilidad sostenible: Muévete Conmigo.

  Cabe resaltar que cada uno de estos boletines de prensa fue enviado a medios de comunicación y periodistas de la región a través de la base de datos de la Alcaldía de Neiva.

- ***Videos institucionales***
  Hasta la fecha se ha realizado la producción de 22 videos, los cuales hacen referencia a las obras adelantadas por la entidad, paraderos, terminales de ruta, patio taller y transición.

- **Publicaciones en redes sociales**
  En lo que va del trimestre se han realizado 160 publicaciones en las redes sociales de la entidad, Facebook, Instagram y Twitter.

- ***Atención a medios de comunicación***
  Se brindó apoyo a las solicitudes de los periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región, interesados en ampliar la información sobre la implementación del SETP en la ciudad, el proyecto de paraderos y terminales de ruta.

Actividades de Comunicación Interna

- ***Grupo de información general***
  La entidad cuenta con un grupo general de WhatsApp en el que participan todos los colaboradores vinculados a la entidad. Por este medio se brinda información general de actividades programadas y circulares; así mismo, se comparten cápsulas con información de interés, especialmente el relacionado con el avance de obras o actividades programadas.

Notas

Para la vigencia 2024 se tienen programadas diferentes actividades que permiten seguir junto a la comunidad para brindar una mejor información sobre el proyecto SETP y seguir mitigando la desinformación. Se ejecutará el programa de cultura ciudadana con las diferentes estrategias que fomentan las buenas conductas en los diferentes entornos sociales especialmente en el transporte público colectivo, el buen uso y cuidado de este, como el de su infraestructura (paraderos y terminales de ruta), dirigidos inicialmente con los presidentes de junta y ediles de la ciudad, siendo ellos actores sociales importantes para emitir la información a su comunidad. Los conductores del transporte público también harán parte de estas actividades del programa en temas especiales relacionados a su labor, para que durante la pre-operación y operación del sistema se refleje un

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

cambio en el servicio y atención al usuario. El área social deberá tener un acercamiento en las mesas de trabajo con las empresas operadoras del sistema, para ir de la mano en la ejecución de las actividades previstas para fortalecer el buen entorno laboral del conductor, el servicio y atención al usuario.

8.4 PROCESO DE EVALUACIÓN

8.4.1 GESTIÓN CONTROL INTERNO

8.4.1.1 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este último, aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad. La estructura propuesta es diferencial para aquellas entidades de municipios de 6a categoría (Personerías y Concejos Municipales) que son entidades con 1 y hasta 5 servidores en sus plantas de personal. Estas entidades deben tener en cuenta que de acuerdo con el parágrafo del artículo ARTÍCULO 2.2.22.2.1. del Decreto 1499 de 2017, las políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, deben ser aplicadas acorde con las normas que las regulan, por lo que deben analizar dichas políticas e implementarlas en armonía con el MECI.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a través de la Resolución 076 del 29 de julio del 2019 ***"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"*** y con la Resolución 077 del 29 de julio del 2019 **"Por medio del cual se crea el Comité institucional de Gestión y desempeño".**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

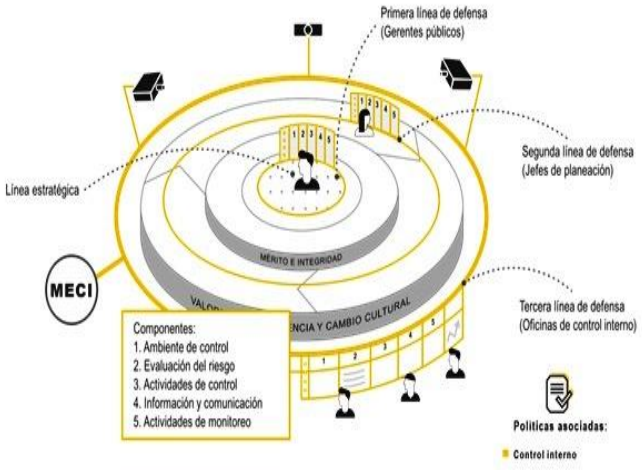

De acuerdo a lo anterior, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. durante el segundo semestre de 2023, realizó el diligenciamiento de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno del primer Semestre de 2023 generando los siguientes resultados:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Nombre de la Entidad:	SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	90%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad ha logrado avances significativos en la articulación del Sistema de Control Interno con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ha llevado a implementar acciones orientadas a interiorizar el Código de Integridad, el reconocimiento del talento humano como componente estratégico, los procesos de planeación y evaluación a la gestión institucional, la importancia de la adopción de políticas institucionales en temas de, gobierno digital. Igualmente, se cuenta con logros en la adopción, documentación y actualización de políticas, procesos, procedimientos y otros documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, desde la oficina de Control Interno se seguirá apoyando al mantenimiento de los diferentes procesos llevados en el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha evidenciado que el Sistema de Control Interno, en la Entidad, ha permitido la implementación de herramientas de control y seguimiento que a su vez han apuntado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y al mejoramiento continuo institucional. No obstante a esto, la Entidad si cuenta con oportunidades de mejora que permitirán mejorar la madurez del Sistema de Control Interno, y consigo, el grado de cumplimiento a los requerimientos de los diferentes grupos de interés y de valor.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene establecido las líneas de defensa mediante el seguimiento y evaluación a los planes implementados y se realiza las respectivas recomendaciones en los comités de control interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	La Entidad cuenta con políticas, directrices y otro información documentada, así como de herramientas de control como la adopción del código de integridad, manual de funciones, organigrama y plataforma estratégica institucional, que permiten tener claridad sobre algunos aspectos mínimos para la operación de la Entidad a través de su modelo de gestión. Asimismo, ha adoptado herramientas contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que permiten guiar a los colaboradores de la Entidad al cumplimiento de metas y objetivos. Se evidencia que estas herramientas deben ser socializadas con todos los contratistas y funcionarios, además, de actualizadas cuando se requiera.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	Actualmenteel SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con matrices de riesgos por procesos internos y del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva, donde se identificaron riesgos y establecieron controles para su tratamiento, no obstante, se recomienda fortalecer las actividades de apropiación de la cultura de gestión del riesgo, así como los seguimiento por parte de planeación institucional y ejecutores de operaciones.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	La entidad cuenta con procedimientos documentados, manuales y guías, además, de planes estratégicos e institucionales que propenden por el desarrollo de las estrategias y directrices establecidas por la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Se recomienda el fortalecimiento de la aplicación de controles a los diferentes eventos de riesgo identificados, así como el diseño de acciones de mejora a partir de los resultados de actividades de evaluación y seguimiento.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con canales para la comunicación con grupos de interés internos y externos, sin embargo, se recomienda la documentación de responsabilidades frente a la comunicación interna y externa a través de políticas y procedimientos internos, o políticas de la dirección. Además, de la evaluación de necesidad para la creación e implementación de herramientas que mejoren la comunicación.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Se evidenció que la Entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría basada en riesgos, el cual fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, además, ejecuta actividades de auditoría interna y seguimientos a través de la oficina asesora de control interno. Por su parte, se evidenció que se suscriben planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, a los cuales se les realiza seguimiento a su avance y cumplimiento. Se recomienda fortalecer la cultura del mejoramiento continuo, promoviendo la documentación de acciones de mejora por autogestión, formulación de indicadores de gestión por procesos o áreas e identificación de puntos críticos en los procesos.

ANALISIS DEL RESULTADO: Para realizar el análisis de la evaluación es importante conocer las siguientes consideraciones:

Clasificación	Observaciones del Control

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Mantenimiento del Control	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

Teniendo en cuenta el anterior cuadro podemos analizar que el **SETP TRANSFEDERAL SAS,** cumple dentro del rango verde mantenimiento de control con un 90% de cumplimiento, que significa que existe el requerimiento, pero se requieren actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. De esto se puede concluir que la entidad en lo referente al sistema de control interno viene cumpliendo con lo establecido en la normatividad y sus respectivos seguimientos.

Es importante aclarar, que en este se realizó la evaluación del primer semestre de 2023, y se realizó la socialización a cada una de las áreas y la gerencia para su posterior publicación en la página web de la entidad.

8.4.1.2 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Teniendo en cuenta que este procedimiento está orientado y regulado por la Contaduría General de la Nación, donde orienta a los responsables de la información financiera para realizar la evaluación de los controles que existentes en las operaciones del área contable, con el propósito de garantizar la calidad de la información producida como insumo para la toma de decisiones y reporte a los entes de control.

Según lo anterior, el SETP TRANSFEDERAL SAS, realizó la Evaluación de Control Interno Contable, teniendo en cuenta el cuestionario formulado por la CGN, donde una vez diligenciado arrojó la siguiente calificación:

PERÍODO EVALUADO:	ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022
NOMBRE:	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
PUNTAJE:	4,97 SOBRE 5

De esto, podemos concluir, que la entidad viene cumpliendo con los controles establecidos por la Contaduría General de la Nación, lo que disminuye los riesgos contables y asegurando la calidad de la información financiera presentada a los entes de control, usuarios de la información y a los accionistas de la empresa.

8.4.1.3 CODIGO DE INTEGRALIDAD.

Teniendo en cuenta que el principal instrumento técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG la entidad adopto mediante Resolución 097 del 13 de septiembre del 2019 ***"Código de Integridad del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** el cual establece los principios y valores que rigen el Sistema de Transporte Público de Neiva.

Valores adoptados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con trasparecía y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.



Respeto: Conozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.



Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.



Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos.



Justicia: Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con el manual de procedimientos para aplicar auditoria de Control Interno, el cual fue aprobado mediante la Resolución 140 del 30 de diciembre de 2016; Desde el Área de Control interno se presentan los siguientes informes y seguimientos trimestrales (ENERO-SEPTIEMBRE/2023):

- ✓ Plan de Auditoría 2023 ajustado según requerimiento de la Junta Directiva, respecto de incluir en las auditorías de la vigencia 2023 al Área de Gestión de Operaciones, la cual quedó programada para el mes de septiembre de 2023.
- ✓ Se realizó reunión de Comité Fiduciario No. 34, realizado el 20 de octubre de 2023 con la Fiducia del Banco Davivienda donde se presentó el informe de Control Interno en el cual se realizan revisiones trimestrales de los pagos que realiza la entidad por el rubro de inversión.
- ✓ Se envió matriz de los riesgos a los líderes de área con el fin de realizar seguimiento de los riesgos de corrupción – Trimestral
- ✓ Se auditó al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia fiscal 2022 que desarrolló la Contraloría Municipal de Neiva, el cual arrojo un resultado de 2 hallazgos administrativos, sin mayor incidencia de riesgo, de igual manera, se presentó a la entidad el Plan de Mejoramiento y este fue aprobado para su aplicación.
- ✓ En el mes de julio de 2023 se presentó la encuesta a la plataforma FURAG de la función pública en lo correspondiente al área de Gestión de Planeación Estratégica y el Área de Gestión de Control interno vigencia 2022
- ✓ Se presentó el informe ITA (índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública), el cual se realizó en el mes de agosto de 2023 a la Procuraduría General de la Nación y se encuentra a la espera de la calificación por parte de la entidad.
- ✓ Se está apoyando la Auditoría Especial de Recursos Nación que está realizando la Contraloría General de la República, la cual se encuentra en período de ejecución.
- ✓ Se presentó informe con corte a junio de 2023 de la información de transición de gobierno, esta se envió y cargó en la página de la Alcaldía Municipal de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- ✓ Se consolidó y presento el informe a corte 31 de diciembre de 2023 de la información de transición de gobierno donde firmaron las respectivas actas parciales y definitivas con la comisión de empalme.
- ✓ Se realizó reunión de Comité Fiduciario No. 35, realizado el 26 de diciembre de 2023 con la Fiducia del Banco Davivienda donde se presentó el informe de Control Interno en el cual se realizan revisiones trimestrales de los pagos que realiza la entidad por el rubro de inversión con corte a noviembre de 2023.
- ✓ Se presentó informe consolidado de control interno a la Junta Directiva de la entidad el día 20 de diciembre de 2023.

8.4.1.4 EVALUACIÓN FURAG DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

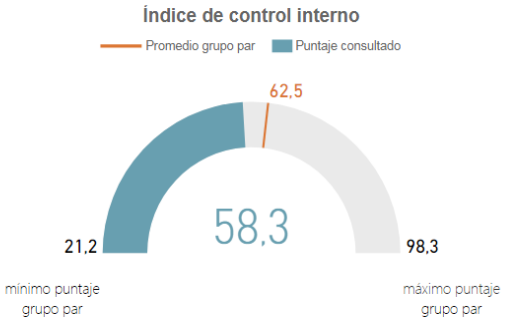

2021

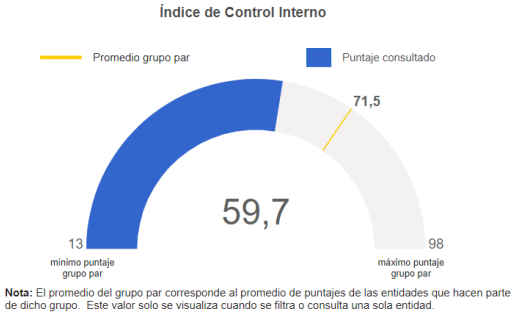

2022

Se realizó la evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la vigencia 2023, mediante la plataforma FURAG, de la Procuraduría General de la Nación, en donde el Área de Gestión de Control Interno, obtuvo una calificación de 59,7%, generando un incremento con respecto de la vigencia anterior de 1,4%, como se puede observar en la gráfica anterior.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el área de Gestión de Control Interno ha venido en una mejora constante de los procesos, lo que genera confianza en la información y los controles empleados para garantizar la disminución de los riesgos y la materialización de los mismos.

- ✓ Es de recordar que se está pendiente de realizar los informes de seguimiento de los planes con sus respectivos planes de mejora si se llegare a solicitar por parte del apoyo de control interno, de igual forma, se debe presentar los planes de la vigencia 2024 para su respectiva socialización y publicación antes del 31 de enero de 2024.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Durante los extremos temporales del 15 de julio del 2022 al 16 de febrero del 2024, el suscrito funcionario saliente, entrega una entidad en las siguientes condiciones administrativas y financieras:
Administrativamente es importante resaltar que de acuerdo a la **naturaleza jurídica** de la entidad el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado; Cuenta con un **esquema organizacional** compuesto por los órganos sociales, órganos de control y supervisión, la gerencia y las distintas áreas de gestión que desarrollan actividades en pro de alcanzar los objetivos misionales de la entidad en las diferentes áreas del conocimiento.
La entidad cuenta con unos **estatutos**, los cuales han sido modificados; se realizó la consolidación de los mismos para facilitar el estudio y análisis de los mismos, y junto con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se han iniciado actividades para realizar la actualización de los mismos en aras de incluir las buenas prácticas corporativas.
Con fundamento en el artículo 28 - 7 del Código de Comercio, la entidad maneja su **libro oficial de Actas y de registro de Accionistas** debidamente registrados en la cámara de comercio, en los cuales se encuentran incorporadas las actas del máximo órgano social, esto es la Asamblea General de Accionistas, adicionalmente, maneja las Actas de Junta Directiva. En lo corrido del periodo de administración objeto de la presente entrega, se celebraron las sesiones de Asamblea y de Junta Directiva como a continuación sigue:

ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS			
No. Acta	**Asunto Principal**	**Fecha de Acta**	**Estado**
024	Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoría Fiscal y elección revisor fiscal.	Marzo - 27 - 2023	Asentado en el libro oficial de Actas

ACTAS JUNTAS DIRECTIVAS			
No. Acta	**Asunto Principal**	**Fecha de Acta**	**Estado**
044	Presentar el informe de avances en la gestión de lo corrido de la vigencia 2022 y solicitar autorización para realizar una modificación al Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Septiembre 6 - 2022	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
045	Presentar el informe de avance y estado de los proyectos de Carril Prioritario y Sistema de Gestión y Control de Flota, y solicitar autorización para realizar una modificación al Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S	Diciembre 1 - 2022	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
046	Presentar informe de gestión con corte noviembre del 2022 y solicitar la aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos	Diciembre 26 - 2022	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	y Gastos para la vigencia fiscal 2023 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.		
047	Presentar el informe del alcance, avance y estado del proyecto de Terminales de Ruta y Paraderos, y solicitar autorización para adelantar el proceso de contratación y efectuar la respectiva suscripción del contrato cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE RUTA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	Febrero 2 - 2023	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
048	Presentar el informe de gestión de la vigencia 2022, avance con corte marzo 15 de 2023, los Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal de la vigencia fiscal 2022 y con el fin de solicitar autorización para que el gerente realice una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP para la vigencia fiscal 2023	Marzo 27 - 2023	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
049	Presentar el informe de avance en la gestión de lo corrido de la vigencia 2023 y solicitar autorización para realizar una modificación al Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2023	Agosto 9 - 2023	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
050	Presentar el informe de avance en la gestión de lo corrido de la vigencia 2023 como también solicitar autorización para realizar una modificación al Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2023 y la aprobación al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2024	Diciembre 20 de 2023	Pendiente por aprobación en la siguiente sección de Junta

En ese sentido se realiza la entrega de una (1) acta de Asamblea General de Accionistas asentadas en el libro oficial de Actas y seis (6) Actas de las sesiones de Junta Directiva aprobadas.

Se adelantó el proceso de **convalidación de las tablas de valoración documental** del SETP ante el archivo departamental del Huila el 19 de abril de 2023, con esto dando cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).

En lo que respecta al archivo físico de la entidad, se anexa el inventario documental del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, el cual está desglosado en procesos de gestión o áreas, como lo son, proceso de Gestión de Infraestructura, proceso de Gestión de Operaciones, proceso de Gestión Administrativa y Financiera, proceso de Gestión Jurídica y Contratación y Proceso de Gestión Social y Predial.

Finalmente, se realiza la entrega de la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. con el cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

10.2. Situación Financiera

A manera de contextualización, me permito informar que, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. suscribió el Convenio de Cofinanciación entre la Nación, el Municipio de Neiva y el Ente Gestor el 07 de noviembre del 2013 con el fin de apalancar el proyecto de Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, al cual le realizaron 3 otrosíes incrementando las condiciones del mismo. Frente a la **ejecución del convenio de cofinanciación**, se realizó el ejercicio de conciliación de manera interna y con la fiduciaria Davivienda S.A. quien es la entidad que administra los recursos aportados a la entidad, así mismo se tuvo en

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

cuenta el otrosí N° 03 al Convenio de Cofinanciación suscrito el 29 de diciembre del 2021, a través de cual se determinó realizar la reprogramación de los "aportes de la Nación" hasta la vigencia 2025.

Así las cosas los porcentajes de ejecución y los valores debidamente desembolsados por vigencias se detallan a continuación:

FUENTES DE FINANCIACIÓN	Aportes proyectados al 2028	Ejecución diciembre 2023	% Ejecución
Municipio	118.956.851	88.727.198	**74,59%**
Nación	215.645.916	108.486.848	**50.31%**
TOTAL, INGRESOS	**316.258.333**	**197.214.046**	**58,94%**

Cifras en miles de pesos

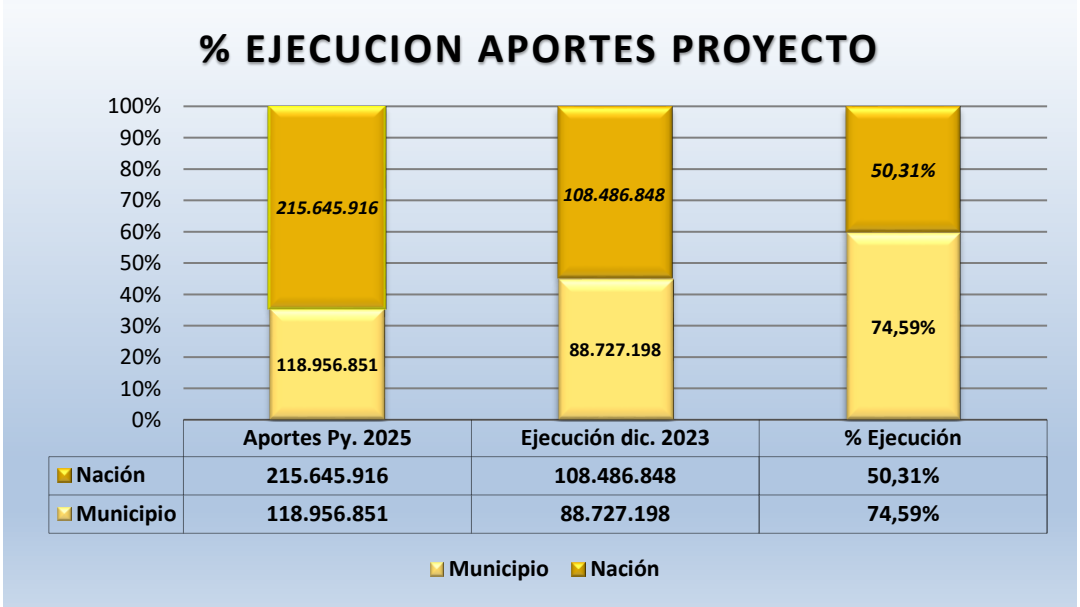

Así mismo se presenta el informe historico de la ejecución de los recursos de cofinanciación de acuerdo con la establecido en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio el el Ente Gestor con sus respectivos otrosies.

RECURSOS NACION

VIGENCIA	OTROSÍ	APORTES NACIÓN		
		Aportes Convenio	Desembolsos	Saldo
2013	Conv. Cofinanciación	0	0	0
2014	Conv. Cofinanciación	2.250.000	0	2.250.000
2015	N° 1	8.046.000	2.250.000	8.046.000

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2016	N° 2	19.500.000	8.046.000	19.500.000
2017	N° 2	21.902.000	19.500.000	21.902.000
2018	N° 2	18.663.495	21.902.000	18.663.495
2019	N° 2	12.469.093	31.534.262	-401.674
2020	N° 2	0	-401.674	0
2021	N° 3	26.346.967	17.017.275	9.329.692
2022	N° 3	35.080.382	6.440.030	37.970.044
2023	N° 3	39.768.430	2.198.955	**75.539.519**
2024	N° 3	10.000.000	0	85.539.519
2025	N° 3	21.619.549	0	107.159.068
TOTAL		**215.645.916**	**108.486.848**	**107.159.068**
Diciembre 2023				

Respecto a los recursos de la Nacion, se realizo el tramite necesario para la suscriccion del Otro si No 4 al Convenio Macro de Cofinanciacion, dado la reprogramacion de los aportes que no se comprometieron el las vigencias 2021 y 2022, asi mis la reprogramacion de los recursos de la vigencia 2023, por cuenta de la condicicion establecida en ley 2294 del 19 de mayo de 2023 "*POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026: COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA*" y su incidencia en el componente de confinanciación de los sistemas de transportedel, que suspendio los giros al proyecto, lo cual conllevo a suspenden los recursos previstos para la vigencia 2023.

Tras la mesa de trabajo realizada el 2 de noviembre del 2023 en la ciudad de Neiva, entre representantes del Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Alcaldía Municipal de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se llevo a cavo la resolucion a las interpretaciones que las partes (Nación – Municipio) ostentaban frente a la formula contenida en el numeral 2.4, de la cláusula segunda del referido convenio, concluyendo y acordando los factores que rigen a la aplicación de la formula, entre ellos:

- Efecto inflacionario, se aplicará tomando como referencia los aportes efectivamente realizados por el municipio en cada vigencia, conforme el literal a del numeral 2.4 de la cláusula segunda modificado mediante otros si No. 1.
- El cálculo debe realizarse para cada vigencia fiscal, conforme a los aportes que el municipio se obliga a realizar en los términos del numeral 2.2 de la cláusula segunda, aportes establecidos en pesos constantes del 2012.
- Que el valor resultante por cálculo inflacionario a la vigencia 2023, asciende a la suma de $ 26.784.189.078. Este valor se deberá actualizar según lo establece el convenio de cofinanciación a la vigencia que se realice el desembolso"

Según lo concluido en aquella mesa de trabajo, el valor adeudado por el Municipio de Neiva en virtud de la aplicación del numeral 2.4 de la cláusula segunda del Convenio asciende a la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($26.784.189.078) M/CTE. A corte 31 de diciembre de 2023, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

RECURSOS MUNICIPIO A 31/12/2023

Vigencia i	AP Cons i	AP Crr	IPC i	AP Crr * (IPC i/IPC 2012)	Balance i	Acumulado constantes 2012
2.013	9.000.000.000,00	9.174.403.143,17	79,56	9.000.278.598,85	278.598,85	278.598,85
2.014	15.500.000.000,00	4.964.880.680,83	82,47	4.698.786.675,62	- 10.801.213.324,38	- 10.800.934.725,53
2.015	15.500.000.000,00	2.043.898.824,00	88,05	1.811.769.485,67	- 13.688.230.514,33	- 24.489.165.239,86
2.016	9.000.000.000,00	-	93,11	-	- 9.000.000.000,00	- 33.489.165.239,86
2.017	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	96,92	7.247.730.086,67	- 1.752.269.913,33	- 35.241.435.153,19
2.018	9.000.000.000,00	14.657.960.109,00	100	11.440.537.865,07	2.440.537.865,07	- 32.800.897.288,11
2.019	9.000.000.000,00	34.064.672.111,00	103,8	25.614.139.289,63	16.614.139.289,63	- 16.186.757.998,48
2.020	9.000.000.000,00	5.849.382.650,00	105,48	4.328.254.795,53	- 4.671.745.204,47	- 20.858.503.202,95
2.021	-	3.172.000.000,00	111,41	2.222.193.698,95	2.222.193.698,95	- 18.636.309.504,00
2.022	-	3.000.000.000,00	126,03	1.857.890.978,34	1.857.890.978,34	- 16.778.418.525,66
2.023	-	2.800.000.000,00	137,62	1.587.995.930,82	1.587.995.930,82	- 15.190.422.594,84
2.024		6.000.000.000,00	146,43	3.198.115.140,34	3.198.115.140,34	- 11.992.307.454,50
2.025		5.885.219.658,00	150,82	3.045.626.536,98	3.045.626.536,98	- 8.946.680.917,52
2.026		6.000.000.000,00	155,33	3.014.871.563,77	3.014.871.563,77	- 5.931.809.353,76
2.027		6.000.000.000,00	159,99	2.927.057.941,12	2.927.057.941,12	- 3.004.751.412,63
2.028		6.344.433.476,01	164,8	3.004.751.412,63	3.004.751.412,63	-
TOTAL	85.000.000.000,00	118.956.850.652,01			2.023	- 26.784.189.077,54

En aquel entonces el Municipio de Neiva, presentó un proyecto de acuerdo, mediante el cual se pretendía amparar vigencias futuras para cumplir con el compromiso de aportes pendientes por el territorio al proyecto del SETP, este proyecto no surtió tramite en el Concejo de Neiva. Bajo el entendido que el Municipio de Neiva no giro en aquella vigencia los recursos pendientes, a corte 2024 las cifras cambian y se ajustan a la vigencia 2024

RECURSOS MUNICIPIO VIGENCIA 2024

Vigencia i	AP Cons i	AP Crr	IPC i	AP Crr * (IPC i/IPC 2012)	Balance i	Acumulado constantes 2012
2.013	9.000.000.000,00	-	79,56	-	- 9.000.000.000,00	- 9.000.000.000,00
2.014	15.500.000.000,00	14.139.283.824,00	82,47	13.381.485.418,49	- 2.118.514.581,51	- 11.118.514.581,51
2.015	15.500.000.000,00	2.043.898.824,00	88,05	1.811.769.485,67	- 13.688.230.514,33	- 24.806.745.095,84
2.016	9.000.000.000,00	-	93,11	-	- 9.000.000.000,00	- 33.806.745.095,84
2.017	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	96,92	7.247.730.086,67	- 1.752.269.913,33	- 35.559.015.009,17
2.018	9.000.000.000,00	14.657.960.109,00	100	11.440.537.865,07	2.440.537.865,07	- 33.118.477.144,09
2.019	9.000.000.000,00	34.064.672.111,00	103,8	25.614.139.289,63	16.614.139.289,63	- 16.504.337.854,46
2.020	9.000.000.000,00	5.849.382.650,00	105,48	4.328.254.795,53	- 4.671.745.204,47	- 21.176.083.058,93
2.021	-	3.172.000.000,00	111,41	2.222.193.698,95	2.222.193.698,95	- 18.953.889.359,98
2.022	-	3.000.000.000,00	126,03	1.857.890.978,34	1.857.890.978,34	- 17.095.998.381,64
2.023	-	2.800.000.000,00	137,72	1.586.842.869,59	1.586.842.869,59	- 15.509.155.512,05
2.024		-	145,97	-	-	- 15.509.155.512,05
2.025		-	150,34	-	-	- 15.509.155.512,05
2.026		-	154,84	-	-	- 15.509.155.512,05
2.027		-	159,47	-	-	- 15.509.155.512,05
2.028		-	164,25	-	-	- 15.509.155.512,05
TOTAL	85.000.000.000,00	88.727.197.518,00			2.024	- 29.005.399.488,72

Para la suscripción del otro si No. 4 al Convenio de Cofinanciación la Nación solicita al Municipio los respaldos presupuestos que garanticen los recursos pendientes por girar en virtud del cumplimiento de sus obligaciones, sin este respaldo la Nación ha manifestado no proceder con la suscripción de este acto administrativo.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

9.2 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:

- Se remitos solicitud de prorroga al Contrato de Encargo Fiduciario No. 024 del 8 de septiembre de 2014 celebrado entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., y la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., cuyo objeto es "CONTRATAR UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, CON APORTES DE COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN Y DEL MUNICIPIO DE NEIVA, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE DESEMBOLSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO GARANTIZADOS CON LOS MENCIONADOS APORTES, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" con el fin de prorrogar por dos (2) meses el plazo del actual encargo fiduciario, con el fin de adelantar un nuevo proceso contractual.
- Se remitió para la revisión y validación del Ministerio de transporte el proceso que tiene por alcance la contratación de un Nuevo encargo fiduciario, para la administración de los recursos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
- En el último trimestre del 2023 se gestionaron recursos adicionales al convenio de cofinanciación por parte del Municipio de Neiva, recursos por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE con destino a cubrir los costos de Licencias de Construcción, urbanismo y parcelación de los proyectos para la construcción de los Patios y Talleres Sur este y Norte. Dichos recursos deberán ser incluidos en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2024.
- Se realizó de manera oportuna la rendición de informes y reportes presupuestales, financieros y contables exigidos por ley y con destino a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre otras.
- El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. solito un pronunciamiento de fondo y con sustento jurídico de aplicación frente a la interpretación que tiene el Ministerio de Transporte a la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 "*Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida*", la cual fijó los nuevos lineamientos aplicables para el próximo cuatrienio. Allí el artículo 172 modifica el artículo 2 de la Ley 310 de 1996 que definía los parámetros de la cofinanciación de sistemas de transporte y afecta la cofinanciación del personal (contratistas) que se requiere en el proceso de implementación del proyecto.

9.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El 19 de mayo de 2023 fue promulgada Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida",* la cual fijó los nuevos lineamientos aplicables para el próximo cuatrienio. En su artículo 172 modifica el artículo 2 de la Ley 310 de 1996 que definía los parámetros de la cofinanciación de sistemas de transporte, asignando al Ministerio de Transporte la función de verificar el cumplimiento de requisitos para aprobar la cofinanciación, disponiendo:

> *"La Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

transporte público de Pasajeros (SITM, SITP, SETP Y SITR), con dinero administrado a través de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. Dentro de dicha reglamentación se tendrá en cuenta que los aportes en especie no podrán superar el 50% del total del aporte del territorio.

Las inversiones cofinanciables corresponden a los siguientes componentes: servicio de deuda, infraestructura física, adquisición predial, planes de reasentamiento, sistemas inteligentes de transporte y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante nuevo o cabinas de cables que estén integrados a los sistemas de transporte público con estándares de bajas y cero emisiones y/o que garanticen accesibilidad para población en condición de discapacidad y/o movilidad reducida así como vehículos auxiliares destinados a la operación y mantenimiento de sistemas férreos. La ejecución de las actividades inherentes a la adquisición, operación y mantenimiento de los activos cofinanciados son responsabilidad del ente territorial o de quien este delegue. ***En ningún caso se podrán cofinanciar gastos administrativos, de mantenimiento, PMO, de contratación o pago del personal requerido durante la ejecución y desarrollo del sistema, honorarios, viáticos, gastos de viajes o similares."*** (Resaltos y subrayado propios).

Teniendo en cuenta, que el Ente gestor de la ciudad de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuenta con un Convenio de Cofinanciación vigente para la implementación de Sistema Estratégico de Transporte Publico para la ciudad de Neiva, y una vez analizado el proyecto de RESOLUCIÓN NÚMERO *RAD_S* de *F_RAD_S* "*Por medio del cual se establecen los parámetros para gestionar la suspensión y el reintegro de los aportes de cofinanciación de la nación a los sistemas estratégicos de transporte público, así como, la redistribución de componentes cofinanciables para los sistemas de transporte público de pasajeros, en el marco de la ejecución de los convenios suscritos y se dictan otras disposiciones por medio del cual se reglamentan los requisitos para la participación de la Nación en la cofinanciación a los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros del país y se dictan otras disposiciones*", se observa:

- Que las actividades cofinanciables que se desprenden del CONPES 3756, CONPES 3896 y del Convenio de Cofinanciación para el Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio Neiva**,** especialmente la que respecta al componente *"**GERENCIA DE PROYECTO**"* , correspondiente a la financiación de gastos relativos a la administración y organización necesarios para lograr el alcance, tiempo y costos planteados del proyecto, que comprende, entre otros aspectos, ***la contratación y pago de personal de apoyo técnico requerido durante la ejecución y desarrollo del SETP,*** junto al pago de honorarios, viáticos y gastos de viaje de consultores y contratistas del proyecto; los que de forma concreta para el SETP NEIVA, el pasado 5 de agosto de 2023 resultara la validación de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transportes, a la solitud de redistribución, la que una vez aprobada, permitió al ente gestor incluir dentro de aquel ejercicio de redistribución, recursos para este componente; Esto posterío al fallo de la ley 2294 de 2023.

De lo anterior, se resalta que este tipo de actividades son indispensables para el adecuado funcionamiento del Ente Gestor, y en consecuencia, permite cumplir con los fines que el proyecto persigue.

Por otro el Ministerio de Transporte divulgo un del proyecto de acto administrativo resolución "*POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS PARA GESTIONAR LA SUSPENSIÓN Y EL REINTEGRO DE LOS APORTES DE COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN A LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSPORTE PÚBLICO, ASÍ COMO, LA REDISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES COFINANCIABLES PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Del análisis jurídico realizado al articulado y anexos al proyecto de acto administrativo y dado los cambios que frente a la cofinanciación introdujo esta disposición, fue considerado por parte del Ministerio de Transporte armonizarlos frente a los requisitos de cofinanciación de los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros, por los artículos 172, 173 y 174 de esta normativa, situación igual, que ocurriera en el año 2020, y que llevo a la expedición de la Resolución número 20203040013685 del 29 de septiembre del 2020 "*Por la cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley 310 de 1996 modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 219 en el marco de cofinancian de los Sistemas de Transporte Público Colectivo o masivo y de dictan otras disposiciones*", cuyo objeto no fue otro que la reglamentación (requisitos) de la confinación de la Nación de los Sistemas de Transporte Público colectivo o masivo, hoy aportas de ser derogara por la Resolución objeto de estas observaciones, y que en su artículo 3."*Definicion componentes elegibles para los proyectos de los sistemas de transporte público colectivo o masivo*", disponiendo de forma expresa en su parágrafo 1 lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1.*** *La precisión de los elementos elegibles de cofinanciación y el desglose de cada uno de ellos serán definido en los documentos anexos a los diferentes Convenios de Cofinanciación con fundamento en los documentos CONPES de declaración de importancia estratégica de cada proyecto de sistema de transporte."*

Que en atención a lo anterior y al ámbito de aplicación del proyecto de resolución objeto de estas consideraciones, que en su artículo 2., ha dispuesto:

> "***Artículo 2. Ámbito de aplicación****. La presente resolución es de* ***obligatorio cumplimiento para todos los Entes Territoriales que cuenten con convenios de cofinanciación vigentes para la implementación de Sistemas de Transporte Público de Pasajeros***.". Negritas y subrayas propias.

Así mismo en los que respecta a definiciones de define:

> *"**Artículo 3. Definiciones.** Para efectos de interpretación de la presente resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:*
>
> ***1.*** *Componentes elegibles.* ***Son aquellos elementos esenciales para desarrollar e implementar un sistema de transporte público de pasajeros, que tengan vocación de ser cofinanciados por la Nación, de acuerdo con las inversiones autorizadas por el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 172 de la Ley 2294 de 2023. El detalle de los componentes será establecido por el Ministerio de Transporte y los respectivos convenios de cofinanciación****."* Negritas y subrayas propias.

Ahora, en el **CAPÍTULO 4 - REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE COMPONENTES**, **Artículo 15. Pasos previos**. se establecen la ruta para preparar la propuesta de redistribución de componentes, donde los Entes Gestores deberán evaluar y preparar la información para realizar el ejercicio de redistribución de recursos entre componentes, allí el numeral 4 describe:

> ***4. Verificación de componentes***

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

> *El ente gestor deberá verificar que los elementos propuestos para la redistribución* ***hagan parte de los componentes elegibles del proyecto declarado de importancia estratégica por el CONPES y establecidos en el respectivo convenio de cofinanciación*** *y que cumplan con los criterios definidos por el Ministerio de Transporte en la presente resolución o aquella que la adicione, modifique o sustituya.* Negritas y subrayas propias.

Es decir, que los requisitos para la participación de la Nación en la cofinanciación a los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros del país y que señala el proyecto de Resolución, opera y aplica para aquellos municipios que aún no cuentan con cofinanciación de la Nación para esta clase de proyectos, puesto que su aplicación, de manera extensiva a los proyectos SETP vigentes y que ya cuentan con Convenio de Cofinanciación, estaría desconociendo las condiciones propias de los documentos CONPES y hasta los propios Convenios de Cofinanciación ya celebrados, en plena contravía de los principios contractuales señalados.

Aunado a lo expuesto, y de conforme fuere tratado y desarrollado por el artículo 3 de la Resolución número 20203040013685 del 29 de septiembre del 2020 "*Por la cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley 310 de 1996 modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 219 en el marco de cofinancian de los Sistemas de Transporte Público Colectivo o masivo y de dictan otras disposiciones*", el articulado de la disposición objeto de estas observaciones, no contempla de manera expresa y clara la excepción de que trata el parágrafo segundo del artículo 3., de la normativa aún vigente, cuando señala que para los sistemas de transporte que cuentan con cofinancian por parte de la Nación a la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución, la aplicación de los componentes elegibles mencionados anteriormente no puede afectar el monto inicial de los recursos aprobados en el documento CONPES y el convenio de cofinanciación respectivos que dieron origen a cada proyecto y que constituyen ley para las partes, dentro de los cuales se incluye el componente de "Gerencia del Proyecto" el cual ha venido siendo cofinanciado desde la celebración del respectivo convenio que acogió los términos de referencia del documento CONPES 3756.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. solicito al Ministerio, se incluyera una aclaración expresa al ámbito de aplicación de la normativa sujeta a estudio, y publicada en el portal del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ya que el artículo segundo de la norma que se estudia es claro en determinar que estos nuevos requisitos son para los Entes Territoriales que estén interesados en obtener la cofinanciación de la Nación, es decir en proyectos nuevos para la implementación de los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros, en el cual es claro que el componente de "Gerencia del Proyecto", no es cofinanciable. En consecuencia, fijar que las condiciones de la normativa expuesta en la resolución no es aplicable a los CONPES Vigentes y CONVENIOS firmados entre la nación y municipio, ya que estos como tal, se encuentran en ejecución y surgieron bajo un marco jurídico diferente al que ahora se le pretende dar aplicación por parte de la autoridad correspondiente del Ministerio, considerando que sin este componente y en las actuales condiciones de implementación del SETP y en particular para la ciudad de NEIVA, harían gravosa la situación por la desfinanciación de uno de sus componentes con una normativa actual, que modifica condiciones previas ya pactadas.



FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co
